



T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ



Kirklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

16 Nisan 2025

Katılımcı Listesi

- | | | |
|---|--|---|
| 1 Babaeski Kaymakamlığı | 1 0090 İl Müftülüğü | 30 1504 Doğa Koruma ve Milli Parklar Md.lüğü |
| 2 Demirköy Kaymakamlığı | 2 0201 Aile ve Sosyal Hiz. İl Md.lüğü | 31 1505 DSI 11. Bölge Md.lüğü |
| 3 Kofçaz Kaymakamlığı | 3 0302 Çalışma ve İş Kurumu İl Md.lüğü | 32 1505 DSI 112. Sube Md.lüğü |
| 4 Lüleburgaz Kaymakamlığı | 4 0302 Sosyal Güvenlik İl Md.lüğü | 33 1506 İstanbul Orman Bölge Md.lüğü |
| 5 Pehlivan köy Kaymakamlığı | 5 0401 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Md.lüğü | 34 1507 Kırklareli Orman İşletme Md.lüğü |
| 6 Pınarhisar Kaymakamlığı | 6 0402 Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Md.lüğü | 35 1508 Demirköy Orman İşletme Md.lüğü |
| 7 Vize Kaymakamlığı | 7 0402 Kadastro Md.lüğü | 36 1509 Vize Orman İşletme Md.lüğü |
| 8 3000 İl Özel İdaresi | 8 0404 İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü | 37 1510 Lüleburgaz Fidanlık Md.lüğü |
| 9 3001 Kırklareli Belediye Bşk.lığı | 9 0405 Meteoroloji Md.lüğü | 38 1503 TMO Başmüdürlüğü |
| 10 3002 İnece Belediye Bşk.lığı | 10 0601 TOKİ | 39 1701 Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü |
| 11 3003 Kavaklı Belediye Bşk.lığı | 11 0601 BOTAŞ Şube Md.lüğü | 40 1701 Karayolları 15. Şube Şefliği |
| 12 3004 Üsküp Belediye Başkanlığı | 12 0602 MTA Marmara Bölge Md.lüğü | 41 1702 PTT Başmüdürlüğü |
| 13 3005 Babaeski Belediye Bşk.lığı | 13 0603 TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü | 42 1703 TCDD 1. Bölge Md.lüğü |
| 14 3006 Alpullu Belediye Bşk.lığı | 14 0604 TP Trakya Bölge Md.lüğü | 43 1704 Ulaştırma ve Altyapı 1. Bölge Md.lüğü |
| 15 3007 Büyükmandıra Belediye Bşk.lığı | 15 0701 Gençlik ve Spor İl Md.lüğü | 44 2900 Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü |
| 16 3008 Karahalil Belediye Bşk.lığı | 16 0801 Defterdarlık | 45 TREDAS Kırklareli İşletme Md.lüğü |
| 17 3009 Demirköy Belediye Bşk.lığı | 17 1001 İl Afet ve Acil Durum Md.lüğü | |
| 18 3010 İğneada Belediye Bşk.lığı | 18 1001 İl Kültür ve Turizm Md.lüğü | 1 Kırklareli Baro Bşk.lığı |
| 19 3011 Kofçaz Belediye Bşk.lığı | 19 1002 Edirne Vakıflar Bölge Md.lüğü | 2 Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası |
| 20 3012 Lüleburgaz Belediye Bşk.lığı | 20 1101 İl Milli Eğitim Md.lüğü | 3 Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası |
| 21 3013 Ahmetbey Belediye Bşk.lığı | 21 1301 İl Sağlık Md.lüğü | 4 Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası |
| 22 3014 Büyükkarıştıran Belediye Bşk.lığı | 22 1401 Sanayi ve Teknoloji İl Md.lüğü | 5 Kırklareli Ticaret Borsası |
| 23 3015 Evrensekiz Belediye Bşk.lığı | 23 1402 Trakya Kalkınma Ajansı | 6 Babaeski Ticaret Borsası |
| 24 3016 Pehlivan köy Belediye Bşk.lığı | 24 1403 Kırklareli OSB Müdürlüğü | 7 Lüleburgaz Ticaret Borsası |
| 25 3017 Pınarhisar Belediye Bşk.lığı | 25 1403 Büyükkarıştıran OSB Müdürlüğü | 8 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği |
| 26 3018 Kaynarca Belediye Bşk.lığı | 26 1403 Evrensekiz OSB Müdürlüğü | |
| 27 3019 Vize Belediye Bşk.lığı | 27 1501 İl Tarım ve Orman Md. lüğü | |
| 28 3020 Çakıllı Belediye Bşk.lığı | 28 1502 Atatürk TSTMA Enstitüsü Md.lüğü | |
| 29 3021 Kırıkköy Belediye Bşk.lığı | 29 1504 Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Böl. Md.lüğü | |



Gündem

Vali Uğur TURAN'ın Açılış Konuşması
Kuruluşların 2025 Yılı Yatırımları ve İl Afet Risk
Azaltma Planıyla ilgili Çalışmaları Hakkında Bilgi
Vermesi
Kapanış

Görüşme Sırası

- 1 Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü
- 2 DSİ 11. Bölge Müdürlüğü
- 3 İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü
- 4 Ulaştırma ve Altyapı 1. Bölge Müdürlüğü
- 5 İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
- 6 Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü
- 7 TCDD 1. Bölge Müdürlüğü
- 8 MTA Marmara Bölge Müdürlüğü
- 9 Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü
- 10 TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü
- 11 TP Trakya Bölge Müdürlüğü
- 12 Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü
- 13 İl Özel İdaresi
- 14 Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
- 15 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
- 16 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
- 17 İl Milli Eğitim Müdürlüğü
- 18 İl Sağlık Müdürlüğü
- 19 Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
- 20 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
- 21 Atatürk TSTMA Enstitüsü Müdürlüğü

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İlçe

Tümü

Harcama Yılı

2025

İl Adı

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

Tümü

Proje Sektörü

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

202

Toplam Proje Sayısı

60.783.220.727

Toplam Proje Tutarı

11.753.927.339

Toplam Yıl Ödeneği

%40,55


Nakdi Gerçekleşme Oranı

%7,52

Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı

%7,52

Yılı Harcama Oranı

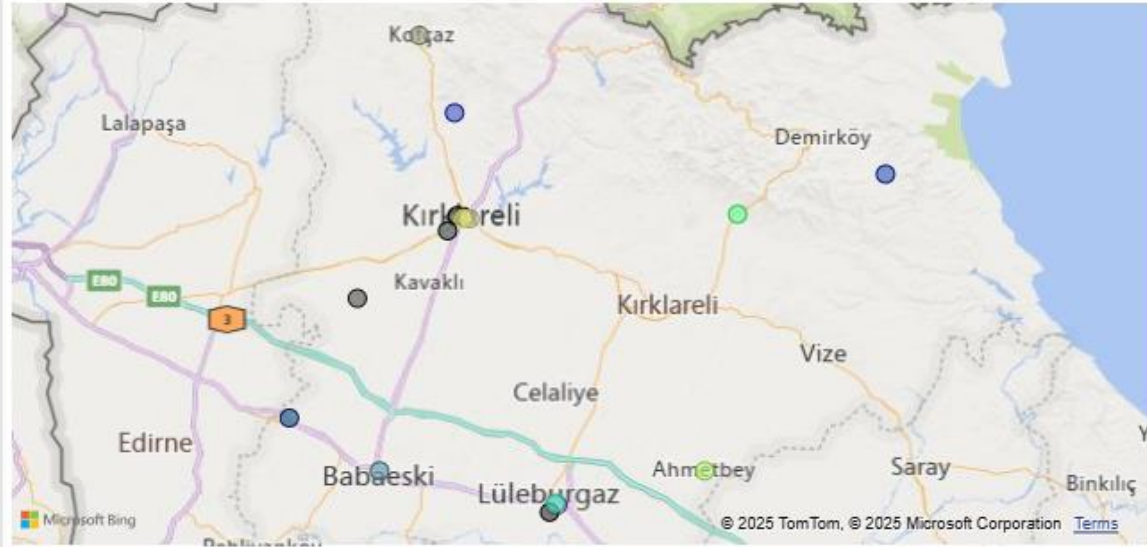

Proje Sektörü	Proje Sayısı
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	7
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	36
Eğitim	29
Enerji	19
İmalat	5
Konut	1
Toplam	202

Proje Yeri İlçe	Toplam Proje Tutarı	Proje Sayısı
BABAESKİ	1.826.368.496	17
DEMİRKÖY	200.504.976	8
KOÇAZ	1.959.959.389	14
LÜLEBURGAZ	9.145.986.142	36
MERKEZ	11.395.321.612	53
MUHTELİF İLÇE	30.061.467.748	44
Toplam	60.783.220.727	202

Yatırımcı Kuruluş	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı
BÜYÜKMANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	5	2.550.000	2.550.000		0
KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	3	3	3		0
KOÇAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	3	2.200.000	2.200.000		0
PEHLİVANKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1	1	7.300.000		0
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	1	1.200.000	1.200.000		0
VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI	2	9.800.000	9.800.000		0
Toplam	202	11.753.927.339	60.783.220.727	23.765.490.389	

Bakanlık Adı
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Toplam

Sektör Bazında Dağılım

Sektörel Dağılım

Arama Filtreleri

İlçe

Tümü

Harcama Yılı

2025

Proje Sahibi Kuruluş

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

İlçe	Toplam Proje Tutarı	Proje Sayısı
BABAESKİ	1.826.368.496	17
DEMİRKÖY	200.504.976	8
KOÇGAZ	1.959.959.389	14
LÜLEBURGAZ	9.145.986.142	36
MERKEZ	11.395.321.612	53
MUHTELİF İLÇE	30.061.467.748	44
PEHLİVANKÖY	78.825.000	3
PINARHİSAR	357.328.158	8
Toplam	60.783.220.727	202

202

Toplam Proje Sayısı

60.783.220.727

Toplam Proje Tutarı

11.753.927.339

Toplam Yıl Ödeneği

%40,55


Nakdi Gerçekleşme Oranı

%7,52

Yılı Harcama Oranı

Proje Sektörü	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı
Ulaştırma - Haberleşme	28	8.070.031.024	33.392.812.868	21.713.934.052	535.428.415	22.249.362.467	
Tarım	60	626.290.633	9.705.364.334	398.711.163	57.974.243	456.685.406	
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	7	9.200.005	5.170.632.283	13.614.330	3.136.035	16.750.365	
İmalat	5	84.634.767	4.056.138.337	1.097.773.509	84.634.764	1.182.408.273	
Sağlık	12	781.822.474	3.512.233.298	136.858.328	4.822.464	141.680.792	
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	36	508.681.686	1.318.450.768	98.061.849	19.927.266	117.989.115	
Enerji	19	132.441.340	1.254.236.333	11.820.623	1.105.548	12.926.171	
Eğitim	29	455.856.658	1.222.531.305	243.247.932	18.411.179	261.659.111	
Madencilik	4	1.070.990.000	1.070.990.000	0	145.186.000	145.186.000	
Konut	1	12.778.752	78.631.201	51.468.603	12.778.752	64.247.355	
Turizm	1	1.200.000	1.200.000	0	0	0	
Toplam	202	11.753.927.339	60.783.220.727	23.765.490.389	883.404.666	24.648.895.055	

Toplam Proje Sayısı

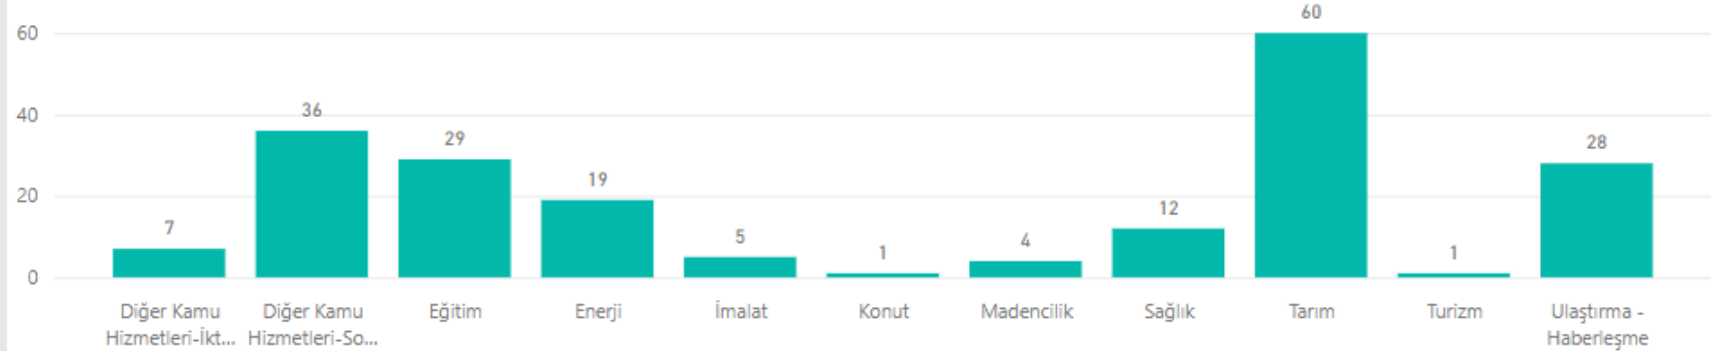

İlçe Bazında Dağılım

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İlçe

Tümü

Harcama Yılı

2025

Proje Sahibi Kuruluş

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

Proje Sektörü

Proje Sayısı

Ulaştırma - Haberleşme

28

Turizm

1

Tarım

60

Sağlık

12

Madencilik

4

Konut

1

İmalat

5

Enerji

19

Toplam

202

202

Toplam Proje Sayısı

60.783.220.727

Toplam Proje Tutarı

11.753.927.339

Toplam Yıl Ödeneği

%40,55


Nakdi Gerçekleşme Oranı

%7,52

Yılı Harcama Oranı

İlçe	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı
MUHTELİF İLÇE	44	7.554.813.621	30.061.467.748	19.046.411.604	477.875.798	19.524.287.402	%64,95	
MERKEZ	53	2.276.436.309	11.395.321.612	3.488.889.994	147.477.939	3.636.367.933	%31,91	
LÜLEBURGAZ	36	1.411.572.279	9.145.986.142	931.746.684	202.588.704	1.134.335.388	%12,40	
VİZE	19	19.902.739	5.757.459.206	82.222.230	328.239	82.550.469	%1,43	
KOÇAZ	14	8.400.009	1.959.959.389	19.699.338	0	19.699.338	%1,01	
BABAESKİ	17	336.406.188	1.826.368.496	85.460.457	7.136.827	92.597.284	%5,07	
PINARHİSAR	8	92.191.298	357.328.158	53.145.356	4.218.407	57.363.763	%16,05	
DEMİRKÖY	8	51.304.894	200.504.976	57.914.726	43.778.752	101.693.478	%50,72	
PEHLİVANKÖY	3	2.900.002	78.825.000	0	0	0	%0,00	
Toplam	202	11.753.927.339	60.783.220.727	23.765.490.389	883.404.666	24.648.895.055	%40,55	

İlçe Bazında Proje Sayısı

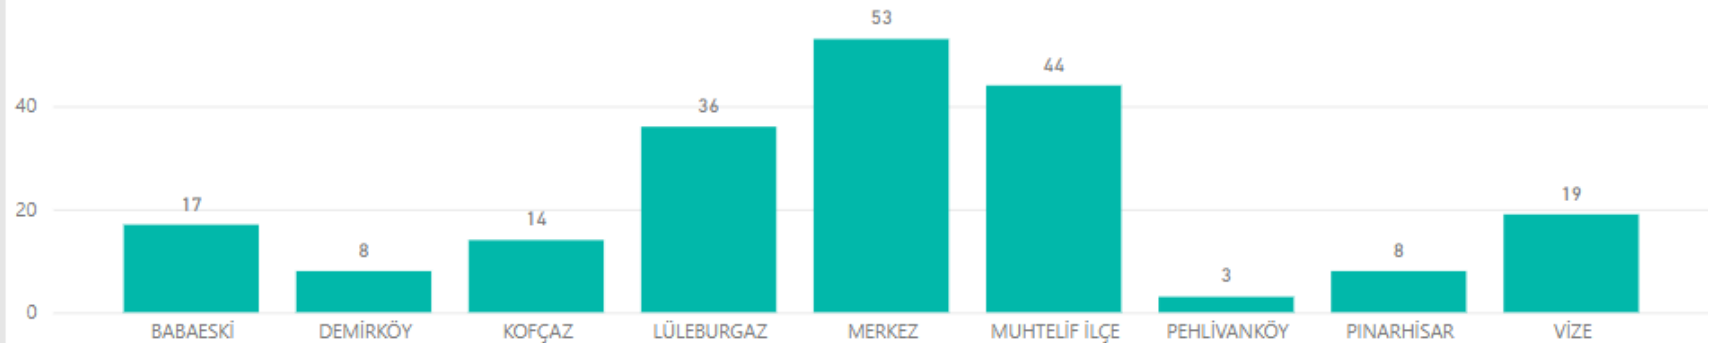

Dönemsel Harcama Dağılımı

KIRKLARELİ	202 Proje Sayısı	60.783.220.727 Toplam Proje Tutarı	24.648.895.055 Toplam Harcama Tutarı	11.753.927.339 Toplam Yıl Ödeneği	883.404.666 Yılı Harcama Tutarı
İl Adı Tümü	883.404.666 1.Dönem Harcama Tutarı	0 2.Dönem Harcama Tutarı	0 3.Dönem Harcama Tutarı	0 4.Dönem Harcama Tutarı	
İlçe Tümü	%7,52	%0,00	%0,00	%0,00	
Proje Sahibi Kuruluş Tümü					
Proje Sahibi Bakanlık Tümü					
Bütçe Türü Tümü					
Harcama Yılı 2025					
Başlama Yılı Tümü					
Bitiş Yılı Tümü					
Proje Durumu Tümü					
Proje Alt Durumu Tümü					
E					
● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı					
883.404.666				11.753.927.339	

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcam...
BABAEŞKİ	92.597.284
DEMİRKÖY	101.693.478
KOÇAZ	19.699.338
LÜLEBURGAZ	1.134.335.388
MERKEZ	3.636.367.933
MUHTELİF İLÇE	19.524.287.402
PEHLİVANKÖY	0
PINARHİSAR	57.363.763
VİZE	82.550.469
Toplam	24.648.895.055

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı	Toplam Harcama Yüzdesi
Ulaştırma - Haberleşme	22.249.362.467	90,27%
İmalat	1.182.408.273	4,80%
Tarım	456.685.406	1,85%
Eğitim	261.659.111	1,06%
Madencilik	145.186.000	0,59%
Sağlık	141.680.792	0,57%
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	117.989.115	0,48%
Konut	64.247.355	0,26%
Diğer Kamu Hizmetleri-İktis...	16.750.365	0,07%
Toplam	24.648.895.055	100,00%

Bakanlık Adı	Toplam Harcama T...
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI	22.122.330.488
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI	1.182.408.273
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI	456.098.451
YEREL YÖNETİMLER	224.270.448
ÜNİVERSİTELER	163.569.423
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI	158.112.171
SAĞLIK BAKANLIĞI	141.680.792
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI	94.443.360
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKA...	47.952.020
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI	36.706.044
Toplam	24.648.895.055

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu
AHMETBEY ŞEHİRİÇİ YOLLAR TRETUVAR DÜZENLEMESİ	AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	Devam Ediyor
ASFALT. BAKIM, ONARIM VE TRAFİK ÇALIŞMALARI	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor
D.KÖY KANALİZASYON YAPIM BAKIM VE ONARIM	DEMİRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	Devam Ediyor
D.KÖY ŞEHİRİÇİ YOLLARI YAPIM BAKIM VE ONARIMI	DEMİRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	Devam Ediyor
DEMİRKÖY HÜKÜMET KONAĞI YAPIMI	KIRKLARELİ VALİLİĞİ	Devam Ediyor
KELİ FERİHA AHMET ALDOĞAN ETÜT MERKEZİ	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti
KELİ ŞEHİRİÇİ YOLLARI AYDINLATMA DİREĞİ VE ELEKTRİK MALZEMESİ ...	KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	Bitti
KAMULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. KISIM ALTYAPI İNŞAATI	KIRKLARELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor
LÜLEBURGAZ 1 NO'LU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (8 AHB) + 112 AŞİ	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor
Toplam		

Yatırımcı Kuruluş Dağılımı

Arama Filtreleri

Proje Yeri İlçe

Tümü

Harcama Yılı

2025

Proje Sektörü

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

YİKOB/Özel İdare/Di...

Tümü

KIRDES Projesi Mi?

Tümü

KÖYDES Projesi Mi?

Tümü

IRAP Projesi Mi?

Tümü

170

Toplam Proje Sayısı

60.521.045.457

Toplam Proje Tutarı

11.553.065.940

Toplam Yıl Ödeneği

%40,52

Nakdi Gerçekleşme Oranı

%7,02

Yılı Harcama Oranı

Yatırımcı Kuruluş	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması
DEREKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	1	1	492.283	414.715
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	42	534.225.533	9.559.444.952	394.632.789
EDİRNE VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	2	3.438.717	33.222.767	1.917.957
İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	2	1.495.870	49.119.651	47.623.781
İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	7	58.562.000	58.562.002	0
KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	9	1.282.304.761	13.190.422.047	8.308.352.662
KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	6	13.044.434	333.322.686	3.358.487
KIRKLARELİ ATATÜRK TOPRAK SU VE TARIMSAL METEOROLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	1	758.008	4.025.334	2.984.334
KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	3	3	3	0
KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	6	23.854.803	23.854.803	0
KIRKLARELİ İL İNFAHAT VE KURUMSAL İZLENLERİ	1	1	700.000	24.102
Toplam	170	11.553.065.940	60.521.045.457	23.711.968.444

Proje Adı

Search

Q

E

Yatırımcı Kuruluş	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Du
DEREKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	DEREKÖY GÜMRÜK KAPISININ MODERNİZASYONU	Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	Devam E
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ	Tarım	Devam E
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ 2. KISIM	Tarım	Devam E
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	BABAESKİ YENİMAHALLE TAŞKIN KORUMASI	Tarım	Devam E
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	DEMİRKÖY SIVRILAR GÖLETİ VE SULAMASI (390.000 M3)(1.260 DEKAR)	Tarım	Devam E
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	ETÜD, PLAN PLANLAMA, JEOTEKNİK HİZ. VE YAS	Tarım	Devam E

Toplam

Arama Filtreleri

Proje Sahibi Beledi...

Tümü

Harcama Yılı

2025

Proje Sahibi Kuruluş

Tümü

Proje Sektörü

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

İRAP Projesi Mi?

Tümü

32

Toplam Proje Sayısı

262.175.270

Toplam Proje Tutarı

200.861.399

Toplam Yıl Ödeneği

%47,97

Nakdi Gerçekleşme Oranı

%35,97


Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı

%35,97

Yılı Harcama Oranı

Proje Sahibi Kuruluş	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı
AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	7	16.490.400	23.065.789	6.575.389	4.002.600	10.577.989	
BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	2	11.480.926	11.480.926	0	1.773.835	1.773.835	
BÜYÜKMANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	5	2.550.000	2.550.000	0	0	0	
DEMİRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	3	34.430.111	34.430.111	0	33.901.990	33.901.990	
KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1	9.599.961	9.599.961	0	9.599.961	9.599.961	
KOÇGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	3	2.200.000	2.200.000	0	0	0	
LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	4	104.350.000	151.788.483	46.946.556	22.165.062	69.111.618	
PEHLİVANKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1	7.300.000	7.300.000	0	0	0	
Toplam	32	200.861.399	262.175.270	53.521.945	72.247.738	125.769.683	

Belediye Bazında Proje Sayısı

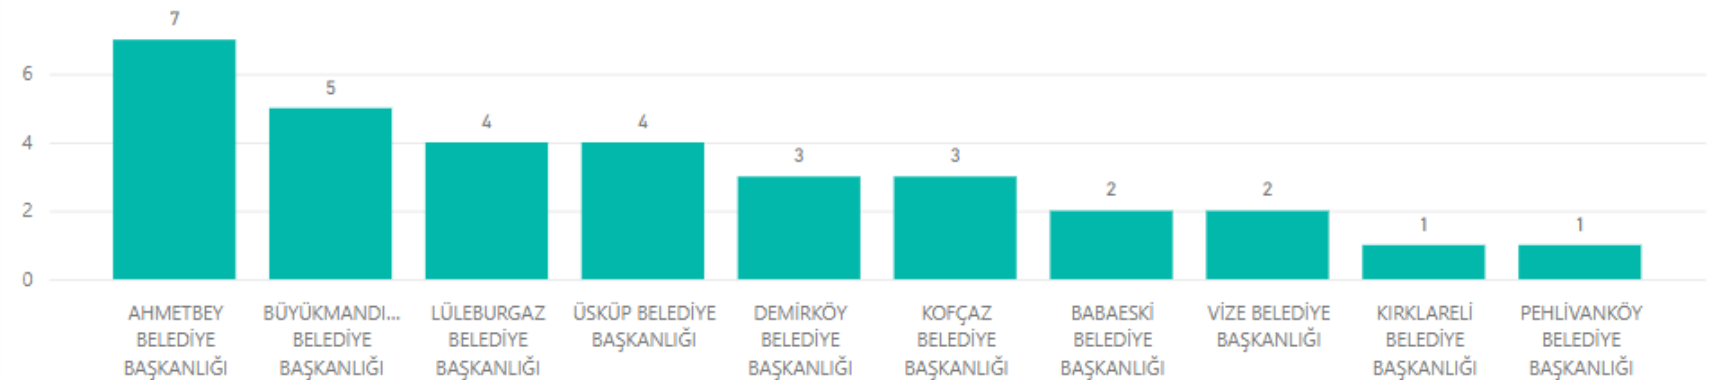

Proje Durum Bazında Dağılım

Proje Durum Dağılımı

Arama Filtreleri

İlçe

Tümü

Harcama Yılı

2025

Proje Sahibi Kuruluş

Tümü

Proje Sektörü

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

Son Güncellenme

11-Nis-25

202

Toplam Proje Sayısı

60.783.220.727

Toplam Proje Tutarı

11.753.927.339

Toplam Yıl Ödeneği

%40,55



Nakdi Gerçekleşme Oranı

%7,52

Yılı Harcama Oranı

Proje Durumu	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı
Bitti	6	13.709.693	106.694.790	90.727.329	13.064.236	103.791.565	%97,28
Devam Ediyor	90	9.897.777.245	38.618.553.971	23.667.206.548	839.272.973	24.506.479.521	%63,46
İhale Aşamasında	16	124.798.009	4.238.209.000	2.431.591	0	2.431.591	%0,06
Projeye Başlanmadı	90	1.717.642.392	17.819.762.966	5.124.921	31.067.457	36.192.378	%0,20
Toplam	202	11.753.927.339	60.783.220.727	23.765.490.389	883.404.666	24.648.895.055	%40,55

Proje Durumu

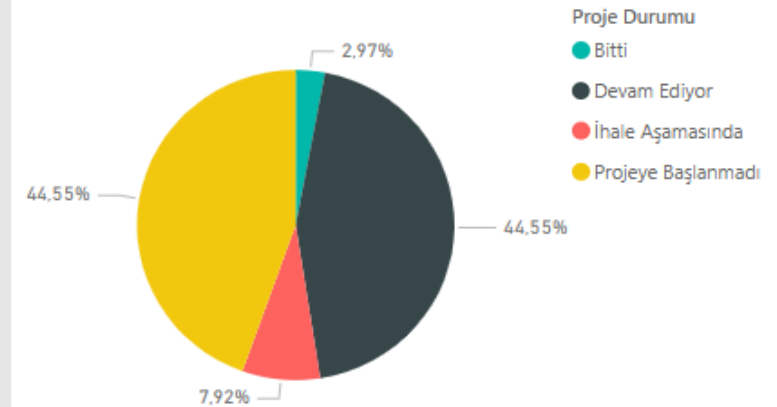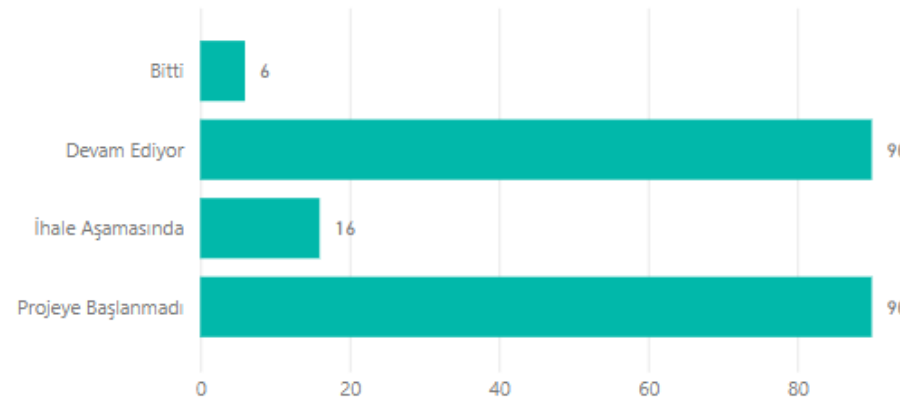

Kuruluşlara Göre Dağılım

Yatırımcı Kuruluş	Proje Sayısı	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Toplam Yıl Ödeneği	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı
Toplam	202	60.783.220.727	23.765.490.389	11.753.927.339	883.404.646	24.648.895.035	40,55	1,45	7,52	
Kamu Kuruluşları	170	60.521.045.457	23.711.968.444	11.553.065.940	811.156.908	24.523.125.352	40,52	1,34	7,02	
KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	9	13.190.422.047	8.308.352.662	1.282.304.761	257.132.191	8.565.484.853	64,94	1,95	20,05	51,33%
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	42	9.559.444.952	394.632.789	534.225.533	54.383.297	449.016.086	4,70	0,57	10,18	12,05%
İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	2	49.119.651	47.623.781	1.495.870	328.219	47.952.000	97,62	0,67	21,94	50,00%
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	1	1.026.955	586.955	440.000	0	586.955	57,15	0,00	0,00	81,00%
İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	7	58.562.002	0	58.562.000	2.769.000	2.769.000	4,73	4,73	4,73	0,00%
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	1	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	2	19.821.563.890	13.357.127.918	6.462.652.803	199.130.762	13.556.258.680	68,39	1,00	3,08	72,50%
MADEN TETKİK VE ARAMA MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	1	14.963.333	0	14.963.333	1.105.548	1.105.548	7,39	7,39	7,39	7,00%
EDİRNE VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	2	33.222.767	1.917.957	3.438.717	0	1.917.957	5,77	0,00	0,00	22,50%
TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	18	1.239.273.000	11.820.623	117.478.007	0	11.820.623	0,95	0,00	0,00	0,00%
TP TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	4	1.070.990.000	0	1.070.990.000	145.186.000	145.186.000	13,56	13,56	13,56	10,50%
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	8	529.491.435	162.366.099	286.000.001	1.203.324	163.569.423	30,89	0,23	0,42	12,88%
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	20	479.060.390	68.579.539	400.802.166	29.921.226	98.500.765	20,56	6,25	7,47	27,25%
KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	6	333.322.686	3.358.487	13.044.434	0	3.358.487	1,01	0,00	0,00	0,00%
KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	3	3	0	3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	6	23.854.803	0	23.854.803	16.939.414	16.939.414	71,01	71,01	71,01	33,17%
KIRKLARELİ VALİLİĞİ	3	875.631.201	81.640.416	262.778.753	12.778.752	94.419.168	10,78	1,46	4,86	32,67%
KIRKLARELİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI	1	700.000	24.192	1	0	24.192	3,46	0,00	0,00	0,00%
KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	3	35.488.088	34.788.087	700.001	0	34.788.087	98,03	0,00	0,00	32,67%
KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	8	592.489.912	610.968	148.864.913	1	610.969	0,10	0,00	0,00	24,00%
KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	11	3.498.507.798	136.858.328	781.822.473	4.822.464	141.680.792	4,05	0,14	0,62	23,92%
KIRKLARELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	5	9.056.138.336	1.097.773.509	84.634.767	84.634.764	1.182.408.273	13,06	0,93	100,00	37,00%
KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	5	52.054.591	507.085	2.054.592	632.446	1.139.531	2,19	1,21	30,78	9,60%
KIRKLARELİ ATATÜRK TOPRAK SU VE TARIMSAL METEOROLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	1	4.025.334	2.984.334	758.008	189.500	3.173.834	78,85	4,71	25,00	79,00%
DEREKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	1	492.283	414.715	1	0	414.715	84,24	0,00	0,00	60,00%
Belediyeler	32	262.175.270	53.521.945	200.861.399	72.247.738	125.769.683	47,97	27,56	35,97	
KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1	9.599.961	0	9.599.961	9.599.961	9.599.961	100,00	100,00	100,00	100,00%
ÜSKÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI	4	9.960.000	0	9.960.000	804.290	804.290	8,08	8,08	8,08	8,75%
BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	2	11.480.926	0	11.480.926	1.773.835	1.773.835	15,45	15,45	15,45	13,50%
BÜYÜKMANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	5	2.550.000	0	2.550.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
DEMİRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	3	34.430.111	0	34.430.111	33.901.990	33.901.990	98,47	98,47	98,47	74,67%
KOFCAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	3	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	4	151.788.483	46.946.556	104.350.000	22.165.062	69.111.618	45,53	14,60	21,24	41,75%
AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	7	23.065.789	6.575.389	16.490.400	4.002.600	10.577.989	45,86	17,35	24,27	13,57%
PEHLİVANKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1	7.300.000	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI	2	9.800.000	0	9.800.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

KIRKLARELİ

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

1.282.304.761

257.132.191

9

Proje Sayısı

13.190.422.047

Toplam Proje Tutarı

8.565.484.853

Toplam Harcama Tutarı

1.282.304.761

Toplam Yıl Ödeneği

257.132.191

Yılı Harcama Tutarı

257.132.191

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

0

3.Dönem Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%20,05

%0,00

%0,00

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcam...
BABAESKİ	0
LÜLEBURGAZ	0
MERKEZ	2.755.284.750
MUHTELİF İLÇE	5.810.200.103
Toplam	8.565.484.853

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı	Toplam Harcama Yüzdesi
Ulaştırma - Haberleşme	8.565.484.853	100,00%
Toplam	8.565.484.853	100,00%

Bakanlık Adı	Toplam Harcama T...
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI	8.565.484.853
Toplam	8.565.484.853

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar To
ASFALT. BAKIM, ONARIM VE TRAFİK ÇALIŞMALARI	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	33.811.419	33.811.419	
KAMULAŞTIRMA	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	85.395.214	85.395.214	
KINALI AYRIMI - ÇERKEZKÖY - SARAY - KIRKLARELİ DEVLET YOLU	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	71.870.169	3.780.000.000	
(EDİRNE - HAVSA) AYRIMI - HASKÖY - KIRKLARELİ BÖLÜNÜŞ YOLU (2...	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	60.763.040	2.623.680.000	
(PINARHİSAR-VİZE) AYR.-DEMİRKÖY-İĞNEADA DEVLET YOLU YAPIMI (9...	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	301.508.000	2.248.317.209	
TEM OTOYOLU VE BAĞLANTI YOLLARI (BABAESKİ KAVŞAĞI-SARAY KAV...	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	420.942.918	823.200.000	
ALPULLU ÇEVRE YOLU	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	308.004.000	1.080.000.000	
PINARHİSAR-LÜLEBURGAZ BÖLÜNÜŞ YOL YAPIMI (BY BSK 7,2 KM)	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	10.000	2.456.018.205	
TARİHİ LÜLEBURGAZ (SOKULLU MEHMET PAŞA) KÖPRÜSÜ	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	60.000.000	
Toplam			1.282.304.761	13.190.422.047	



T.C. ULAŖTIRMA VE
ALTYAPI BAKANLIđI



KARAYOLLARI
GENEL M¼D¼RL¼đ¼

Kırklareli

KIRKLARELİ İLİ KARAYOLU YATIRIMLARI

1.

Bölge M¼d¼rl¼đ¼

KIRKLARELİ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI
NİSAN 2025


Çidemediđin yer senin deđildir.

Halil Rifat PaŖa

ATAT¼RK TOPRAK, SU VE TARIMSAL METEOROLOJİ
ARAŖTIRMA ENSTİT¼S¼ M¼D¼RL¼đ¼ TOPLANTI SALONU
16 NİSAN 2025 saat 14:00

KARAYOLLARI GENEL M¼D¼RL¼đ¼

YOL AđI

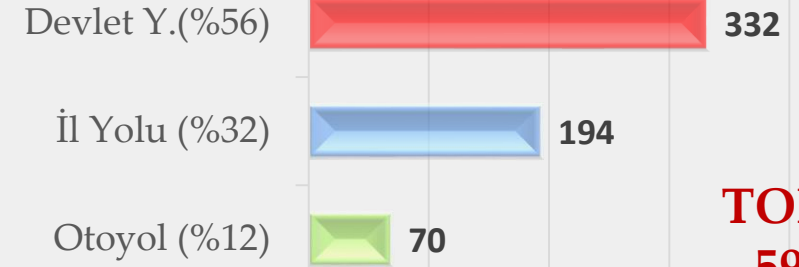


TOPLAM
596 Km

SATIĐ CİNSİ

91,0
15%

■ BSK (km)
■ SK (km)
■ DİĐER (km)

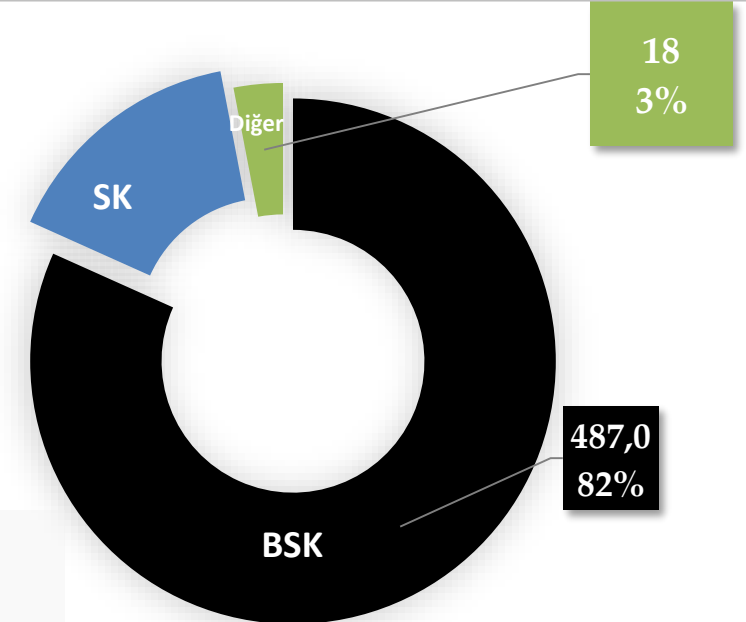

KIRKLARELİ İLİ
596 km



KIRKLARELİ İLİ GENEL BİLGİLERİ

Kırklareli ili sorumluluğumuz altında;

70 km Otoyol,

332 km Devlet Yolu,

194 km İl Yolu olmak üzere toplam **596** km yol ağı bulunmaktadır.

Bu yollarımızın **43%** si Bölünmüş Yoldur. (**255,2** km BY)

İli sınırları içinde, 2025 yılında projelerimizin,

Toplam Proje Bedeli : **15.086 Milyon TL**

Önceki Yılları Harcaması : **7.580 Milyon TL**


2025 Yılı Yatırım Harcaması : **138 Milyon TL**

2025 Yılı Rutin Bakım ve Trafik : **34 Milyon TL**

2025 Kamulaştırma Harcaması : **85 Milyon TL**

2025 YILI TOPLAM HARCAMA : **257 Milyon TL.**

DEVAM EDEN PROJELER

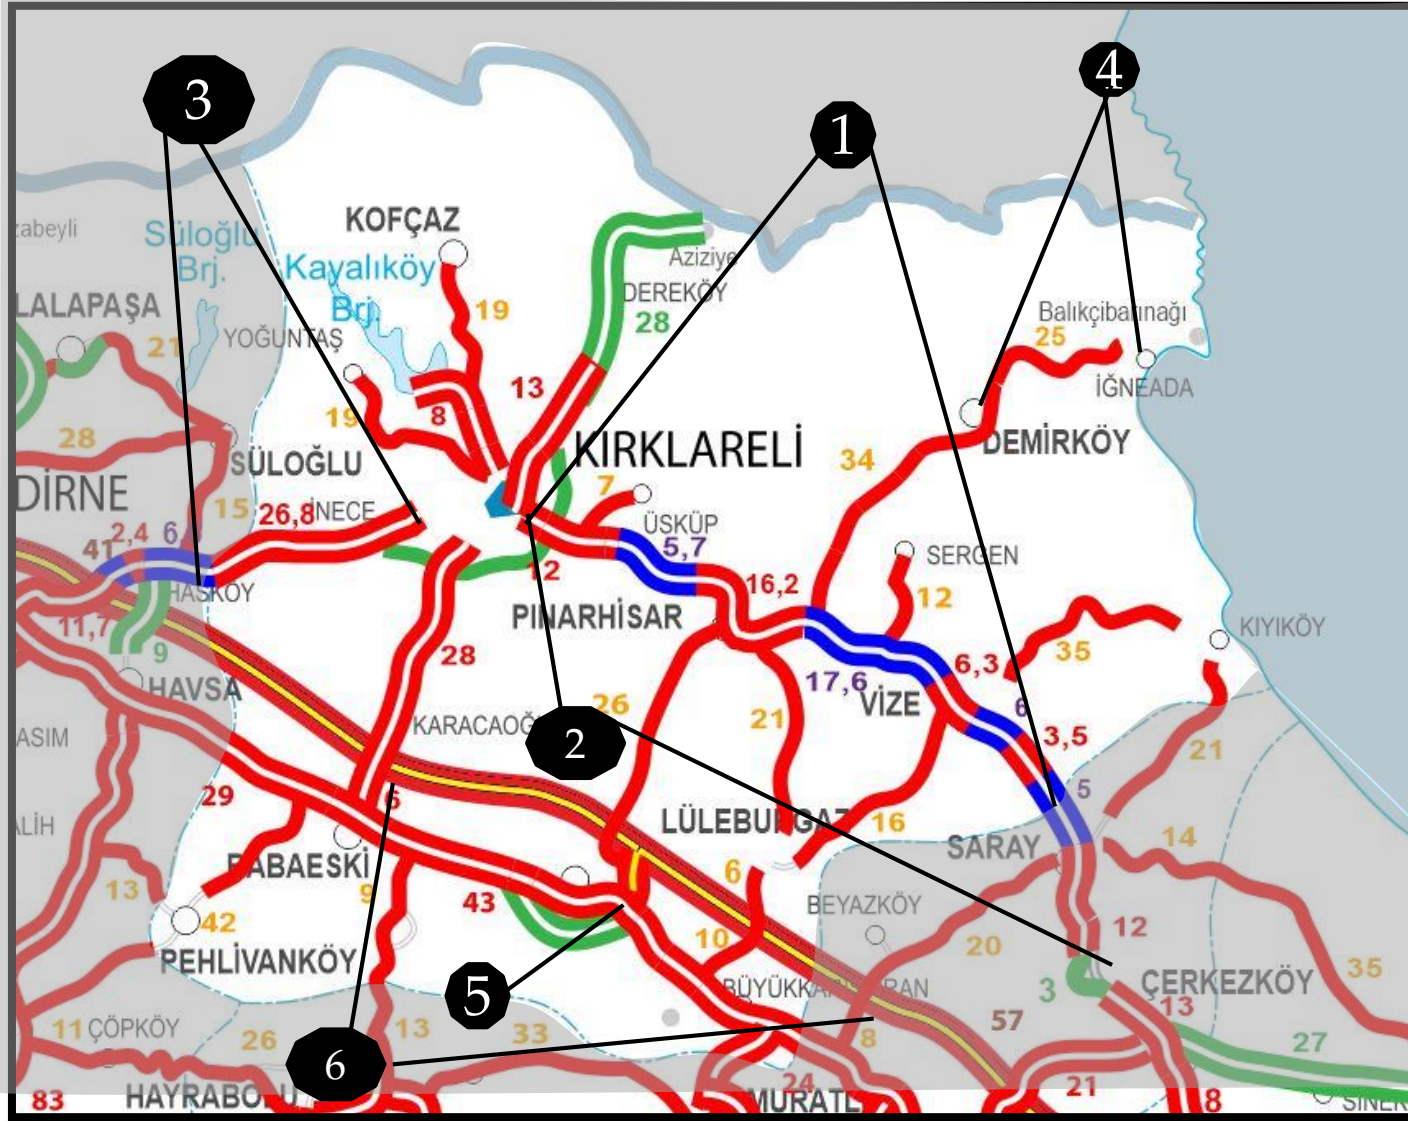

1) SARAY– KIRKLARELİ (PINARHİSAR Ç.Y DAHİL) BY YAPIM

2) SARAY – KIRKLARELİ İKMAL YOLU (KAPAKLI – SARAY VE YENİKÖY ÇY DAHİL)

3) EDİRNE-KIRKLARELİ İKMAL YOLU

4) DEMİRKÖY-İĞNEADA TY YAPIM

5) SOKULLU MEHMET PAŞA KÖPRÜSÜ RESTORASYONU

6) BABAESKİ-SARAY KAVŞAĞI ,TEM OTOYOLU VE BAĞLANTI YOLLARI BÜYÜK ONARIM

Hizmete Açık Otoyollar	
Yapım Çalışmaları Devam Eden Otoyollar	
Hizmete Açık Bölünmüş Yollar	
Yapım Çalışmaları Devam Eden Bölünmüş Yollar	
İhale Edilecek Bölünmüş Yollar	
Projesi Devam Eden Bölünmüş Yollar	
Hizmete Açık Tek Yollar	
Yapım Çalışmaları Devam Eden Tek Yollar	
İhale Edilecek Tek Yollar	

1) SARAY - KIRKLARELİ YOLU



Proje Bedeli
(1.000 TL)

4.292.000



Başlama
Bitiş Tarihi

2019
2025

		KAPSAM	BİTEN	2025 HEDEF
BY		71,1 km	36,8 km (+10,6 km onarım)	
TY				
Çift Tüp Tünel				
Tek Tüp Tünel				
Çift Köprü		4 adet 256 m	2 adet 131 m	
Tek Köprü				
KöprülÜ Kavşak				


MEVCUT 71,1 km/78 dk. PROJELİ 71,1 km/45 dk. YOGT 7.545 AĞIR TAŞIT % 19

- ❑ Proje uzunluğu 71,1 km BY BSK'dır.
- ❑ 2024 yılı sonu itibariyle 36,8 km BY-BSK; 10,6 km BY-BSK onarım ve uzunluğu 2x131 m olan 2 adet çift köprü tamamlanmıştır.
- ❑ 2025 yılında 18,8 km'lik kesimin aşınma imalatlarının tamamlanması hedeflenmektedir.



2025 HEDEFİ

1) SARAY - KIRKLARELİ YOLU

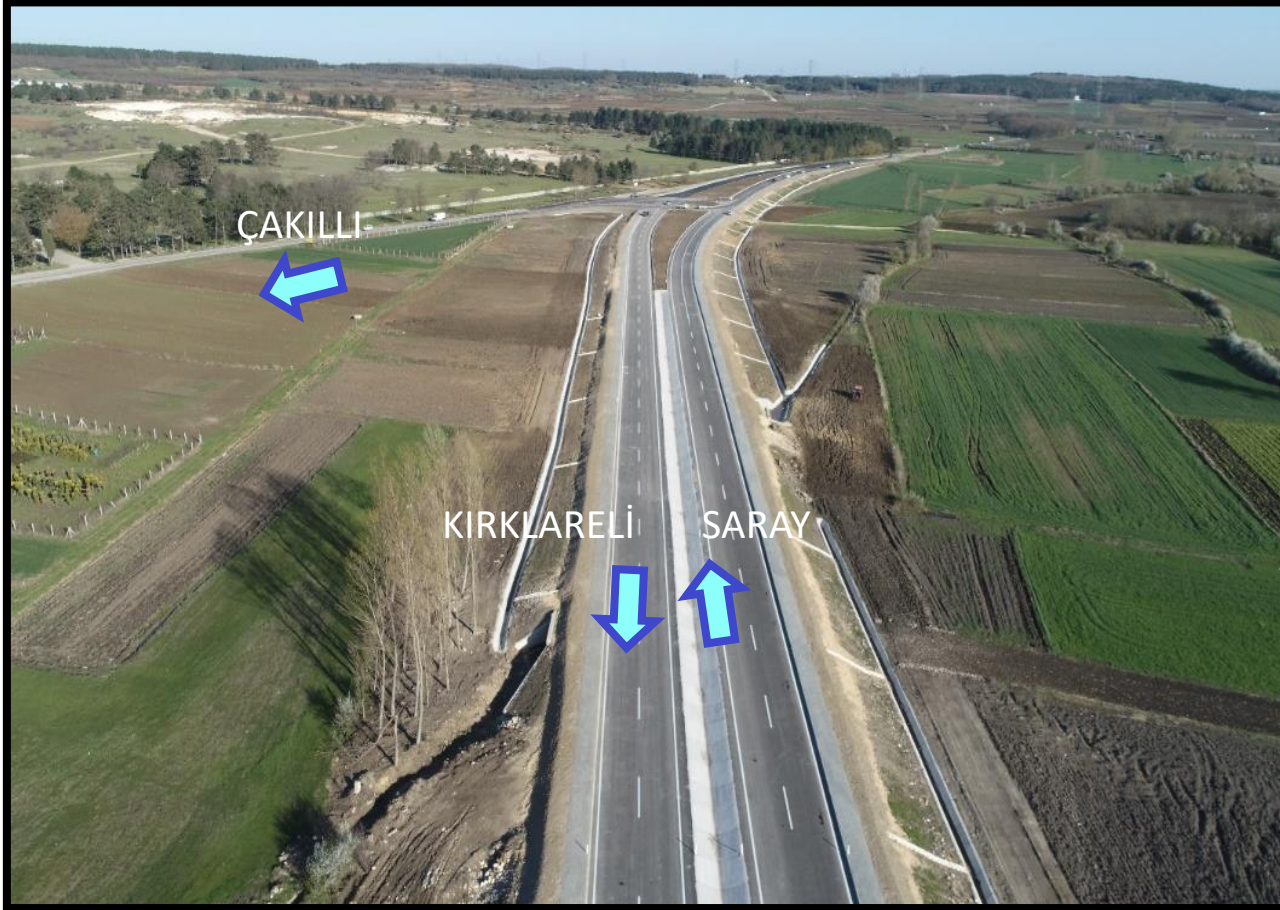

Çakıllı Çevre Yolu Giriş Kavş. Km:11+600



Çakıllı Çevre Yolu Km:12+000-13+000 Arası




1) SARAY - KIRKLARELİ YOLU



Vize Çevreyolu Km: 25+000

1) SARAY - KIRKLARELİ YOLU

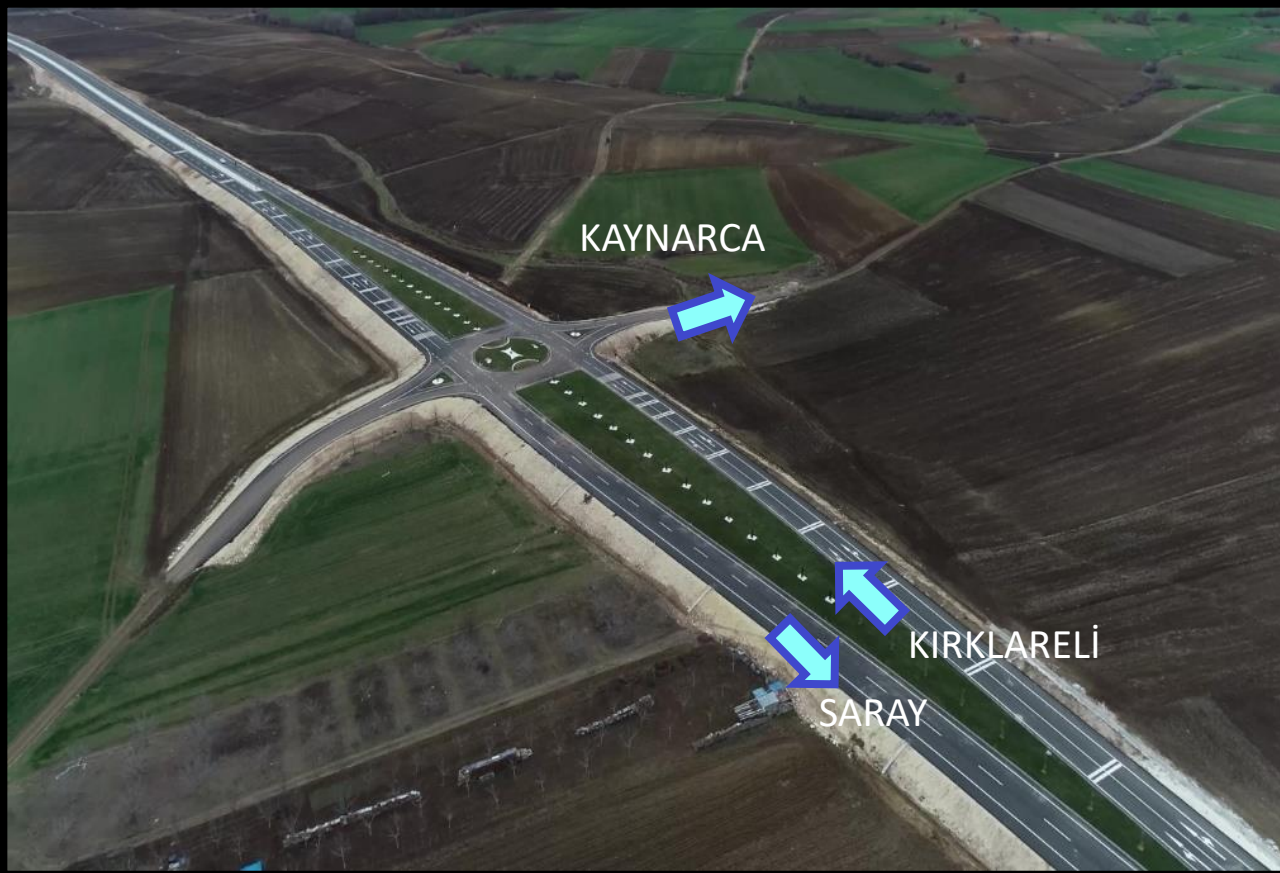


Kaynarca Ayrım Kavşağı Km:55+000



Kaynarca Çıkış Kavşağı Km:57+000

2) SARAY – KIRKLARELİ İKMAL YOLU (KAPAKLI – SARAY VE YENİKÖY ÇY DAHİL)

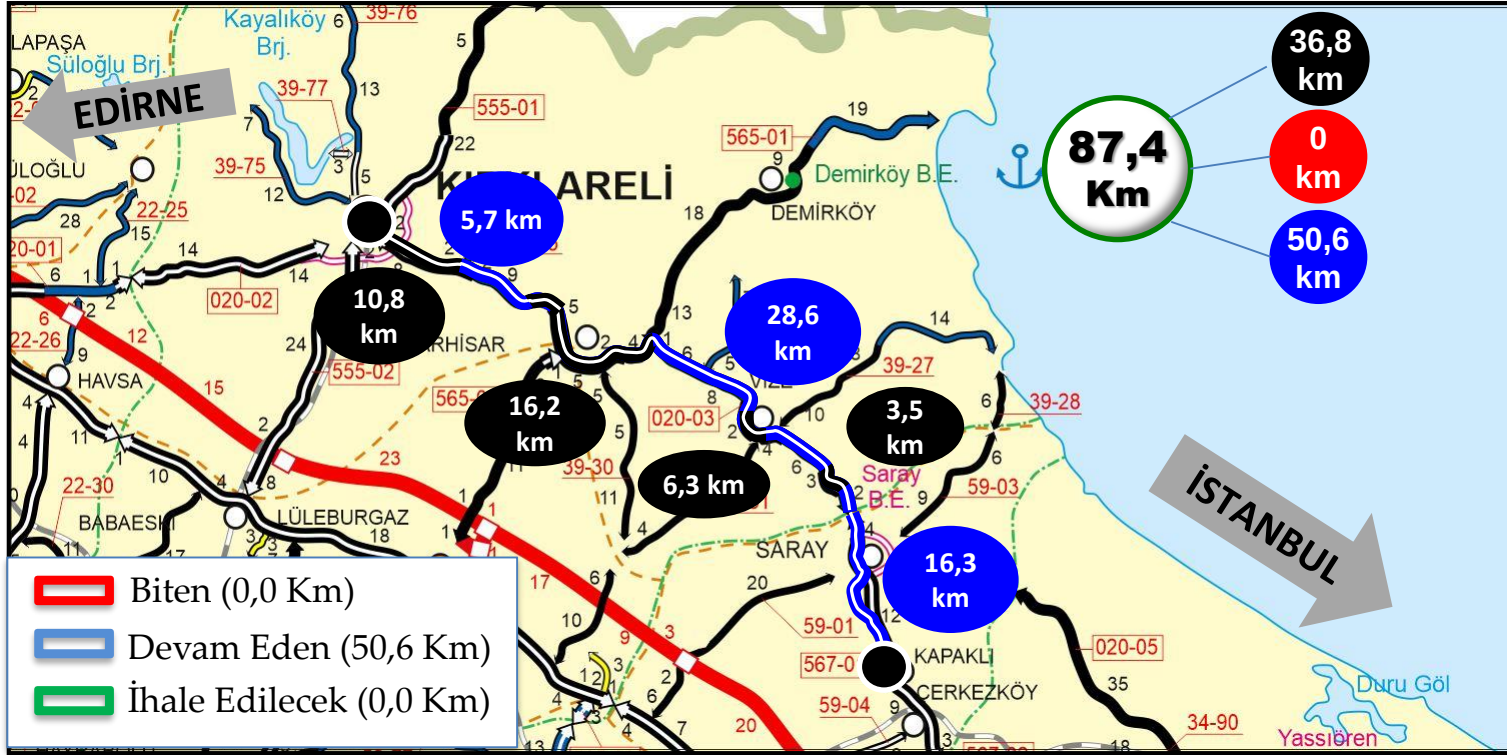

Proje Bedeli
(1.000 TL)

7.490.000



Başlama
Bitiş Tarihi

2025
2026

		KAPSAM	BİTEN	2025 HEDEF
BY		87,4 km	36,8 km	
TY				
Çift Tüp Tünel				
Tek Tüp Tünel				
Çift Köprü		4 adet 256 m	2 adet 131 m	
Tek Köprü				
KöprülÜ Kavşak				


MEVCUT 87,4 km/96 dk. PROJELİ 87,4 km/55 dk. YOGT 7.545 AĞIR TAŞIT % 19

- ❑ Proje uzunluğu 87,4 km BY BSK'dır.
- ❑ Önceki ihale kapsamında 36,8 km BY-BSK ve uzunluğu 2x131 m olan 2 adet çift köprü tamamlanmıştır.



2025 HEDEFİ

3) KIRKLARELİ-EDİRNE YOLU

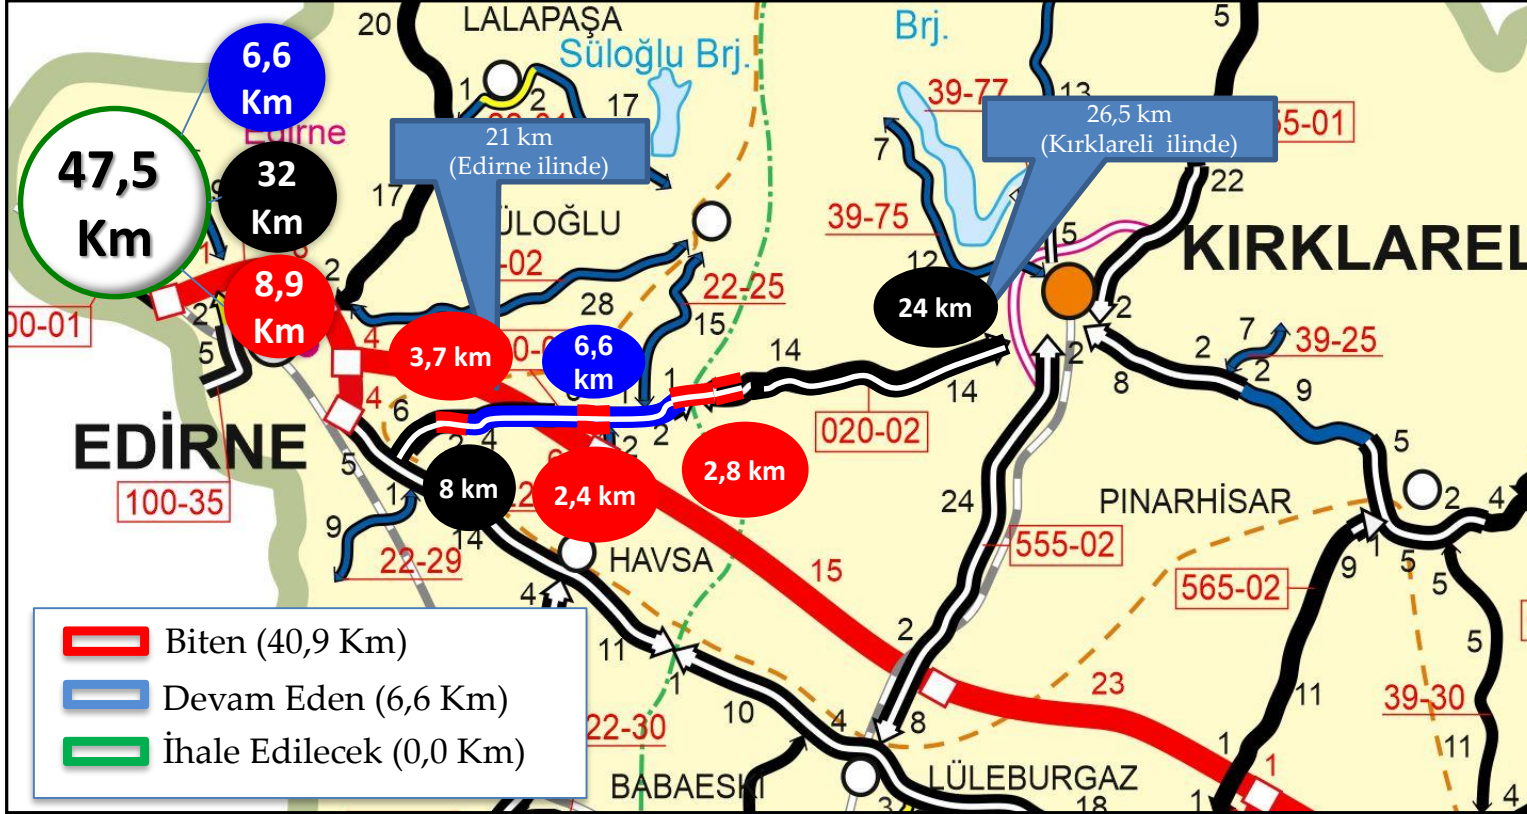Proje Bedeli
(1.000 TL)

5.626.000

Başlama
Bitiş Tarihi2022
2026

		KAPSAM	BİTEN	2025 HEDEF
BY		47,5 km	40,9 Km	
TY				
Çift Tüp Tünel				
Tek Tüp Tünel				
Çift Köprü		8 adet 327 m	7 adet 301 m	
Tek Köprü		3 adet 199 m	2 adet 87 m	1 adet 112 m
KöprülÜ Kavşak				

MEVCUT	52,5 km/63dk	PROJELİ	47,5 km/24dk.	YOGT	4.760	AĞIR TAŞIT	% 9
--------	--------------	---------	---------------	------	-------	------------	-----

- ❑ Proje uzunluğu 47,5 km BY-BSK'dır. Projenin ilk 26,5 km'lik kesimi Kırklareli il sınırında bulunmaktadır.
- ❑ 2024 yılı sonu itibariyle 40,9 km BY-BSK, uzunlukları 2x301 m olan 7 adet çift köprü ve uzunluğu 1x87 m olan 2 adet tek köprü tamamlanmıştır.
- ❑ 2025 yılında Km: 35+691'deki uzunluğu 1x112 m olan Otoyol Köprüsü'nün tamamlanması ve Hasköy Kavşağı'nda toprak işleri ve sanat yapılarında çalışılması hedeflenmektedir.



Km: 37+214



Km: 39+500



3) EDİRNE – KIRKLARELİ YOLU




Km: 18+400



Km: 25+100

4) DEMİRKÖY – İĞNEADA YOLU

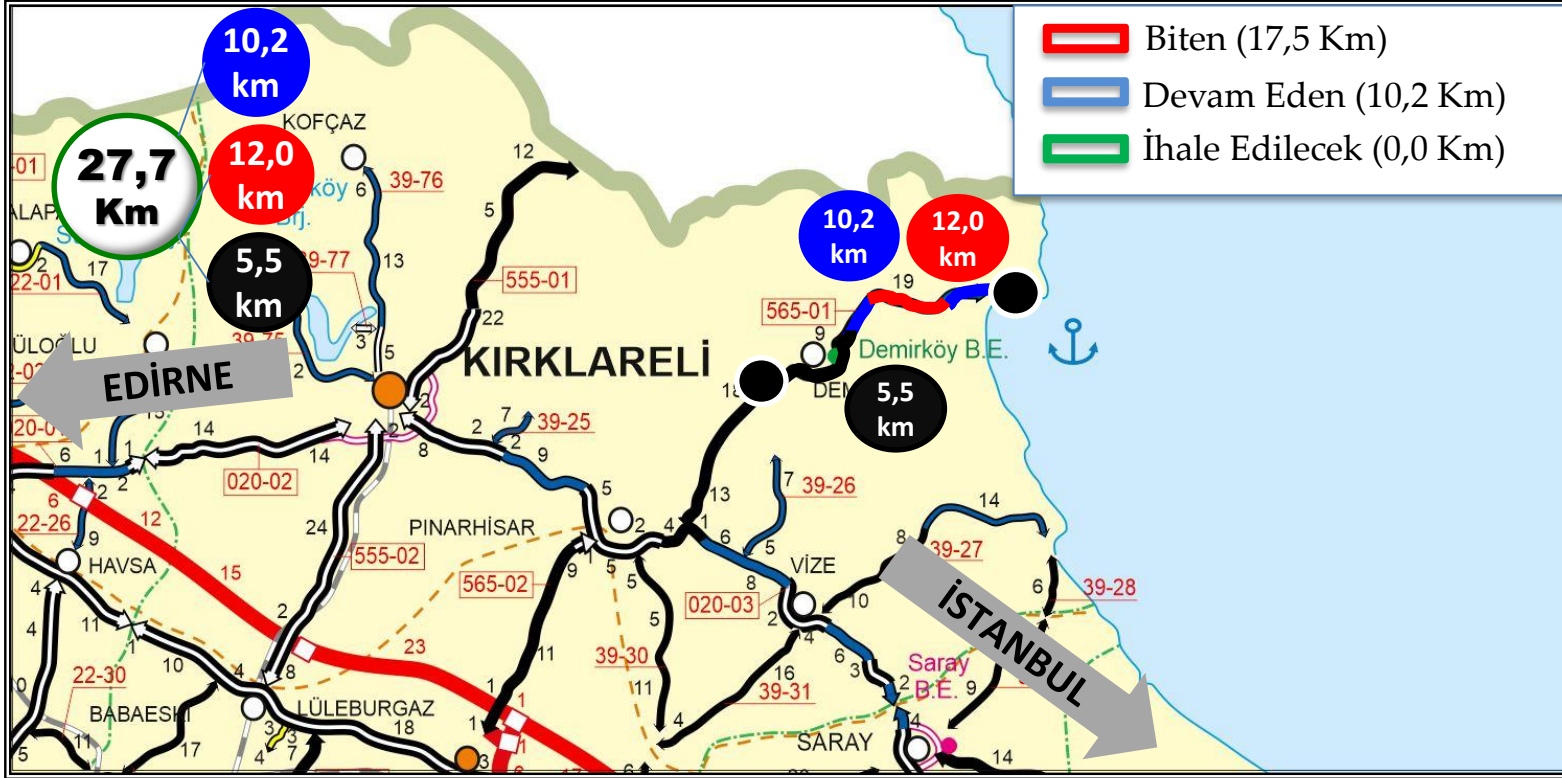Proje Bedeli
(1.000 TL)

2.873.000

Başlama
Bitiş Tarihi2021
2026

		KAPSAM	BİTEN	2025 HEDEF
BY				
TY		27,7 km	17,5 km	5,7 km
Çift Tüp Tünel				
Tek Tüp Tünel				
Çift Köprü				
Tek Köprü		3 adet 150 m	3 adet 150 m	
Köprülü Kavşak				

MEVCUT	28,5 Km/34 dk	PROJELİ	27,7 Km/18,5 dk	YOGT	1.990	AĞIR TAŞIT	% 9
--------	---------------	---------	-----------------	------	-------	------------	-----

- ❑ Proje uzunluğu 27,7 Km TY BSK'dır.
- ❑ 2024 yılı sonu itibariyle 17,5 km TY-BSK ve 1x150 m uzunluğunda 3 adet tek köprü tamamlanmıştır.
- ❑ 2025 yılında Km: 22+000 – 27+700 arasındaki 5,7 km'lik TY-BSK'lı kesimin tamamlanması hedeflenmektedir.



2025 HEDEFİ




Demirköy Çevre Yolu



Km:16+000



5) KIRKLARELİ İLİNDE BULUNAN TARİHİ LÜLEBURGAZ (SOKULLU MEHMET PAŞA) KÖPRÜSÜ RESTORASYON UYGULAMASI İŞİ

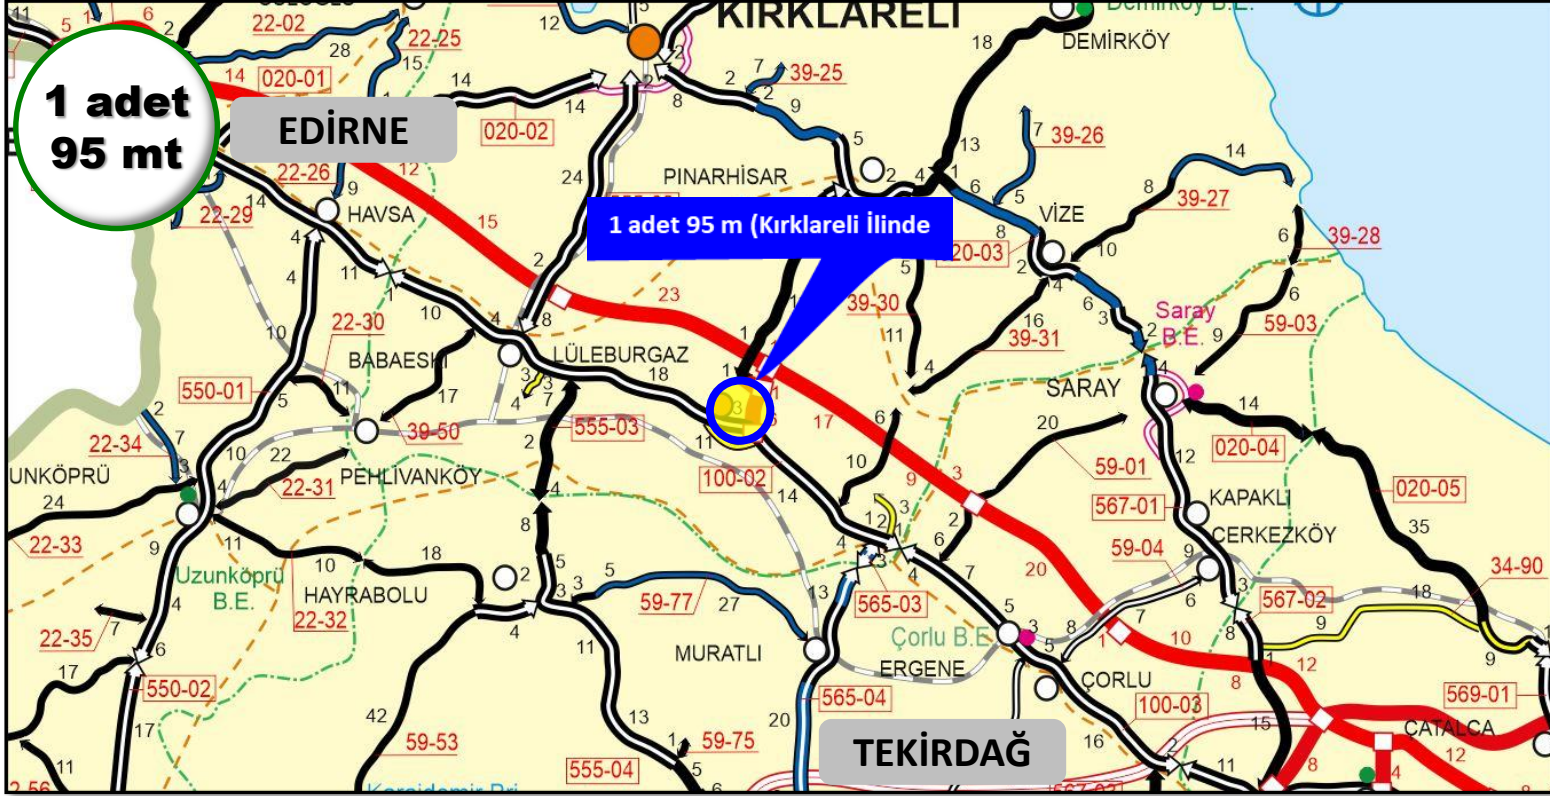

Proje Bedeli
(1.000 TL)

80.000



Başlama
Bitiş Tarihi

2021
2026

		KAPSAM	BİTEN	2025 HEDEF
BY	AA			
TY	A			
Çift Tüp Tünel	BB			
Tek Tüp Tünel	B			
Çift Köprü	YY			
Tarihi Köprü	Y	1 adet 95 m		
Köprülü Kavşak	YY			

MEVCUT

95 mt

PROJELİ

95 mt

YOĞT

AĞIR TAŞIT

- ❑ Proje 1 adet 95 m uzunluğunda tarihi köprüden oluşmaktadır.
- ❑ 2021 yılında yer teslimi yapılmıştır. Araç trafiğine açık olan köprüde çalışma yapılması halinde oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi için Kırklareli Valiliği'nin talebi üzerine DSİ tarafından yapılacak alternatif 2 adet köprü tamamlandıktan sonra çalışmalara başlanabilmektedir.
- ❑ 2025 yılında kemerlerin askıya alınıp beton ve asfalt eklentilerin kaldırılması, kazı ve temizlik işlerinin yapılması hedeflenmektedir.



2025 HEDEFİ



Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü
Genel Görünüm-1



Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü
Genel Görünüm-2

- ❑ Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi'nde yer alan tarihi Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü, 1565 yılında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. 95 m uzunluğunda, 5,5 m genişliğindedir. Kesme taş örgülü 4 sivri kemer, orta ayakta hafifletme gözü ve yanlarda boşaltma gözlerinden teşkil edilmiştir.
- ❑ Araç trafiğine açık olan köprüde çalışma yapılması halinde oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi için Kırklareli Valiliği'nin talebi üzerine DSİ tarafından yapılacak alternatif 2 adet köprü tamamlandıktan sonra çalışmalara başlanabilmektedir.



6) BABAESKİ KAVŞAĞI - SARAY KAVŞAĞI TEM OTOYOLU ÜSTYAPI İYİLEŞTİRİLMESİ



Proje Bedeli
(1.000 TL)


1.200.000



Başlama
Bitiş Tarihi

2022
2026

		KAPSAM	BİTEN	2025 HEDEF
BY		53 km	21 km	19 km
TY				
Çift Tüp Tünel				
Tek Tüp Tünel				
Çift Köprü				
Tek Köprü				
KöprülÜ Kavşak				

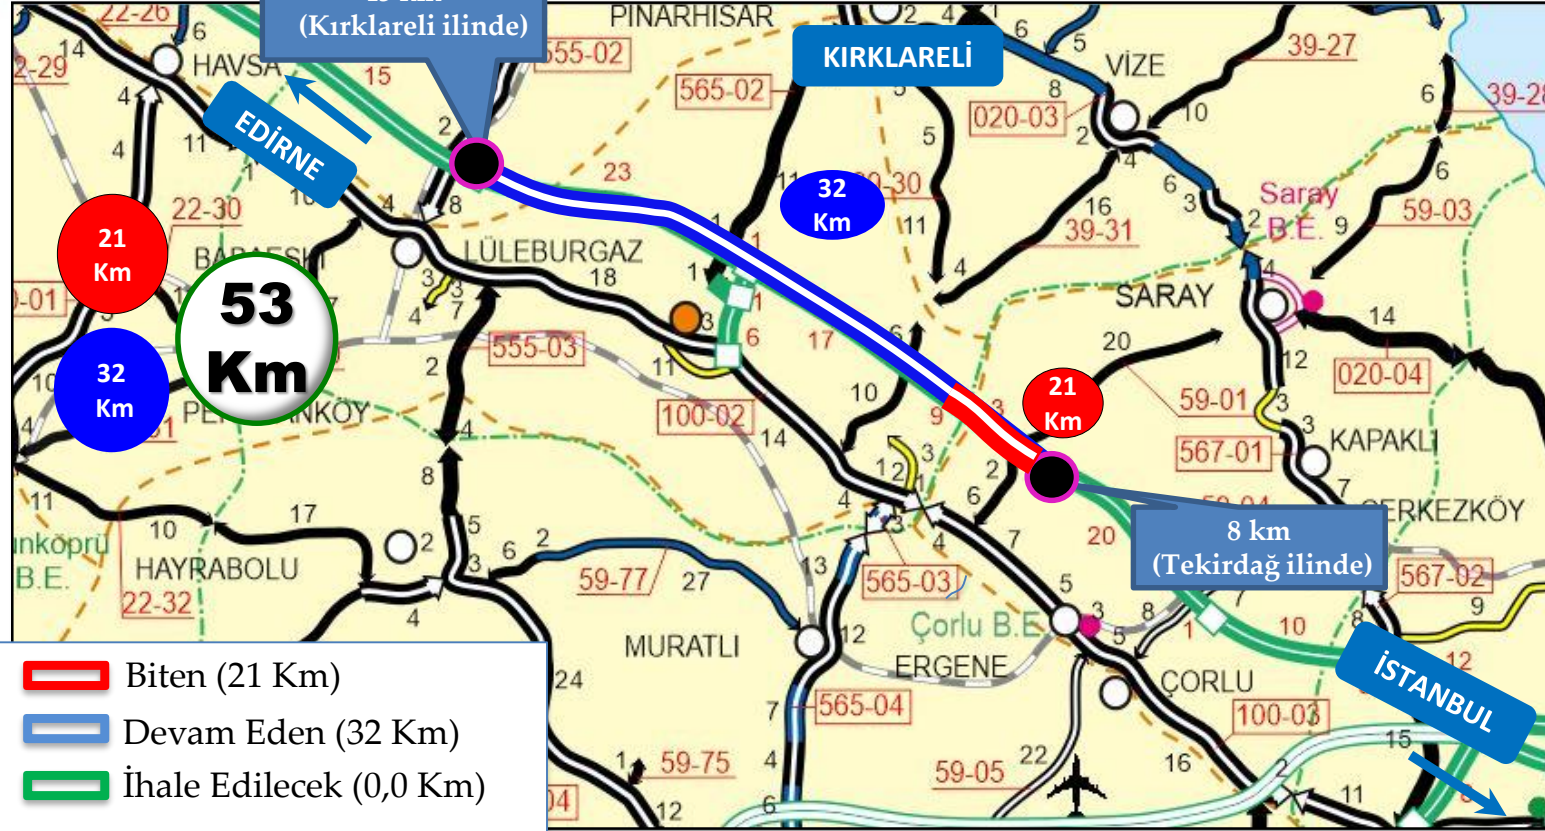

- Biten (21 Km)
- Devam Eden (32 Km)
- İhale Edilecek (0,0 Km)

MEVCUT	53 Km	PROJELİ	53 Km	YOGT	22.108	AĞIR TAŞIT	% 38
--------	-------	---------	-------	------	--------	------------	------

- Proje uzunluğu 53 km OY BSK'dır.
- 2023 yılında Saray Kavşağı- Lüleburgaz Kavşağı arasında 10,5 Km OY BSK'lı olarak üstyapı yenilemesi tamamlanmıştır .
- 2024 yılında 9 Km BY-BSK Onarım yapılmış olup, toplamda 19,5 Km tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.
- 2025 yılında 1,5 Km imalat tamamlanmıştır.
- 2025 yılında Km:85+000-Km:104+040 arasında üstyapı yenileme çalışması yapılacaktır.



6) BABAESKİ KAVřAđI - SARAY KAVřAđI TEM OTOYOLU ÜSTYAPI İYİLEřTİRİLMESİ İřİ



Lüleburgaz-Saray Kavřađı Arası O3/07 Km:13+000 (İstanbul Yönü)



6) BABAESKİ KAVřAđI - SARAY KAVřAđI TEM OTOYOLU ÜSTYAPI İYİLEřTİRİLMESİ İřİ



Lüleburgaz-Saray Kavřađı Arası O3/07 Km:17+000 (Edirne Yönü)



6) BABAESKİ KAVŖAđI - SARAY KAVŖAđI TEM OTOYOLU ÜSTYAPI İYİLEŖTİRİLMESİ İŖİ



Lüleburgaz-Saray KavŖađı Arası O3/07 Km:11+000 (İstanbul Yönü)



6) BABAESKİ KAVŖAđI - SARAY KAVŖAđI TEM OTOYOLU ÜSTYAPI İYİLEŖTİRİLMESİ İŖİ



Lüleburgaz-Saray KavŖađı Arası O3/08 Km:5+000 (Edirne Yönü)

RUTİN YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

RUTİN BAKIM ONARIM VE KAR MÜCADELESİ ÇALIŞMALARI İÇİN 2025 YILI HARCAMASI **32.500.000 TL** DİR.

020-03 KIRKLARELİ-VİZE DEVLET YOLU YAMA ÇALIŞMASI



RUTİN YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

RUTİN BAKIM ONARIM VE KAR MÜCADELESİ ÇALIŞMALARI

565-01 LÜLEBURGAZ-DEMİRKÖY DEVLET YOLU BSK SERİMİ



RUTİN YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

RUTİN BAKIM ONARIM VE KAR MÜCADELESİ ÇALIŞMALARI

100-02 LÜLEBURGAZ-ÇORLU DEVLET YOLU YAMA ÇALIŞMASI





RUTİN YAPILAN ÇALIřMALARIMIZ

RUTİN BAKIM ONARIM VE KAR MÜCADELESİ ÇALIřMALARI

100-02 BABAESKİ-LÜLEBURGAZ DEVLET YOLU ORTA HENDEK TEMİZLİK ÇALIřMASI



RUTİN YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

RUTİN BAKIM ONARIM VE KAR MÜCADELESİ ÇALIŞMALARI

565-02 KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ DEVLET YOLU TEMİZLİK ÇALIŞMASI



RUTİN YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

RUTİN BAKIM ONARIM VE KAR MÜCADELESİ ÇALIŞMALARI

565-02 VİZE-SARAY KARLA MÜCADELE



RUTİN YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ







RUTİN YAPILAN ÇALIŖMALARIMIZ

2025 YILINDA TRAFİK GÜVENLİđİ ÇALIŖMALARI İÇİN **1.500.000 TL** HARCAMA YAPILMIŖTIR.

TRAFİK GÜVENLİđİ
ÇİZGİ ÇALIŖMALARI

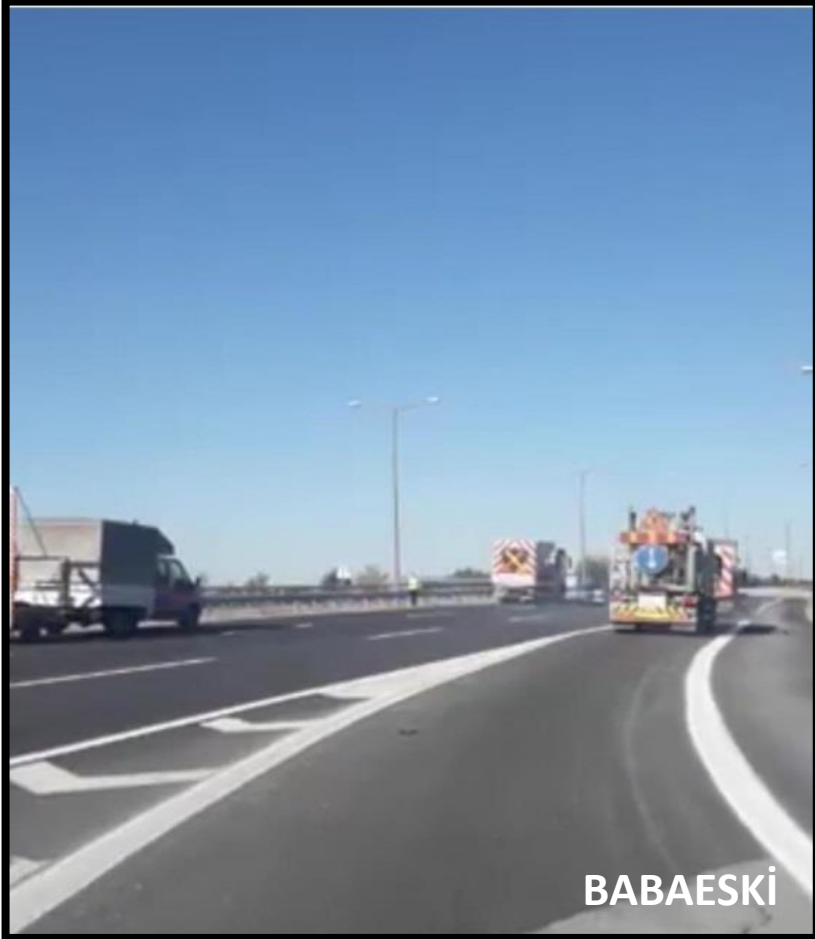

BABAESKİ

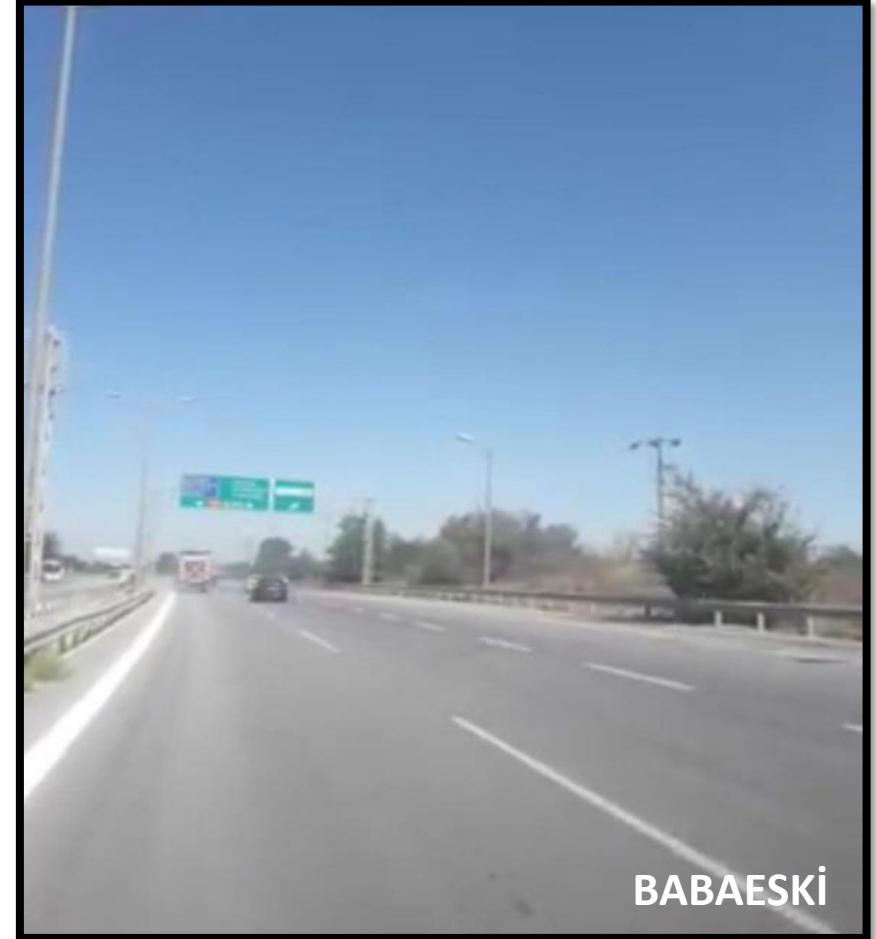

BABAESKİ

RUTİN YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

TRAFİK GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARIMIZ



KIRKLARELİ



KIRKLARELİ




RUTİN YAPILAN ÇALIŖMALARIMIZ

TRAFİK GÜVENLİđİ ÇİZGİ ÇALIŖMALARI



BABAESKİ

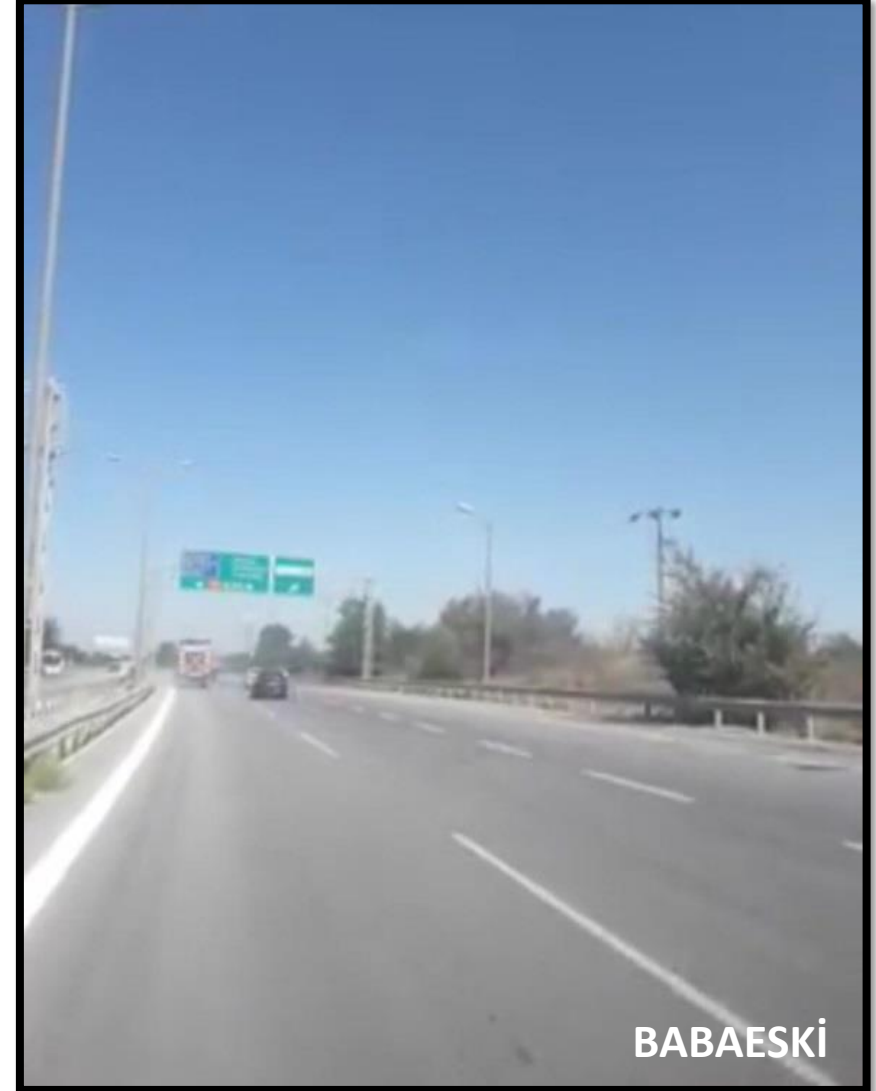

BABAESKİ

RUTİN YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

TRAFİK GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI



D020-03

DÜŞEY İŞARETLEME ÇALIŞMALARI

RUTİN YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

TRAFİK GÜVENLİĞİ OTOKORKULUK ÇALIŞMALARI



D 016-02 KM:15+100 (ÖNCESİ)



D 016-02 KM:15+100 (SONRASI)




RUTİN YAPILAN ÇALIŖMALARIMIZ

TRAFİK GÜVENLİđİ ULAŖIM ETÜTLERİ ÇALIŖMALARI



ARZ EDERİZ.

Remzi TURHAN
Bölge Müdür Yrd.

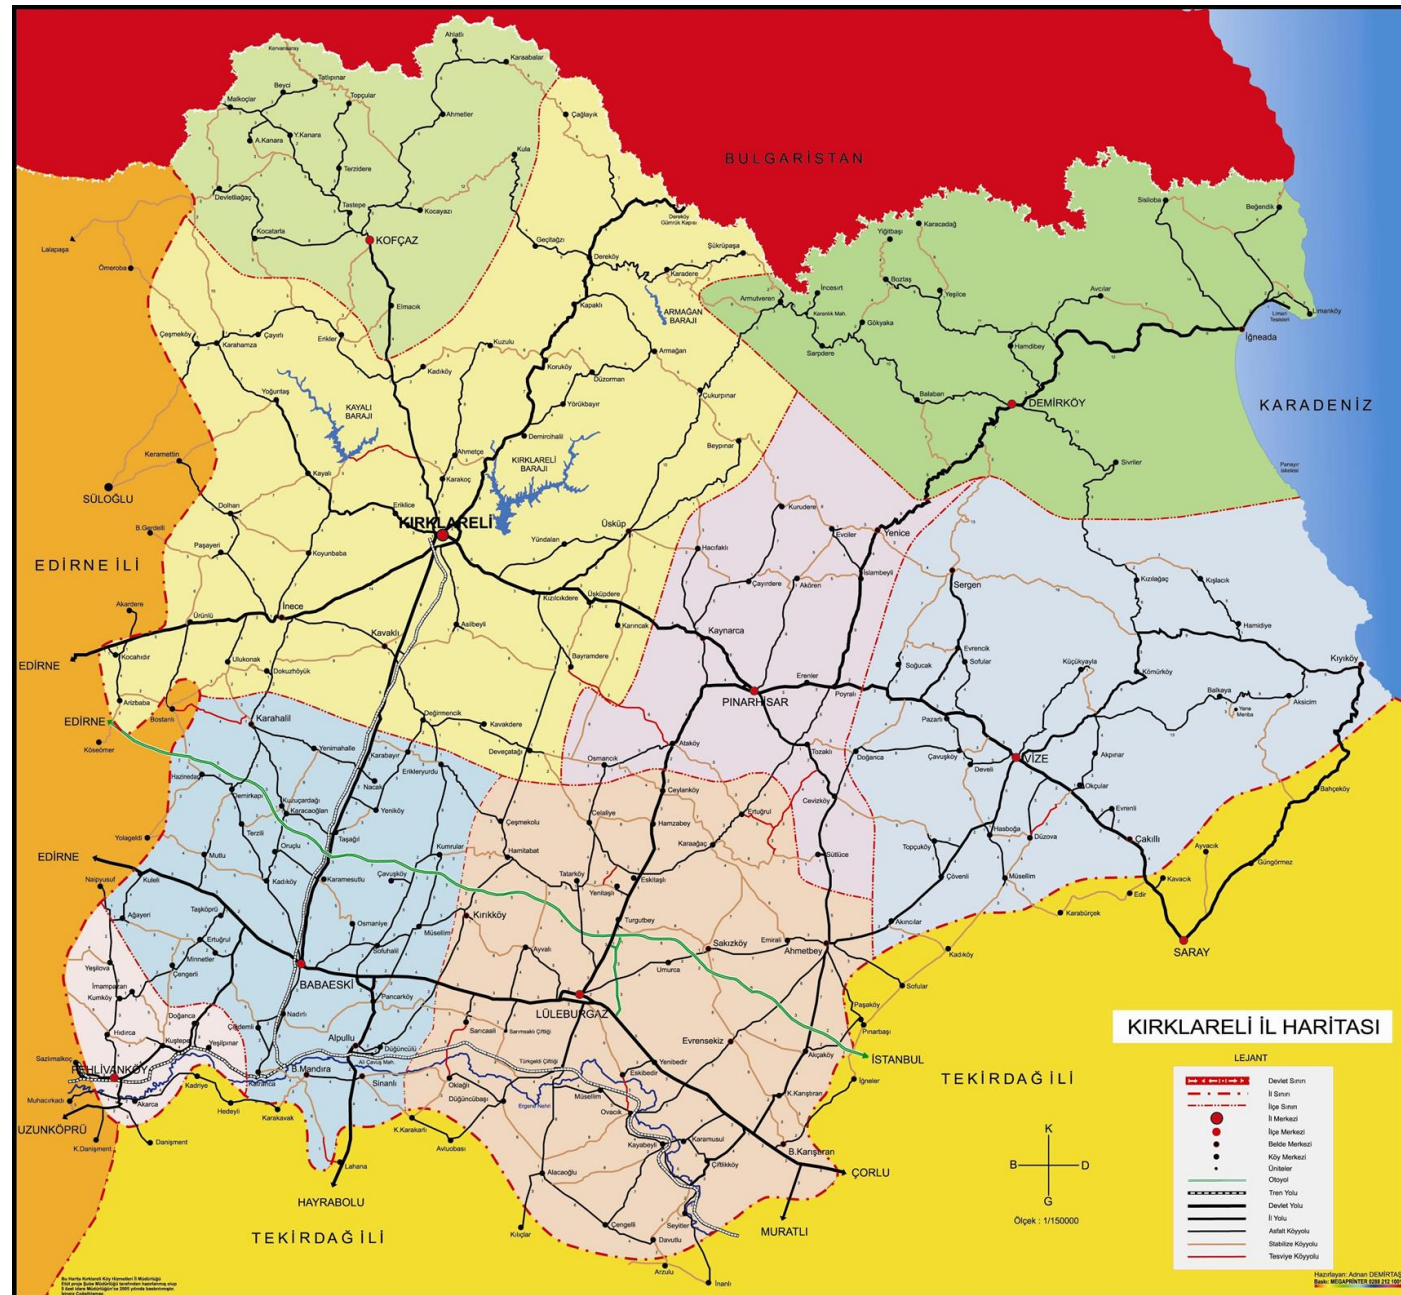

KIRKLARELİ

42
Proje Sayısı9.559.444.952
Toplam Proje Tutarı449.016.086
Toplam Harcama Tutarı534.225.533
Toplam Yıl Ödeneği54.383.297
Yılı Harcama Tutarı

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

54.383.297

534.225.533

54.383.297

1.Dönem Harcama Tutarı

%10,18

0

2.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

0

3.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcam...
BABAESKİ	12.825.307
DEMİRKÖY	5.859.168
KOÇAZ	16.728.120
LÜLEBURGAZ	89.374.408
MERKEZ	129.682.906
MUHTELİF İLÇE	140.346.849
PINARHİSAR	54.199.328
VİZE	0
Toplam	449.016.086

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı	Toplam Harcama Yüzdesi
Tarım	449.016.086	100,00%
Toplam	449.016.086	100,00%

Bakanlık Adı	Toplam Harcama T...
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI	449.016.086
Toplam	449.016.086

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam H
KIRKLARELİ KADIKÖY GÖLETİ VE SULAMASI (1.930.000 M3)(5.000 DEKAR)	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	10.000.000	85.083.272	14
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	28.500.000	206.808.639	94
KIRKLARELİ KIZILCIKDERE SULAMASI İKMALİ (14.220 DEKAR)	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	250.000.000	542.209.839	85
PINARHİSAR YENİCE BARAJI VE SULAMASI (3.800.000 M3)(14.070 DEKA...	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	80.000.000	129.980.921	49
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ 2. KISIM	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	15.000.000	139.108.596	17
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ 3. KISIM	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	5.000.000	320.000.000	
BABAESKİ PEKMEZDERE TAŞKIN KORUMASI 1. KISIM	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	250.000.000	
BABAESKİ YENİMAHALLE TAŞKIN KORUMASI	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	676.358	13.501.665	12
DEĞİRMENCİK TAŞKIN KORUMASI	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	60.000.000	
DEMİRKÖY SİVRİLER GÖLETİ VE SULAMASI (390.000 M3)(1.260 DEKAR)	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	5.000.000	69.076.679	5
Toplam			534.225.533	9.559.444.952	394.



TÜRKİYE
YÜZYILI

100
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YÜZÜNCÜ YILI



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Kırklareli İli Koordinasyon Toplantısı

16 Nisan 2025



TOPRAK POTANSİYELİ VE KULLANIMI KIRKLARELİ İLİ

KIRKLARELİ İLİ TOPRAK POTANSİYELİ	Toplam (ha)
Tarıma Elverişli Arazi	249 538
DSİ'ce Sulamaya Elverişli Arazi	131.245
Etüd Edilen Arazi (DSİ)	155.009
Ekonomik Sulanabilir Arazi Varlığı (DSİ)	57.461
Sulamaya Açılan Saha (DSİ) %71	40 982
İnşaat Aşamasındaki Saha %10	5 523
Planlama/Proje Aşamasındaki Saha %19	10 956



YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU

KURULUŞUN ADI	: DSİ 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
YATIRIM İZLEME DÖNEMİ	: 1
TOPLAM PROJE SAYISI	: 42
PROJELERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI	
Tarım Sektörü	: 40
Hizmet Sektörü	: 1
Enerji Sektörü	: -
Transfer (Kamulaştırma)	: 1
TOPLAM PROJE BEDELİ	: 9.782.299.740 TL
TOPLAM ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	: 381.048.064 TL
TOPLAM YILI ÖDENEĞİ	: 534.231.523 TL
TOPLAM YILI HARCAMA	: 54.383.297 TL
YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	: 1
PROJELERİN DURUMU	:
Başlanmayan Proje Sayısı	: 16
Biten Proje Sayısı	:
Devam Eden Proje Sayısı	: 26
İhale Aşamasında Proje Sayısı	:



KIRKLARELİ İL YATIRIMLARI BÜYÜK SU İŞLERİ




T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI

KIZILCIKDERE SULAMASI İKMALİ EKSİK İMALAT TAMAMLAMASI



KIZILCIKDERE SULAMASI

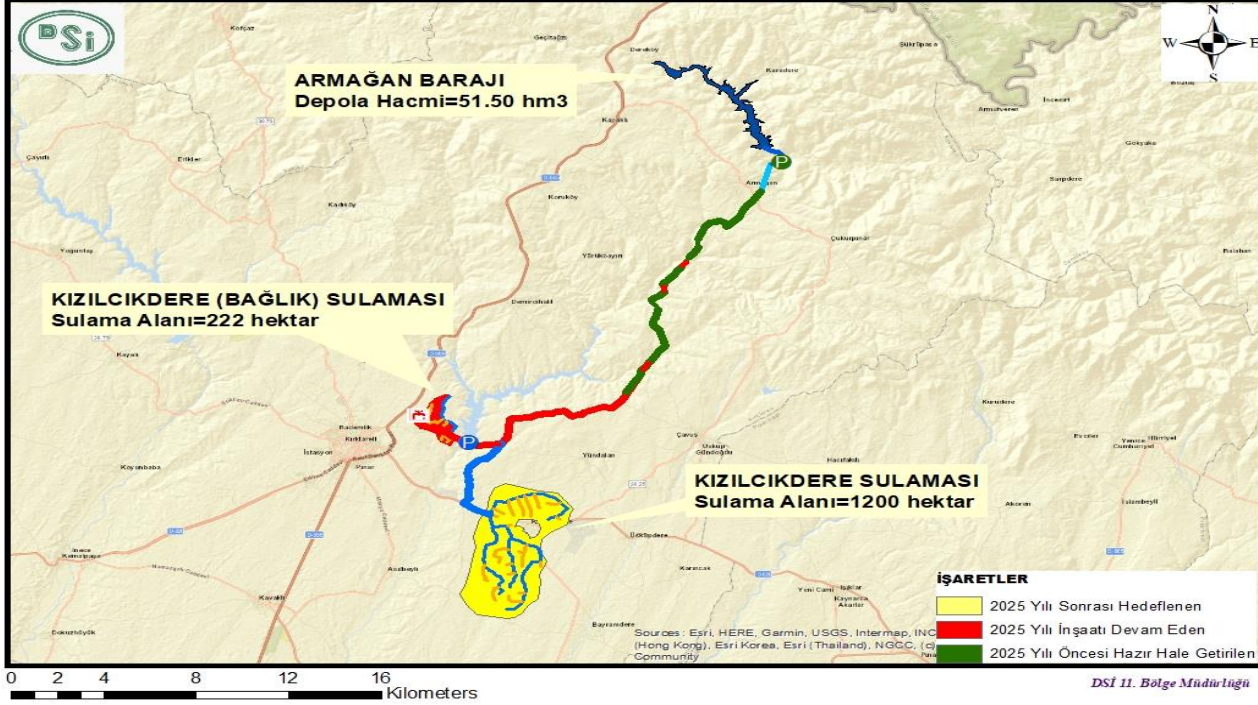

Fayda	1.422 ha Sulama – 13,32 hm ³ /yıl içmesuyu
Sulama Şebekesi (C/P)	Pompaj
Pompaj Terfi Yüksekliği	19 m
İhale Tarihi	15.03.2023
Sözleşme Tarihi	12.05.2023
İhale Bedeli	248.800.000 TL
İşe Başlama Tarihi	22.05.2023
İş Bitiş Tarihi	30.12.2026
Yüklenici Firma	MAKFEN YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
Proje Tutarı	611.724.560 TL
Kalan Proje Tutarı	501.915.321 TL
2025 Yılı Ödeneği	250.000.000 TL
2025 Yılı Revize Ödeneği	250.000.000 TL
2025 Yılı Harcama	28.183.377 TL
Fiziki Gerçekleşme	%20 %44 (İşin Bütününde)
Parasal Gerçekleşme	%20
2025 Sulama Hedefi	400 ha

PROJE UYGULAMA DURUMU:

- ✓ Tasfiye öncesi iletim hattının 11 km işletme bakım yolu yapıldı. İletim önceki işler kapsamında 11 744 m CTP boru, 460 m çelik boru olmak üzere toplam 12 234 m iletim hattı imalatı yapıldı. Regülasyon havuzu, Pompa istasyonu ve Elektrik Binası kaba inşaatları tamamlandı. Regülasyon havuzu ile iletim hattı arası 560 m HDPE hattı ENH inşaatı tamamlandı.
- ✓ Mevcut iş kapsamında ise 2024 yıl sonuna kadar su iletim hattı üzerinde toplamda 3 612 m CTP boru döşenmiştir.
- ✓ Bu yıl içerisinde Su iletim hattı Km 21+000 deki içme suyu ayırımına kadar CTP boru iletim hattı imalatları (toplamda 1 000 m çelik boru 4 500 metre CTP boru) ile 7 000 m uzunluğundaki CTP içme suyu hattı tamamlanacaktır.

2024 yılı ve öncesi
tamamlanan

2025 yılı hedefi

2026 ve sonrası kalan

400 ha

1022 ha



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI

KIZILCIKDERE SULAMASI İKMALİ EKSİK İMALAT TAMAMLAMASI



100
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YÜZÜNCÜ YILI





KIRKLARELİ PINARHİSAR YENİCE GÖLETİ VE SULAMASI



Sulama Alanı	1.407 ha
Gövde Tipi	Kil Çekirdekli Kaya Dolgu
Temelden-Talvegden Yükseklik (m)	36,03 / 32,00
Depolama Hacmi (hm ³)	3,80
Gövde Hacmi (hm ³)	0,24
İhale Tarihi	05.01.2017
Sözleşme Tarihi	16.03.2017
İhale Bedeli	16.934.325 TL
İşe Başlama Tarihi	24.03.2017
İş Bitiş Tarihi	28.10.2025
Yüklenici Firma	AK SAV İNŞAAT HAFRİYAT PETROL VE MADENCİLİK SANAYİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Proje Tutarı	313.742.235 TL
Kalan Proje Tutarı	64.806.731 TL
2025 Yılı Ödeneği	68.777.207 TL
2025 Yılı Revize Ödeneği	68.777.207 TL
2025 Yılı Harcama	3.970.473 TL
Fiziki Gerçekleşme	%80
Parasal Gerçekleşme	%80
2025 Sulama Hedefi	400 ha
PROJE UYGULAMA DURUMU:	
✓ İş kapsamında 400 ha sulama sahası performans hedefi bulunmaktadır.	



KIRKLARELİ İLİ - TOPLULAŞTIRMA ve TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ

SIRA	İŞİN ADI	FAYDA		MALİYET (TL)	KALAN MALİYET (TL)	GERÇEKL EŞME (%)	2025 YILI ÖDENEĞİ	2025 YILI HARCAMA
		PROJE ALANI (ha)	YERLEŞİM BİRİMİ					
1	Kırklareli Merkez 1.Kısım AT ve TIGH	40.000	15	392 643 560	111 844 576	73	28 500 000	20 999 905
2	Kırklareli 2. Kısım AT ve TIGH	28.652	12	164 372 028	136 913 069	17	15 000 000	-
3	Kırklareli 3. Kısım AT ve TIGH	29.848	13	286 866 610	286 866 610	-	5 000 000	-



KIRKLARELİ İL YATIRIMLARI KÜÇÜK SU İŞLERİ



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI

KIRKLARELİ MERKEZ KADIKÖY GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ



Maksadı	Depolama Hacmi (hm³)	1,93
	Sulama (ha)	418
	İçmesuyu (hm³/yıl)	-
	Kurulu Güç (MW)	-
	Enerji Üretimi (GWh/yıl)	-
Gövde Tipi	Kil Çekirdekli Kaya Dolgu	
Temelden / Talvegden Yükseklik (m)	31,07 / 27,48	
Gövde Hacmi (m³)	0,14	
İhale Tarihi	03.10.2022	
Sözleşme Tarihi	19.12.2022	
Sözleşme Bedeli	36.421.221 TL	
İşe Başlama Tarihi	23.12.2022	
Son İş Bitim Tarihi	12.06.2026	
Yüklenici Firma	AYZ + Canip Yıldırım ÖZALTAŞ İş Ortaklığı	
Proje Tutarı	95.620.274 TL	
Kalan Proje Tutarı	64.266.310 TL	
2025 Yılı Ödeneği	10.000.000 TL	
2025 Yılı Harcama	9.999.986 TL	
Parasal Gerçekleşme	% 34	
Fiziki Gerçekleşme	% 34 (Tümünde % 54)	
2025 Sulama Hedefi	100 ha	
AÇIKLAMA		
✓ İş kapsamında 100 ha sulama sahası performansı hedefi bulunmaktadır.		



Maksadı	Depolama Hacmi (hm³)	0,39
	Sulama (ha)	122
	İçmesuyu (hm³/yıl)	0,09
	Kurulu Güç (MW)	-
	Enerji Üretimi (GWh/yıl)	-
Gövde Tipi	Kil Çekirdekli Kaya Dolgu	
Temelden / Talvegden Yükseklik (m)	27,30/ 22,70	
Gövde Hacmi (m³)	0,05	
İhale Tarihi	10.01.2023	
Sözleşme Tarihi	14.03.2023	
Sözleşme Bedeli	31.023.023 TL	
İşe Başlama Tarihi	16.03.2023	
Son İş Bitim Tarihi	28.11.2026	
Yüklenici Firma	DELOŞ İnş. San. Ve Tic. A.Ş.	
Proje Tutarı	77.808.845 TL	
Kalan Proje Tutarı	72.368.588 TL	
2025 Yılı Ödeneği	5.000.000 TL	
Parasal Gerçekleşme	% 7	
Fiziki Gerçekleşme	% 7 (Tümünde % 19)	
2025 Sulama Hedefi	50 ha	
AÇIKLAMA		
✓ İş kapsamında 50 ha sulama sahası performans hedefi bulunmaktadır.		



KIRKLARELİ KOFÇAZ-2 GÖLETİ VE SULAMASI



Maksadı	Depolama Hacmi (hm³)	0,86
	Sulama (ha)	217 (69)
	İçmesuyu (hm³/yıl)	-
	Kurulu Güç (MW)	-
	Enerji Üretimi (GWh/yıl)	-
Gövde Tipi	Kil Çekirdekli Kaya Dolgu	
Temelden / Talvegden Yükseklik (m)	31,70 / 26,80	
Gövde Hacmi (m³)	0,13	
İhale Tarihi	10.01.2017	
Sözleşme Tarihi	17.03.2017	
Sözleşme Bedeli	7.025.749 TL	
İşe Başlama Tarihi	24.03.2017	
Son İş Bitim Tarihi	12.10.2024	
Yüklenici Firma	SUFEN Yapı İnşaat Tic. A.Ş.	
Proje Tutarı	130.166.052 TL	
Kalan Proje Tutarı	24.977.953 TL	
2025 Yılı Ödeneği	5.000.000 TL	
Parasal Gerçekleşme	% 81	
Fiziki Gerçekleşme	% 81	
2025 Sulama Hedefi	100 ha	
AÇIKLAMA		
✓ İş kapsamında 100 ha sulama sahası performans hedefi bulunmaktadır.		




KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ AHMETBEY GÖLETİ YÜKSELTİLMESİ



Maksadı	Depolama Hacmi (hm³)	12,52
	Sulama (ha)	270
	İçmesuyu (hm³/yıl)	5,00
	Kurulu Güç (MW)	-
	Enerji Üretimi (GWh/yıl)	-
Gövde Tipi	Homojen Dolgu	
Temelden / Talvegden Yükseklik (m)	25,50 / 23,00	
Gövde Hacmi (m³)	0,68	
İhale Tarihi	05.07.2017	
Sözleşme Tarihi	15.11.2017	
Sözleşme Bedeli	20.189.030 TL	
İşe Başlama Tarihi	25.09.2019	
Son İş Bitim Tarihi	17.12.2025	
Yüklenici Firma	AK SAV İnş.	
Proje Tutarı	358.133.208 TL	
Kalan Proje Tutarı	212.155.642 TL	
2025 Yılı Ödeneği	5.000.000 TL	
Parasal Gerçekleşme	% 41	
Fiziki Gerçekleşme	% 41	
AÇIKLAMA		
✓ Toplam 680.000 m³ gövde dolgusunun 187.000 m³ yapıldı. Dipsavak betonarme imalatı tamamlandı. Ulaşım yolları tamamlandı		



KIRKLARELİ MERKEZ ERİKLİCE GÖLETİ

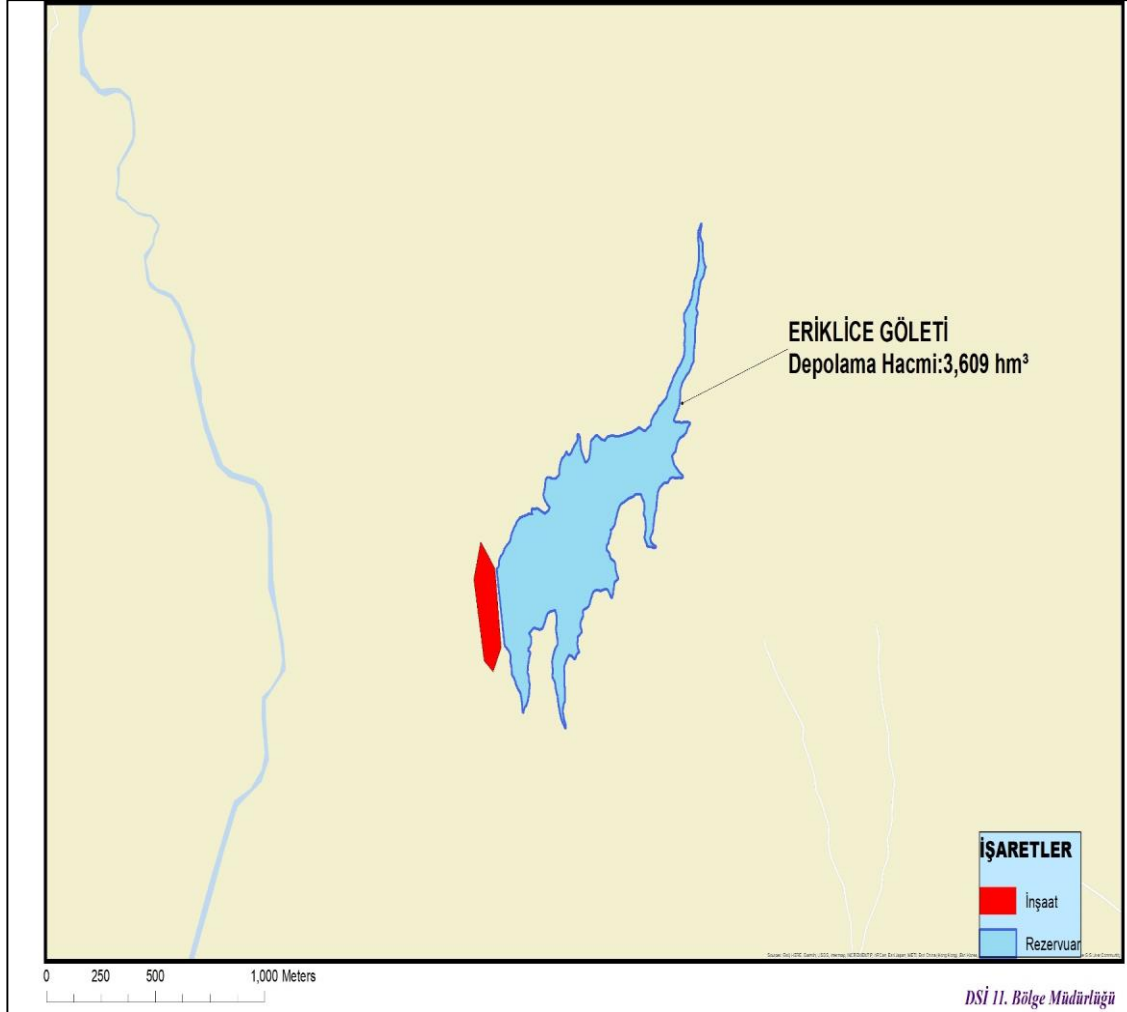


Maksadı	Depolama Hacmi (hm³)	3,61
	Sulama (ha)	897
	İçmesuyu (hm³/yıl)	-
	Kurulu Güç (MW)	-
	Enerji Üretimi (GWh/yıl)	-
Gövde Tipi	Kil Çekirdekli Kaya Dolgu	
Temelden / Talvegden Yükseklik (m)	34,60 / 31,60	
Gövde Hacmi (m³)	0,27	
İhale Tarihi	31.01.2024	
Sözleşme Tarihi	28.05.2024	
Sözleşme Bedeli	152.252.352 TL	
İşe Başlama Tarihi	30.05.2024	
Son İş Bitim Tarihi	14.04.2027	
Yüklenici Firma	DİRGÜN İnş.	
Proje Tutarı	264.827.741 TL	
Kalan Proje Tutarı	264.827.741 TL	
2025 Yılı Ödeneği	999 TL	
Parasal Gerçekleşme	% -	
Fiziki Gerçekleşme	% -	
PROJE UYGULAMA DURUMU:		
✓ Bütçe imkanları dahilinde işe başlanacaktır.		



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI


KIRKLARELİ KOFÇAZ KULA 1 GÖLETİ İLETİM HATTI

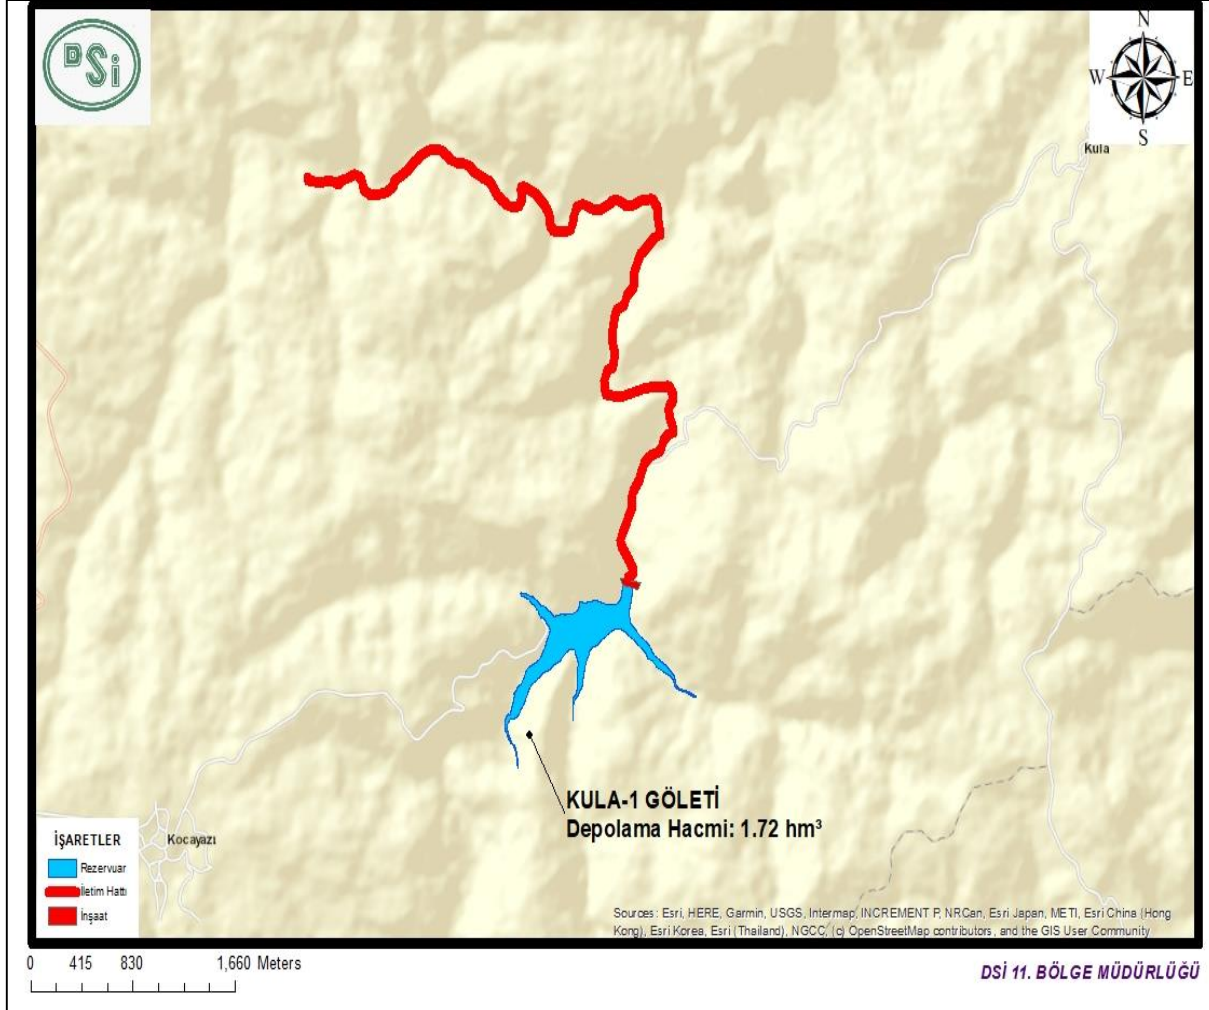

Maksadı	Depolama Hacmi (hm³)	1,72
	Sulama (ha)	204
	İçmesuyu (hm³/yıl)	18,00
	Kurulu Güç (MW)	-
	Enerji Üretimi (GWh/yıl)	-
Gövde Tipi	Kil Çekirdekli Kaya Dolgu	
Temelden / Talvegden Yükseklik (m)	25,50 / 21,00	
Gövde Hacmi (m³)	0,05	
İhale Tarihi	19.12.2023	
Sözleşme Tarihi	01.04.2024	
Sözleşme Bedeli	288 412 497 TL	
İşe Başlama Tarihi	02.04.2024	
Son İş Bitim Tarihi	10.02.2028	
Yüklenici Firma	SİSTEM Elektromekanik Tesisler San. Ve Tic. A.Ş.	
Proje Tutarı	522.401.556 TL	
Kalan Proje Tutarı	522.401.556 TL	
2025 Yılı Ödeneği	1 000 TL	
Parasal Gerçekleşme	% -	
Fiziki Gerçekleşme	% -	
PROJE UYGULAMA DURUMU:		
✓ Bütçe imkanları dahilinde işe başlanacaktır.		



KIRKLARELİ KOFÇAZ KULA 2 GÖLETİ İLETİM HATTI

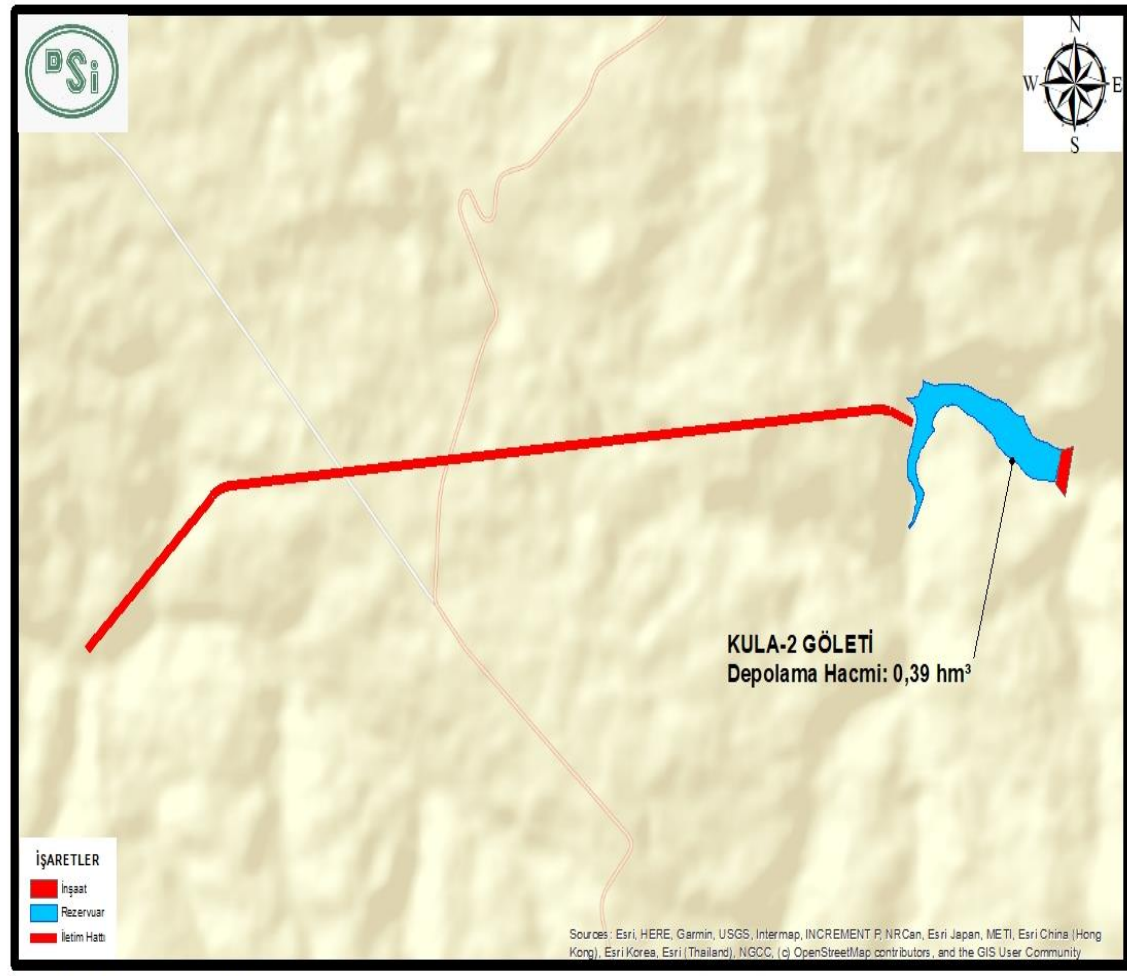


DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Maksadı	Depolama Hacmi (hm³)	0,39
	Sulama (ha)	-
	İçmesuyu (hm³/yıl)	3,64
	Kurulu Güç (MW)	-
	Enerji Üretimi (GWh/yıl)	-
Gövde Tipi	Kil Çekirdekli Kaya Dolgu	
Temelden / Talvegden Yükseklik (m)	17,50 / 14,50	
Gövde Hacmi (m³)	0,05	
İhale Tarihi	20.12.2023	
Sözleşme Tarihi	30.05.2024	
Sözleşme Bedeli	394.693.577 TL	
İşe Başlama Tarihi	05.06.2024	
Son İş Bitim Tarihi	21.08.2028	
Yüklenici Firma	ILGAZLAR + SMH Grup İş Ortaklığı	
Proje Tutarı	714.908.476 TL	
Kalan Proje Tutarı	714.908.476 TL	
2025 Yılı Ödeneği	1 000 TL	
Parasal Gerçekleşme	% -	
Fiziki Gerçekleşme	% -	
PROJE UYGULAMA DURUMU:		
✓ Bütçe imkanları dahilinde işe başlanacaktır.		



KIRKLARELİ MERKEZ ERİKLER GÖLETİ

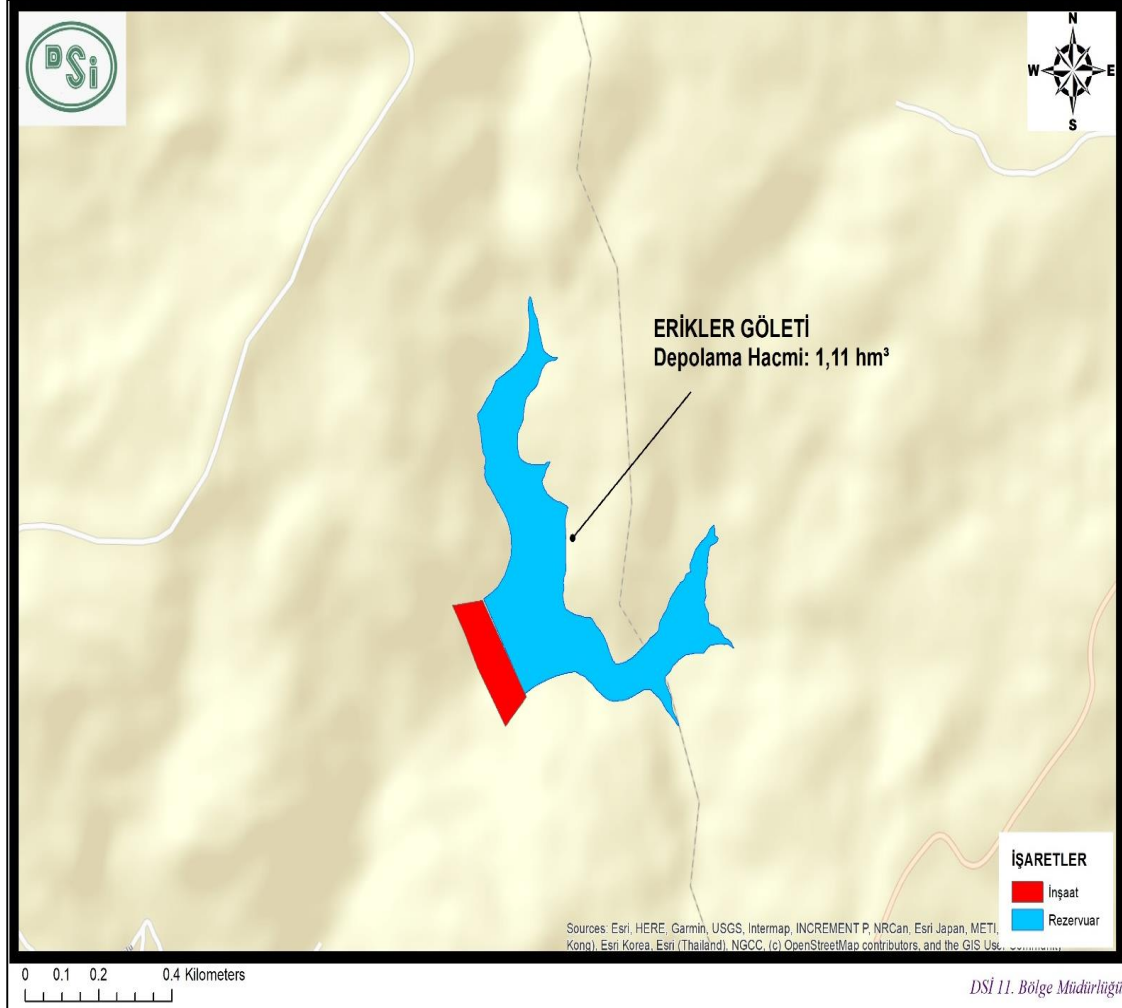

Maksadı	Depolama Hacmi (hm³)	1,11
	Sulama (ha)	228
	İçmesuyu (hm³/yıl)	-
	Kurulu Güç (MW)	-
	Enerji Üretimi (GWh/yıl)	-
Gövde Tipi	Kil Çekirdekli Kaya Dolgu	
Temelden / Talvegden Yükseklik (m)	33,35 / 29,85	
Gövde Hacmi (m³)	0,21	
İhale Tarihi	10.01.2024	
Sözleşme Tarihi	21.08.2024	
Sözleşme Bedeli	77.626.158 TL	
İşe Başlama Tarihi	22.08.2024	
Son İş Bitim Tarihi	25.02.2027	
Yüklenici Firma	KALA Yapı Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.	
Proje Tutarı	135.022.938 TL	
Kalan Proje Tutarı	135.022.938 TL	
2025 Yılı Ödeneği	999 TL	
Parasal Gerçekleşme	% -	
Fiziki Gerçekleşme	% -	
PROJE UYGULAMA DURUMU:		
✓ Bütçe imkanları dahilinde işe başlanacaktır.		



SIRA NO	2025 YILI DEVAM EDEN İŞLER	Toplam Faydası(ha,hm3, hm3/yıl vb)	2025 Yılı Revize Ödeneği (TL)	2025 Yılı Harcaması (TL)	Fiziksel Gerçekleşme (%)	Başlama- Bitiş	Son Durum
	TAŞKIN KORUMA						
1	Kırklareli Babaeski İlçe Merkezi Pekmez Deresi Islahı 1. Kısım	1 ilçe	1	-	-	2025-2026	Başlamadı
2	Kırklareli Babaeski Yenimahalle Köyü Ana Deresi Islahı	1 köy	676.358	-	96	2023-2025	03.04.2023 tarihinde yer teslimi yapıldı.İşin ikmal tarihi 13.10.2024.Sahada kazı çalışmalarına başlandı.Kazı ve dolgu işleri tamamlanmış olup pere imalatına devam edilmektedir.
3	Kırklareli Lüleburgaz İlçesi Lüleburgaz Deresi Islahı 1. Kısım	1 ilçe	41.000.000	-	19	2023-2025	İhalesi 05.06.2023 tarihinde yapıldı. Sözleşmesi imzalanarak yer teslimi işe başlama tutanakları imzalandı. İş kapsamında 2 adet köprü 2 adet taşkın galerisi 800 m çift taraflı taş istinat duvarlı kanal inşa edilecektir. 2 adet köprünün temel kazısı ve sondajları tamamlanmış olup inşaat çalışmaları devam etmektedir.
4	Kırklareli Merkez Dokuzhöyük Köyü ve Karahalil Kasabası Tarım Arazilerinin Teke Dere İkmalı	2 mahalle, 325 ha	5 000 000	-	-	2022-2025	04.08.2022 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.
5	Kırklareli Merkez Dolhan Köyiçi Deresi	1 köy	10.000.000	-	-	2024-2025	27.05.2024 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır



SIRA NO	2025 YILI DEVAM EDEN İŞLER	Toplam Faydası(ha,hm3, hm3/yıl vb)	2025 Yılı Revize Ödeneği (TL)	2025 Yılı Harcaması (TL)	Fiziksel Gerçekleşme (%)	Başlama-Bitiş	Son Durum
	TAŞKIN KORUMA						
6	Kırklareli Merkez İlçesi Bağlıca Deresi Islahı 1. Kısım	1 ilçe	1	-	-	2025-2026	Proje ihalesi devam etmektedir. Tamamlanmasına müteakip yapım işi ilana çıkılacaktır.
7	Kırklareli Pınarhisar İlçesi Çayırdere Islahı	1 ilçe	1.000.000	-	-	2023-2025	06.12.2023 tarihinde sözleşme imzalandı. Yer teslimi ve işe başlama yapıldı.
8	Kırklareli Lüleburgaz Hamitabat Köyü Yerleşim Alanı ve Tarım Alanlarının Kaynar Deresi	1 köy	1.400.000	-	-	2024-2025	İş yeri teslim ve işe başlama tutanakları 13.02.2024 tarihinde imzalandı.
9	Kırklareli Lüleburgaz Merkez Lüleburgaz Deresi 2. Kısım	1 ilçe	1	-	-	2025-2026	08.02.2024 tarihinde ihalesi yapılmıştır.(İhale iptal edildi)
10	Kırklareli Merkez Üsküp Beldesi Yabanıkavak Deresi	1 köy	1.000.000	-	-	2024-2025	04.04.2024 tarihinde yer teslimi ve işe başlama yapılmıştır.
11	Kırklareli Vize Kömürcöy Köyü Köyiçi Deresi	1 köy	1.000.000	-	-	2024-2025	04.04.2024 te yer teslimi ve işe başlama yapıldı



SIRA NO	2025 YILI DEVAM EDEN İŞLER	Toplam Faydası(ha,hm3, hm3/yıl vb)	2025 Yılı Revize Ödeneği (TL)	2025 Yılı Harcaması (TL)	Fiziksel Gerçekleşme (%)	Başlama-Bitiş	Son Durum
	TAŞKIN KORUMA						
12	Kırklareli Düğüncübaşı Köyü Arnavutluk Deresi	900 ha	1	-	-	2025-2026	Başlamadı
13	Kırklareli Merkez Değirmencik Köyü	1 köy	1	-	-	2025-2026	Başlamadı
14	Kırklareli Merkez Paşayeri Köyü	1 köy	1	-	-	2025-2026	Başlamadı
15	Kırklareli Vize Evrenli Deresi	1 mah	1	-	-	2025-2026	Başlamadı
	TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLÜ						
1	Kırklareli Pınarhisar İlçesi ve Üsküp Beldesi Yukarı Havza Islahı		-	-	-	2025-2026	Başlamadı



KIRKLARELİ İL YATIRIMLARI PLANLAMA VE PROJE ÇALIŞMALARI



SIRA NO	2025 YILI DEVAM EDEN İŞLER
	PLANLAMALAR
1	Kırklareli Demirköy Kartalkaya Göleti ve Sulaması ve Planlama Raporu
2	Kırklareli Lüleburgaz Sarıcaali Göleti ve Sulaması Yenilemesi Planlama Raporu
3	Kırklareli Pınarhisar Kurudere 2 Göleti ve Sulaması Planlama Raporu

SIRA NO	2025 YILI DEVAM EDEN İŞLER
	PROJE YAPIMI
1	Kayalıköy Sulaması Yenilemesi Proje Yapımı (F.G %60)
2	Kırklareli Pınarhisar İslambeyli Göleti ve Sulaması Proje Yapımı (F.G %40)
3	Kırklareli Vize Kışlacık Göleti ve Sulaması Proje Yapımı
4	Kırklareli Kofçaz Elmacık 1-2 Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı
5	Kırklareli Merkez Yündalan Göleti ve Sulaması Proje Yapımı
6	Kırklareli 2.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı (F.G %64)

SIRA NO	2025 YILI DEVAM EDEN İŞLER
	PROJE YAPIMI
7	Kırklareli Babaeski İlçesi Şeytandere Taşkın Kontrol Tesisi Yenilemesi Proje Yapımı
8	Kırklareli Lüleburgaz Çengelli Göleti ve Sulaması Proje Yapımı
9	Kırklareli-Merkez İlçesi Bağlıca Deresi Taşkın Kontrolü Kati Proje Yapımı (F.G %85)
10	11.Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı (F.G %100)



KIRKLARELİ İLİ BARAJ ve GÖLET DOLULUK ORANLARI

KIRKLARELİ	BARAJ veya GÖLET ADI	Maksadı	Maks. İşletme Hacmi (Hm3) (A)	Min. İşletme Hacmi (Hm3) (B)	Maks.-Min İşletme Hacim Farkı (Hm3) (C)	09.04.2024			09.04.2025		
						Mevcut Hacim (Hm3) (D)	Aktif Hacim (Hm3) (D-B)	2024 Aktif Doluluk (%) ((D-B) / (C))*100	Mevcut Hacim (Hm3) (E)	Aktif Hacim (Hm3) (E-B)	2025 Aktif Doluluk (%) ((E-B) / (C))*100
	ARMAĞAN BARAJI	S	51,842	2,200	49,642	34,283	32,083	65	27,160	24,960	50
	ÇAYIRDERE BARAJI	S	28,420	0,990	27,430	22,646	21,656	79	20,255	19,265	70
	KAYALIKÖY BARAJI	S+İ	149,856	9,766	140,090	36,090	26,324	19	15,625	5,859	4
	KIRKLARELİ BARAJI	S+İ	113,312	7,190	106,122	59,129	51,939	49	32,121	24,931	23
	TOPLAM		343,430	20,146	323,284	152,148	132,002	41	95,161	75,015	23



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ARZ EDERİM

KIRKLARELİ

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜR...

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

1.495.870

328.239

2

Proje Sayısı

49.119.651

Toplam Proje Tutarı

47.952.020

Toplam Harcama Tutarı

1.495.870

Toplam Yıl Ödeneği

328.239

Yılı Harcama Tutarı

328.239

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

0

3.Dönem Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%21,94

%0,00

%0,00

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcam...
DEMİRKÖY	0
VİZE	47.952.020
Toplam	47.952.020

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutan	Toplam Harcama Yüzdesi
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	47.952.020	100,00%
Toplam	47.952.020	100,00%

Bakanlık Adı	Toplam Harcama T...
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKA...	47.952.020
Toplam	47.952.020

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırmacı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar
VİZE KIYIKÖY KANALİZASYONU PAKET ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI	İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	909.730	48.533.511	
DEMİRKÖY İÇNEADA KANALİZASYONU KESİN PROJE YAPIMI	İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	586.140	586.140	
Toplam			1.495.870	49.119.651	

İller Bankası A.Ş.
İstanbul Bölge Müdürlüğü
Kırklareli İli Yatırımları
Nisan 2025

İller Bankası A.Ş. İstanbul Bölge Müdürlüğü

Sıra no	Sektörü	Proje no	Proje adı ve karakteristiği	Bütçe Türü	Projenin yeri (İlçe)	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2025 yılı ödeneği (TL)	2025 yılında gönderilen ödenek (TL)	2025 yılı harcamaları (TL)	Nakdi gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Proje durumu	Açıklamalar
---------	---------	----------	-----------------------------	------------	----------------------	----------------	--------------	-------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------	--------------	-------------

			Toplam					49.119.651	47.623.781	1.495.870	0	328.239	22			
			Altyapı					49.119.651	47.623.781	1.495.870	0	328.239	22			
			Kanalizasyon					49.119.651	47.623.781	1.495.870	0	328.239				
1	DKH Sosyal		Kıyıköy Paket Atıksu Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı	İB	Vize	2022	2024	48.533.511	47.623.781	909.730		328.239	36	100	BT	İş tamamlandı. Tesis işletme aşamasında.
2	DKH Sosyal		İğneada Kanalizasyon Kesin Projesi	İB	Demirköy	2024	2025	586.140	0	586.140		0	0	0	DE	Devam ediyor.

KIRKLARELİ 2025 YILI YATIRIM BİLGİLERİ

PROJE SAYISI	2
TOPLAM PROJE TUTARI	49.119.651 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMA TUTARI	47.623.781 TL
2025 YILI HARCAMA TUTARI	328.239 TL
DEVAM EDEN İŞ SAYISI	1
TAMAMLANAN İŞ SAYISI	1

KIRKLARELİ 2025 YILI YATIRIMLARI

Kıyıköy Paket Atıksu Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı

- Başlama-Bitiş Tarihi : 2022-2024
- Proje Tutarı : 48.533.511 TL
- Yapılan Toplam Harcama : 47.952.020 TL
- Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi: % 100
- Projenin Durumu : İş tamamlandı



KIRKLARELİ 2025 YILI YATIRIMLARI



Kırıkköy Paket Atıksu Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı

Arz Ederim.

Bahri TRKŐEN
Blge Mdr

KIRKLARELİ

1
Proje Sayısı1.026.955
Toplam Proje Tutarı586.955
Toplam Harcama Tutarı440.000
Toplam Yıl Ödeneği0
Yılı Harcama Tutarı

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İ. BÖ...

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

440.000
00
1.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

0
2.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

0
3.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

0
4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcam...
DEMİRKÖY	586.955
Toplam	586.955


Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutan	Toplam Harcama Yüzdesi
Tarım	586.955	100,00%
Toplam	586.955	100,00%

Bakanlık Adı	Toplam Harcama T...
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI	586.955
Toplam	586.955

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı
D.KÖY İĞNEADA BALIKÇI BARINAĞI ETÜD PROJE İŞLERİ	ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İ. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	440.000	1.026.955
Toplam			440.000	1.026.955

Demirköy İğneada Balıkçı Barınağı Etüt Proje İşleri

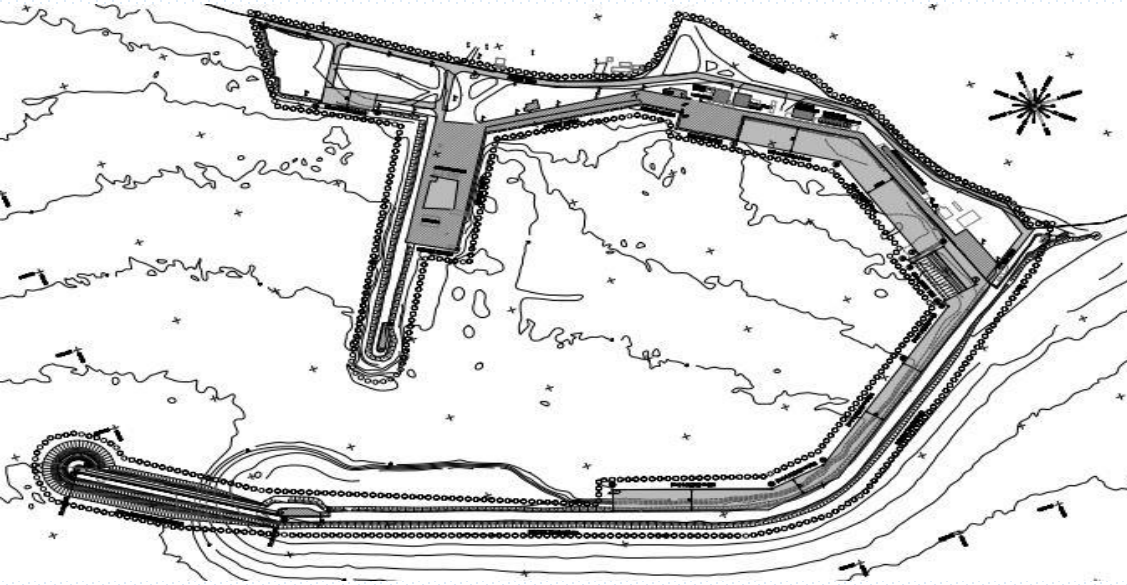

665 metre ilave rıhtım (yanaşma yeri) yapılması ve kumlanma problemini önlemek amacıyla ana mendireğin 200 metre uzatılması amacıyla etüd proje çalışması yapılmaktadır.

Sondaj çalışmaları tamamlanmıştır. Uygulamaya ve İmar planına esas Jeolojik Jeoteknik rapor onaylanarak hakediş hazırlanmıştır. Kesin projeler Bölge Müdürlüğümüzce incelenerek onay için AYGM'ye gönderilmiştir.

KIRKLARELİ

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

58.562.000

2.769.000

7

Proje Sayısı

58.562.002

Toplam Proje Tutarı

2.769.000

Toplam Harcama Tutarı

58.562.000

Toplam Yıl Ödeneği

2.769.000

Yılı Harcama Tutarı

2.769.000

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

0

3.Dönem Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%4,73

%0,00

%0,00

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcam...
KOÇAZ	0
MERKEZ	2.665.000
MUHTELİF İLÇE	104.000
Toplam	2.769.000

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı	Toplam Harcama Yüzdesi
Tarım	2.769.000	100,00%
Toplam	2.769.000	100,00%

Bakanlık Adı	Toplam Harcama T...
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI	2.769.000
Toplam	2.769.000

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar
ORMAN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ	İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	5.727.000	5.727.000	
FİDAN ÜRETİMİ	İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	26.235.000	26.235.000	
ORMANCILIK ALTYAPISI VE ÜRETİM MAKİNASI ALIM	İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	17.100.000	17.100.000	
EROZYONLA MÜCADELE VE TOPRAK MUHAFAZA	İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1.200.000	1.200.000	
İDARİ BİNALARIN İŞLETİLMESİ	İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	0	1	
ORMAN AMENAJMANI VE ORMAN KÖYLERİ ETÜDÜ	İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	8.300.000	8.300.000	
ORMAN KADASTRO VE TESCİLİ	İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	0	1	
Toplam			58.562.000	58.562.002	



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKLARELİ İLİ
İL KOORDİNASYON TOPLANTISI



16/04/ 2025




Genel Tanıtım



3 Orman İşletme
Müdürlüğü
1 Orman Fidanlık
Müdürlüğü
35 Orman İşletme Şefliği
1 KDM Şefliği
1 ATM Şefliği
2 Fidanlık Şefliği



Ormanlık Alan

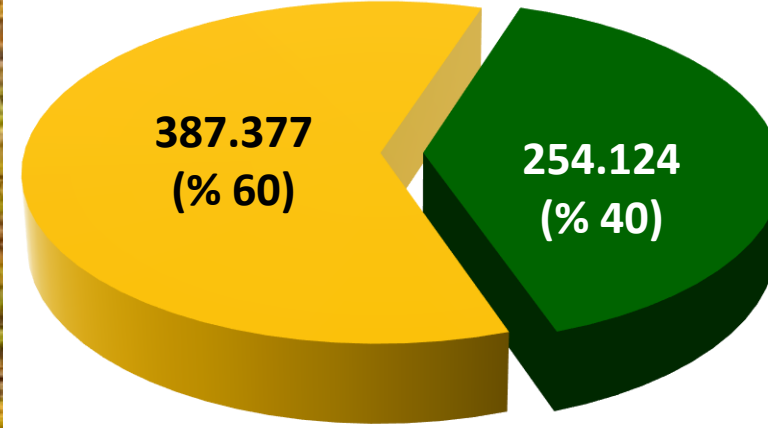

Ormanlık Alan : 254.124 Hektar

Ormansız Alan : 387.377 Hektar

Genel Toplam : 641.501 Hektar



Yatırım Projeleri



Proje Adı ve Karakteristiği	Bütçe Türü	Projenin Yeri (İlçe)	Proje Tutarı (TL)	2025 Yılı Harcama (TL)	Nakdi Gerç. (%)	Fiziki Gerç. (%)	Proje Durumu
Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi Projesi	Ö.B.	Lüleburgaz, Merkez, Kofcaz, Pınarhisar	5.727.000	500.000	9	20	Devam Ediyor
Erozyonla Mücadele ve Toprak Muhafaza Projesi	Ö.B.	Kofcaz	1.200.000	-	-	-	Başlanmadı
Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı Projesi	Ö.B.	Demirköy Vize	7.200.000	-	-	-	İhale Aşamasında
Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı Projesi	D.S.	Merkez Demirköy Vize	9.900.000	104.000	1	3	Devam Ediyor
Orman Amenajmanı ve Orman Köyleri Etüdü Projesi	D.S.	Merkez Demirköy	8.300.000	-	-	-	İhale Aşamasında
Fidan Üretim Projesi	D.S.	Lüleburgaz	26.235.000	2.165.000	8	20	Devam Ediyor
TOPLAM			58.562.000	2.769.000	5	10	



Ormanların Geliştirilmesi ve Geniřletilmesi Projesi



FAALİYET TÜRÜ	PROGRAM MİKTAR	ÖDENEK (TL)	İLÇESİ	GERÇEKLEŐME MİKTAR	HARCAMA (TL)
Ağaçlandırma Tesis	48 Ha.	3.427.000	Kofcaz- Lüleburgaz- Merkez- Pınarhisar	36 Ha.	-
Ağaçlandırma Bakımı	250 Ha.	2.250.000	Kofcaz- Lüleburgaz- Merkez- Pınarhisar	25 Ha.	500.000
Etüd Proje	100 Ha.	50.000	Kofcaz- Lüleburgaz- Merkez- Pınarhisar	-	-
PROJE TOPLAMI	398 Ha.	5.727.000		61 Ha.	500.000




Ormanların Geliştirilmesi ve Geniřletilmesi Projesi





Erozyonla Mücadele ve Toprak Muhafaza Projesi

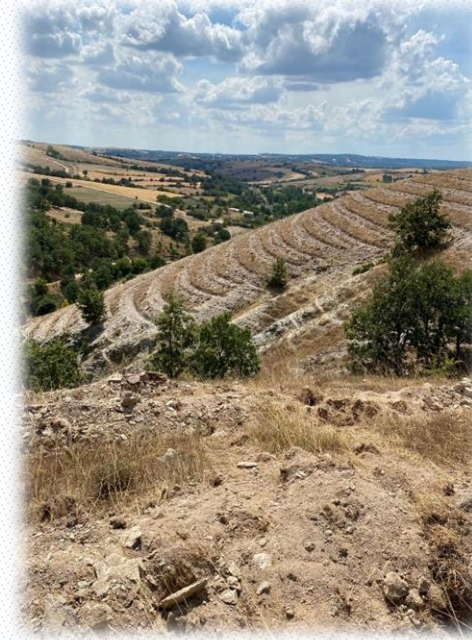

FAALİYET TÜRÜ	PROGRAM MİKTAR	ÖDENEK (TL)	İLÇESİ	GERÇEKLEŞME MİKTAR	HARCAMA (TL)
Toprak Muhafaza Tesis (Erz.Kont)	50 Ha.	1.000.000	Kofçaz	-	-
Toprak Muhafaza Bakım (Erz.Kont)	50 Ha.	200.000	Kofçaz	-	-
PROJE TOPLAMI	100 Ha.	1.200.000		-	-



Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı Projesi



(ÖZEL BÜTÇE)

FAALİYET TÜRÜ	PROGRAM MİKTAR	ÖDENEK (TL)	İLÇESİ	GERÇEKLEŞME MİKTAR	HARCAMA (TL)
Sanat Yapısı	18 Km.	1.090.000	Demirköy, Vize	-	İhale Aşamasında

(DÖNER SERMAYE)

FAALİYET TÜRÜ	PROGRAM MİKTAR	ÖDENEK (TL)	İLÇESİ	GERÇEKLEŞME MİKTAR	HARCAMA (TL)
Orman Yolu Yapımı (Yeni Yol)	9 Km.	4.500.000	Merkez, Demirköy	-	-
Stabilize Yol Kaplaması (Üst Yapı)	14 Km.	4.200.000	Demirköy, Vize	1 Km.	104.000
Orman Yolu B.Onarım	3 Km.	1.200.000	Vize	-	-
PROJE TOPLAMI	26 Km.	9.900.000		1 Km.	104.000



Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı Projesi



Yeni Yol



Büyük Onarım



Sanat Yapısı



Üst Yapı



Orman Amenajmanı ve Orman Köyleri Etüdü Projesi



FAALİYET TÜRÜ	PROGRAM MİKTAR	ÖDENEK (TL)	İLÇESİ	GERÇEKLEŞME MİKTAR	HARCAMA (TL)
Orman Amenajmanı Yapımı	179.890 Ha.	8.300.000	Merkez, Demirköy	-	İhale Aşamasında



Fidan Üretim Projesi



FAALİYET TÜRÜ	PROGRAM MİKTAR	ÖDENEK (TL)	İLÇESİ	GERÇEKLEŞME MİKTAR	HARCAMA (TL)
Fidan Üretimi	1.200.000 Ad.	17.500.000	Lüleburgaz	600.000 Ad.	2.000.000
Fidan Bakımı	1.800.000 Ad.	7.500.000	Lüleburgaz	200.000 Ad.	165.000
Tohum Üretimi	2 Ton	1.200.000	Lüleburgaz	-	-
Ağaç ve Tohum Islahı Bakımı	5 Ha.	35.000	Lüleburgaz	-	-
PROJE TOPLAMI		26.235.000			2.165.000



Fidan Üretim Projesi





İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Arz ederim

Zafer DERİNCE

İstanbul Orman Bölge Müdürü

2025

KIRKLARELİ

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1. BÖLGE ...

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

0 1.200.000

1
Proje Sayısı1.200.000
Toplam Proje Tutarı0
Toplam Harcama Tutarı1.200.000
Toplam Yıl Ödeneği0
Yılı Harcama Tutarı0
1.Dönem Harcama Tutarı0
2.Dönem Harcama Tutarı0
3.Dönem Harcama Tutarı0
4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%0,00

%0,00

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcam...
MUHTELİF İLÇE	0
Toplam	0

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı	Toplam Harcama Yüzdesi
Turizm	0	
Toplam	0	

Bakanlık Adı	Toplam Harcama T...
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI	0
Toplam	0

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırım Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı
MUHTELİF ETÜDLER	TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1.200.000	1.200.000
Toplam			1.200.000	1.200.000



Muhtelif Etütler

Başlama ve bitiş tarihi: 2025 – 2025

Proje tutarı: 1.200.000

KIRKLARELİ

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

199.130.762

6.462.652.803

2

Proje Sayısı

19.821.563.890

Toplam Proje Tutarı

13.556.258.680

Toplam Harcama Tutarı

6.462.652.803

Toplam Yıl Ödeneği

199.130.762

Yılı Harcama Tutarı

199.130.762

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

0

3.Dönem Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%3,08

%0,00

%0,00

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcam...
LÜLEBURGAZ	38.890.310
MUHTELİF İLÇE	13.517.368.370
Toplam	13.556.258.680

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı	Toplam Harcama Yüzdesi
Ulaştırma - Haberleşme	13.556.258.680	100,00%
Toplam	13.556.258.680	100,00%

Bakanlık Adı	Toplam Harcama T...
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI	13.556.258.680
Toplam	13.556.258.680

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcama
DEMİRYOLU BAKIM ONARIMI	TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	42.320.003	77.756.090	33.652.91
HALKALI-KAPIKULE YÜKSEK STANDARTLI DEMİRYOLU İNŞAATI (60/230 ...	TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	6.420.332.800	19.743.807.800	13.323.475.01
Toplam			6.462.652.803	19.821.563.890	13.357.127.91



KIRKLARELİ İLİ 2025 YILI NİSAN DÖNEMİ YATIRIM SUNUMU

Proje sayısı	14	Programa alınan ancak ihale dosyası hazırlanmayan	2
Proje tutarı	17.173.679.653	İhale dosyası hazırlama sürecinde olan	1
Önceki yıllar harcaması	10.710.738.680	İhale aşamasında olan	0
2025 ödeneği	6.462.652.800	Devam eden	11
2025 harcaması	199.130.762	Geçici kabul aşamasında olan	0
Nakdi gerçekleşme	Yüzde 64	Tasfiye / iptal olan	0
Fiziki gerçekleşme	Yüzde 65	Biten	0

TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İLİ YATIRIMLARI

Sıra no	Proje adı ve karakteristiği	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	2025 Yılında Gönderilen Ödenek (TL)	2025 Yılı Harcamaları (TL)	Nakdi gerçekleştirme (%)	Fiziki gerçekleştirme (%)	Durum	AÇIKLAMA
1	Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesiminin Altyapı, Üstyapı, Elektrik, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon İşlerinin Yapılması (Km:75+900-228+807)	2019	2025	17.097.418.561,87	10.677.085.761,87	6.420.332.800,00	193.893.369,93	107%	87%	Devam ediyor	Çalışmalar devam etmektedir.
2	1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALPULLU ERİŞİLEBİLİRLİK PROJELERİ YAPTIRILMASI 1.ETAP İŞİ	2018	2024	53.900,00	13.900,00	40.000,00	0,00	26%	60%	Devam ediyor.	Projeler onaydadır
3	1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ LÜLEBURGAZ ERİŞİLEBİLİRLİK PROJELERİ YAPTIRILMASI 1.ETAP İŞİ	2018	2024	27.900,00	7.900,00	20.000,00	0,00	28%	60%	Devam ediyor.	Projeler onaydadır

TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İLİ YATIRIMLARI

Sıra no	Proje adı ve karakteristiği	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	2025 Yılında Gönderilen Ödenek (TL)	2025 Yılı Harcamaları (TL)	Nakdi gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Durum	AÇIKLAMA
4	1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PEHLİVANKÖY ERİŞİLEBİLİRLİK PROJELERİ YAPTIRILMASI 1.ETAP İŞİ	2018	2024	54.327,74	14.327,74	40.000,00	0,00	26%	80%	Devam ediyor.	Projeler onaydadır
5	Lüleburgaz İstasyon Sahasında Bulunan Muhtelif Binaların Restorasyonunun Yapılması İşi	2022	2026	1,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Başlanmadı.	İhalesi iptal edilmiş olup 2025 yılında ihaleye çıkılması planlanmaktadır.
6	1. Bölge İstasyonlarının 2. Etap Saha Aydınlatmalarının Yapılması İşi	2024	2025	5.580.495,45	4.730.495,45	850.000,00	580.085,59	95%	95%	Devam ediyor.	Çalışmalar devam etmektedir.

TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İLİ YATIRIMLARI

Sıra no	Proje adı ve karakteristiği	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	2025 Yılında Gönderilen Ödenek (TL)	2025 Yılı Harcamaları (TL)	Nakdi gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Durum	AÇIKLAMA
7	1. Bölge Mintıkasındaki Elektrik Sayaçlarına Uzaktan İzleme Sistemi Kurulması İşi	2023	2024	1.378.032,90	328.032,90	1.050.000,00	267.329,40	43%	75%	Devam ediyor.	Çalışmalar devam etmektedir.
8	Alpullu İstasyon Sahasında Bulunan Binaların Tadilatı	2024	2025	47.750.771,46	22.750.771,46	25.000.000,00	4.389.976,88	57%	70%	Devam ediyor.	Çalışmalar devam etmektedir.
9	1.Bölge Müdürlüğü Mintıkasında Bulunan Gar, İstasyon Ve Binalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Kontrollük Ve Müşavirlik Hizmet Alım İşi	2025	2028	1,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Başlanmadı.	Ödenek tefrik edilmiş olup ihale hazırlıklarına başlanacaktır.

TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İLİ YATIRIMLARI

Sıra no	Proje adı ve karakteristiği	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	2025 Yılında Gönderilen Ödenek (TL)	2025 Yılı Harcamaları (TL)	Nakdi gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Durum	AÇIKLAMA
10	Halkalı Lokomotif Bakım Atölyesi, Bilecik Vagon Muayene İkmal Şefliği Ve Alpullu Araç Bakım Şefliğine Oksijen Ve Asetilen Tüpleri İçin Patlamaya Dayanıklı Kapalı Alan Yapılması	2025	2026	1,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	Başlanmadı.	Ödenek tefrik edilmiş olup ihale hazırlıklarına başlanacaktır.
11	TCDD 1.Bölge Müdürlüğü mıntıkasının tamamındaki mevcut demiryolu güzergâhında (Sirkeci-Uzunköprü / Pehlivan köy-Kapıkule / Kırklareli- Mandıra / Muratlı-Tekirdağ / Haydarpaşa-Ankara Hat kesimleri) altyapı iyileştirmesine yönelik Etüd, Proje, Mühendislik ve Hizmet Alımı İşi	31.05.2021 (1.protokol) 23.06.2022 (2.protokol)	03.09.2023 (1.protokol) 08.07.2024 (2.protokol)	4.430.725,00	3.302.925,00	500.000,00	0,00	75%	75%	Devam Ediyor.	1. Öncelikli Hat için; Harita,Hidrolik,hidrolojik işleri bitti, Sondaj işleri bitti , Laboratuvar Deney işleri bitti. Jeoloji-jeoteknik,geoteknik rapor kısmı onay aşamasındadır. 2. öncelikli hat için; Sondaj işleri tamamlandı.Labarotuar ve deney çalışmaları tamamlandı.Tüm harita işleri tamamlandı.Hidroloji işleri tamamlandı.Hidrolik hesaplama çalışmaları devam etmektedir.Jeoloji-jeoteknik,geoteknik rapor kısmı hazırlık aşamasındadır.
12	1.Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında 520 km yolun koruyucu taşlanması	2024	2025	6.505.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0%	0%	Devam Ediyor.	27.12.2024 tarihinde protokol imzalanmış olup çalışmalar devam etmektedir.

TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İLİ YATIRIMLARI

Sıra no	Proje adı ve karakteristiği	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	2025 Yılında Gönderilen Ödenek (TL)	2025 Yılı Harcamaları (TL)	Nakdi gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Durum	AÇIKLAMA
13	1. Bölge Müdürlüğü sinyalizasyon sistemi istasyon içi yol sinyallerinin Led tipi sinyale dönüştürülmesi	-	-	8.475.793,20	1.320.423,45	6.000.000,00	0,00	15%	15%	Devam Ediyor.	Demiryolu Bakım Dairesi Sinyalizasyon Şubesi tarafından takip edilmektedir.
14	65 Adet Hemzemin Geçitte Kamera Sistemi Kurulması İşi	2024	2025	2.004.142,00	1.184.142,00	820.000,00	0,00	59%	59%	Devam Ediyor.	27.12.2023 tarihinde ihalesi yapılmış olup 01.03.2024 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.18.03.2024 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.Çalışmalar devam etmektedir.

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ

Projenin Planlanan Bitiş Tarihi	: 30.08.2025
Toplam Güzergah Uzunluğu	: 229 km
Proje Bedeli (revise)	: 616,7 Milyon Avro

Ülkemiz, Asya-Avrupa arasında taşımacılık yönünden bir köprü konumundadır. Halkalı-Kapıkule demiryolu projesi, Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturmaktadır. Bu projenin tamamlanması ile birlikte İpek Demiryolu güzergâhının Ülkemizden geçen bölümünü Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil etmektedir.

229 km güzergâhta 200 km/s hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa edilecektir.

229 km uzunluğundaki projenin yaklaşık 55 km’si Edirne, yaklaşık 60 km’si Kırklareli, 39 km Tekirdağ il sınırları içerisinde kalmaktadır. Tekirdağ’da Çerkezköy Yolcu ve Çerkezköy Yük İstasyonu olmak üzere 2 istasyon olacaktır. Kırklareli’nde Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran olmak üzere 3 istasyon, Edirne ilimizde ise Edirne ve Kapıkule’de 2 istasyon olacaktır.

Hızlı tren projesi ile eş zamanlı olarak Kırklareli-Babaeski arasındaki 35 km’lik mevcut demiryolu hattının da yenilenmesi yapılarak Kırklareli il merkezinin hızlı tren ile bağlantısı planlanmaktadır.

Projenin tamamlanmasıyla;

- Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya; yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşmesi,
- Mevcut durumda yıllık 1,53 milyon ton yük taşınmakta olup yıllık 9,6 milyon yük taşınması,
- Mevcut durumda yıllık ortalama 600 bin yolcudan yıllık 3,4 milyona çıkması,
- Mevcut hat kapasitesinin 42 trenden 200 tren üzerine çıkması hedeflenmektedir.

Proje iki kesimden oluşmaktadır.

Çerkezköy-Kapıkule(153 km);

İşin sözleşmesi 30.04.2019 tarihinde Webuild & Kolin Adi Ortaklığı tarafından imzalanmış ve 09.07.2019 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. İşin %87.49 tamamlanmıştır. Proje bedeli 616.719.176 Euro olan işin süresi 2271 gün olup iş bitiş tarihi 30.08.2025 ‘tür.

Halkalı-Ispartakule(8 km)/Ispartakule-Çerkezköy(68 km);


Proje Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, Altyapı Genel Müdürlüğüne yürütülmekte olup dış finansman temini yapılmış, 2023 yılında ihalesi yapıldı ve sahada inşaat çalışmalarına başlandı.

Projenin 2026 tarihinde bitmesi öngörülmektedir.

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ

TOPLAM PROJE BEDELİ (REVİZE) = 616,7 Milyon Avro

KIRKLARELİ	1. Babaeski	1. Ağayeri 2. Çavuşköy	3. Çengerli 4. Çiğdemli	5. Dügüncülü 6. Eriklyurdu	
	2. Lüleburgaz	1. Akçaköy 2. Alacaoğlu 3. Ayvalı	5. Çengelli 6. Çeşmekolu 7. Ceylanköy	9. Yıldırım Beyazıt 10. Gazi M. Kemal Paşa 11. Celaliye	

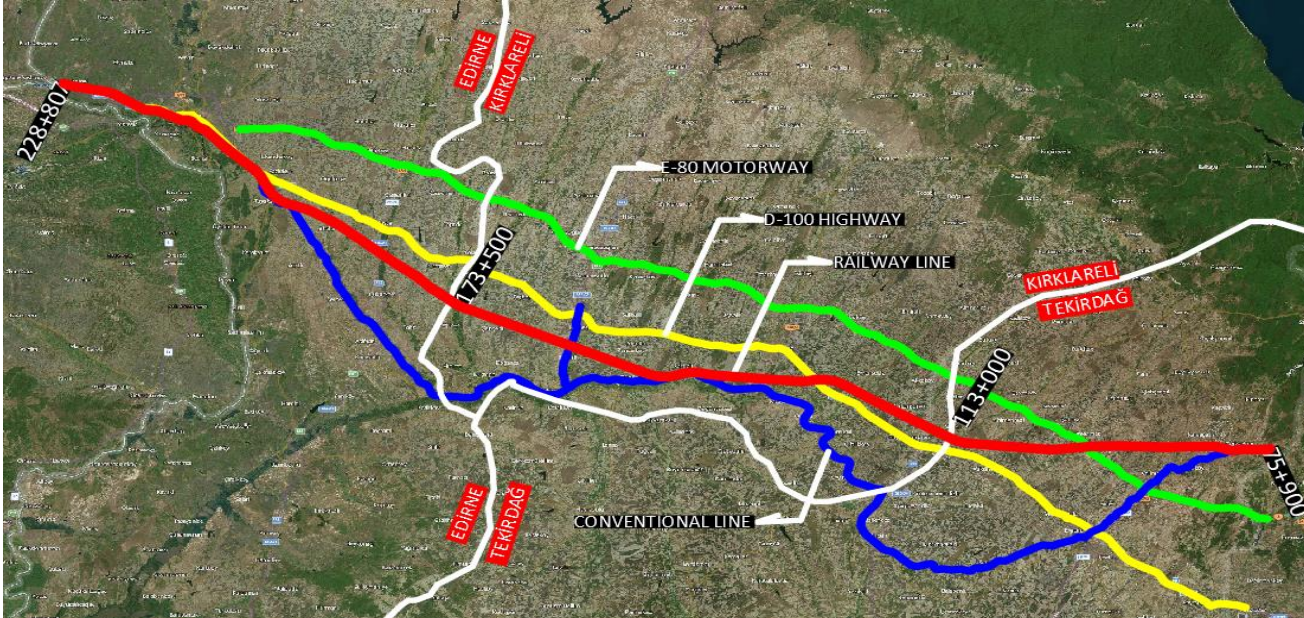

Toplam Hat Uzunluğu: 60 km

Tüm Hattın %40'ü

Ana Arter Geçişleri:

- 1 adet D565 Karayolu
- 1 adet D100 Karayolu
- 1 adet E80 Otoyolu

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ

	KIRKLARELİ (Adet)	KIRKLARELİ BİTEN (Adet)	PROJE TOPLAM (Adet)
MENFEZ	75	75	175
AÇ-KAPA TÜNEL	1	1	8
KARAYOLU ALTGEÇİT	29	29	52
KARAYOLU ÜSTGEÇİT	19	19	59
DEMİRYOLU KÖPRÜ	12	12	31
VİYADÜK	-	-	2

Yapılarının %100'ü BİTTİ

Toplam Sanat Yapılarının
%36'sı

NAKDİ İLERLEME : %107

FİZİKİ İLERLEME : %87

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ



Railway Bridge – Km: 114+612

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ



HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ



Railway Bridge Km: 117+535

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ



HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ



134+244 - 134+930 Railway Underpass

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ



HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ



Babaeski Station

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ





TCDD
1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARZ EDERİM

ALİ BAŞPINAR
BÖLGE MÜDÜR YRD.

KIRKLARELİ

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

MADEN TETKİK VE ARAMA MARMARA B...

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

1.105.548

14.963.333

1

Proje Sayısı

14.963.333

Toplam Proje Tutarı

1.105.548

Toplam Harcama Tutarı

14.963.333

Toplam Yıl Ödeneği

1.105.548

Yılı Harcama Tutarı

1.105.548

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

0

3.Dönem Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%7,39

%0,00

%0,00

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcam...
MUHTELİF İLÇE	1.105.548
Toplam	1.105.548

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı	Toplam Harcama Yüzdesi
Enerji	1.105.548	100,00%
Toplam	1.105.548	100,00%

Bakanlık Adı	Toplam Harcama T...
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI	1.105.548
Toplam	1.105.548

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı
TRAKYA YÖRESİ İNTRÜZİFLERLE İLİŞKİLİ POLİMETAL MADEN ARAMALARI	MADEN TETKİK VE ARAMA MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	14.963.333	14.963.333
Toplam			14.963.333	14.963.333





T.C.
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



KIRKLARELİ İLİ SUNUMU
NİSAN-2025



T.C.
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



“Memleketin henüz meçhul bulunan diğer servetlerinin Jeolojik bakımdan birer birer tetkik vazifesini Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne verdik. Çalışacaklardır. Mesut sürprizler temenni ederiz.



T.C.
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



MİSYONUMUZ

“Yerbilimleri ve madencilik alanında arama, araştırma, analiz ve altyapı çalışmalarını yürüterek üretilen bilgiyi toplumun hizmetine sunmak, ülke refahına katkıda bulunmak”



VİZYONUMUZ

“Yer kabuğunu tanıyarak, tanımlayarak, tanıtarak geleceğimize bilgi ve değer üretmek”



KURULUŐ



MTA Genel M¼d¼rl¼ę¼ 1935 yılında 2804 sayılı kanunla kurulmuş, özel hukuk hük¼mlerine tabi, tüzel kişilięi olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıęına baęlıdır. 2006 yılından itibaren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda (II) sayılı Cetvelde «Özel Bütçeli İdareler» Bölümünde yer almış olup hesap ve işlemleri Sayıştay Denetimine tabi bulunmaktadır.

MTA Marmara Bölge M¼d¼rl¼ę¼ 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi ile 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin yörede oluşturduęu yüksek can kaybı ve ağır hasar dikkate alınarak, Bakanlar Kurulu'nun 14.01.2000 Tarih ve 2000/8 Sayılı Kararnamesi ile kurulmuş olup Kocaeli, Tekirdaę, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Sakarya, Düzce, Yalova, Çanakkale (Trakya kesimi) ve Bolu illerini kapsayan bir bölgede faaliyetlerini sürdürmektedir.



T.C.
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Toplam 10 ili kapsayan, 44.902 km² lik geniş bir bölgede faaliyet göstermektedir.



KIRKLARELİ İLİ YATIRIM BİLGİLERİ



1- Batı Anadolu Metalik Maden Aramaları

Sıra no	Proje adı ve karakteristiği	Projenin Yeri	Başlama Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	2025 yılı ödeneği (TL)	2025 yılında gönderilen ödenek (TL)	2025 yılı harcamaları (TL)	Nakdi ger. (%)	Fiziki ger. (%)	Açıklamalar
	Toplam			420.629.000	14.963.333	14.963.333	1.105.548	7	-	
1	Batı Anadolu Metalik Maden Aramaları	Kırklareli ve diğer iller	2025	420.629.000	14.963.333	14.963.333	1.105.548	7	-	Proje kapsamında çalışmalar Kırklareli ilinden yürütülmektedir. 2025 yılı iş programında yer alan sondaj faaliyetlerine henüz başlanmamış olup 2024 yılı sondajlarına ait karot yarılama işlemleri yapılmaktadır.



ARAZİ ÇALIŞMALARI



1- Batı Anadolu Metalik Maden Aramaları

Projenin Amacı:

Istranca Masifi i erisinde proje  retilmemi  veya prospeksiyon a amasında bırakılmı  polimetal cevherle melerine y nelik sahalar ile ruhsat problemleri nedeniyle uzun zamandır  alı ılamayan sahalardan ruhsatı alınanlarda, g n m z bilim ve teknoloji imkanlarıyla de erlendirmeler yaparak, eksik kalan  alı maları tamamlamak, yeni rezervler ortaya koymak, g m l  yatakları aramaya y nelik modeller geli tirmek ve ruhsatı kurumumuzda bulunan veya gelecekte alınacak olan sahalanın, polimetal cevherle meleri bakımından potansiyellerini ortaya koymak projenin temel amacını olu turmaktadır.

Ger ekle me : 2025 yılı i  programında yer alan sondaj faaliyetlerine hen z ba lanmamı tır.



ARAZİ ÇALIŞMALARI





T.C.
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



ARZ EDERİM.

Afşın EKMEKYAPAR
Bölge Müdürü

KIRKLARELİ

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

EDİRNE VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

3.438.717

0

2

Proje Sayısı

33.222.767

Toplam Proje Tutarı

1.917.957

Toplam Harcama Tutarı

3.438.717

Toplam Yıl Ödeneği

0

Yılı Harcama Tutarı

0

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

0

3.Dönem Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%0,00

%0,00

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcam...
LÜLEBURGAZ	1.917.957
PEHLİVANKÖY	0
Toplam	1.917.957

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı	Toplam Harcama Yüzdesi
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	1.917.957	100,00%
Eğitim	0	0,00%
Toplam	1.917.957	100,00%

Bakanlık Adı	Toplam Harcama T...
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI	1.917.957
Toplam	1.917.957

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar T...
LBURGAZ SOKULLU MEHMETPAŞA KÜLLİYESİ KURŞUN DÖKÜMÜ VE G...	EDİRNE VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	538.717	4.222.767	
PEHLİVANKÖY MERKEZ CAMİ RESTORASYONU	EDİRNE VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	2.900.000	29.000.000	
Toplam			3.438.717	33.222.767	



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü



T.C.
VAKIFLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



1.KURULUŞUN ADI : Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü

2.YATIRIM İZLEME DÖNEMİ : 2025-1. Dönem

3.TOPLAM PROJE SAYISI : 4

Kültür Sektörü : 4

Turizm Sektörü : 0

1.TOPLAM PROJE BEDELİ (TL) : 40.539.320

2.TOPLAM ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI(TL) : 1.000.663

3.TOPLAM YILI ÖDENEĞİ (TL) : 538.717

4.TOPLAM YILI HARCAMASI (TL) : 0

5.YILI NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI (%): -

6.PROJELERİN DURUMU :

Başlanamayan Proje Sayısı : 3

Bitmeden Tasfiye Edilen P. Sayısı : -

Biten Proje Sayısı : -

Devam Eden Proje Sayısı : 1


2025 YILI FAALİYETLERİMİZ



BABAESKİ CEDİT ALİ PAŞA CAMİİ

2025 YILINDA DEVAM EDEN BASİT ONARIM İŞİ


- Kırklareli Lüleburgaz Sokullu Külliyesi Tuvaletleri Basit Onarım İşİ



2025 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN İŞLER

- 1- Kırklareli Merkez Karakaş Mh 68 Ada 107 Parselde bulunan arsaya bina yapım işi
- 2- Kırklareli Merkez Karakaş Mahallesi 25 Ada 47 Parselde bulunan arsaya bina yapım işi
- 3- Kırklareli Merkez Karakaş Mahallesi 25 Ada 51 Parselde bulunan arsaya bina yapım işi

2025 YILINDA DEVAM EDEN BASİT ONARIM İŞİ



KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ SOKULLU MEHMETPAŞA KÜLLİYESİ TUVALETLERİ




Önceki Durum



Halihazır Durumu



HAYIR HİZMETLERİ

- 1- Kuru Gıda Yardımı**
 - 2- Muhtaç Aylığı**
 - 3- Burs**
 - 4- Yurt Dışı Kuru Gıda Yardımları**
- 

KURU GIDA YARDIMLARI

Kırklareli il genelinde aylık 656 aileye yönelik kuru gıda paketi dağıtılmaktadır.

Paketler, A – B – C tipi olarak ayrılmıştır.

A tipi paket 1-2 kişi,

B tipi paket 3-4 kişi,

C tipi paket 5 ve üzeri kişi bulunan ailelere dağıtılmaktadır.

Her bir kuru gıda paketi içerisinde 16 çeşit kuru gıda bulunmakta, kişi sayısına göre ürün miktarları artmaktadır.

Nitelik	Adet	TL
AYLIK DAĞITIM	656	1.384.033,62
3 AYLIK GERÇEKLEŞME	1.968	4.152.100,86
YILLIK TAHMİNİ TOPLAM	7.872	16.608.403,44

KURU GIDA YARDIMLARI



MUHTAÇ AYLIĞI

2024 YILI

YARARLANAN KİŞİ SAYISI	YIL SONU MALİYETİ
Yetim: 8	3.384.866,88 ₺
Engelli:46	
TOPLAM:54	

2025 YILI

YARARLANAN KİŞİ SAYISI	2025 MALİYET
Yetim: 8	1.026.976,32 ₺
Engelli:46	
TOPLAM:54	

YÜKSEKÖĞRENİM BURSUSU

2024 YILI

HİZMETİN CİNSİ	SAYISI	TL
YÜKSEKÖĞRENİM BURSUSU	76	2.000,00
YABANCI UYRUKLU YÜKSEKÖĞRENİM BURSUSU	4	2.000,00

2025 YILI

HİZMETİN CİNSİ	SAYISI	TL
YÜKSEKÖĞRENİM BURSUSU	76	3.000,00
YABANCI UYRUKLU YÜKSEKÖĞRENİM BURSUSU	2	3.000,00

YURT DIŐI KURU GIDA YARDIMI

Vakıflar Genel M¼d¼rl¼ğ¼ koordinesinde

Ramazan ayı ierisinde ihtiya sahiplerine daėıtılması iin

Bosna-Hersek, Kosova, Karadaė 'a kuru gıda kolileri g¼nderilmiőtir.



¼LKE	KOLİ ADEDİ	HARCAMA (TL)
Bosna-Hersek	6.000	11.216.844,60
Kosova	6.000	11.216.844,60
Karadaė	3.000	5.608.422,30
TOPLAM	13.000	28.042.111,50

YURT DIŐI İFTAR ORGANİZASYONLARI

Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde yerel İslami kuruluşlar ile işbirliğı yoluyla Bosna-Hersek ve Kosova'da Ramazan ayı iftar organizasyonları düzenlenmiştir.

ÜLKE	HARCAMA (TL)
Bosna-Hersek	3.759.274,94
Kosova	1.276.475,78
TOPLAM	5.035.750,72

VAKIF

YÜREKTEN

VERMEKTİR



T.C.
VAKIFLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Arz ederim.

Ahmet SARAÇ
Bölge Müdürü

KIRKLARELİ

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

117.478.007

0

18

Proje Sayısı

1.239.273.000

Toplam Proje Tutarı

11.820.623

Toplam Harcama Tutarı

117.478.007

Toplam Yıl Ödeneği

0

Yılı Harcama Tutarı

0

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

0

3.Dönem Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%0,00

%0,00

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcam...
BABAESKİ	0
DEMİRKÖY	0
LÜLEBURGAZ	1.812.980
MERKEZ	0
MUHTELİF İLÇE	10.007.643
VİZE	0
Toplam	11.820.623

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı	Toplam Harcama Yüzdesi
Enerji	11.820.623	100,00%
Toplam	11.820.623	100,00%

Bakanlık Adı	Toplam Harcama T...
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI	11.820.623
Toplam	11.820.623

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam
(BABAESKİ-HAMİTABAT) BRŞ N.-LÜLEBURGAZ ENERJİ İLETİM HATTI	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	1	25.879.000	
(KIRKLARELİ-PINARHİSAR) BRŞ. N.-KIRKLARELİ OSB EİH	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	1	10.800.000	
(PINARHİSAR - TRAÇİM) BRŞ. N. - PAGDER ASLAN OSB EİH (TTFO)	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	66.000.000	78.000.000	
(TRAÇİM-DEMİRKÖY) BRŞ. N.-EVRENCİK RES EİH (TTFO) 154 KV, 2X1272...	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	1.500.000	15.684.000	
BABAESKİ-PINARHİSAR EİH YENİLEME (TTFO) 154 KV, 1272 MCM, 40 K...	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	1	182.980.000	
BABAESKİ-VERBANA DGKÇS EİH (TTFO) 400KV,2X38 1272 MOM, 2 KM+...	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	285.000	1.234.000	
BALKAYA RES YEKA - VİZE 380 HAVZA EİH (TTFO)(154 KV, 1272 MCM, 1...	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	1	143.770.000	
KIRKLARELİ OSB TM 154/33 KV, 1. VE 2. TRAFO FİDERİ	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	10.000.000	75.283.000	
KIŞLACIK HAVSA TM-KIYIKÖY RES EİH (TTFO) (154 KV, 1272 MCM, 18 K...	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	1	70.000.000	
L.BURGAZ EVRENSEKİZ TM 154/33 KV, 1. VE 2. TRAFO FİDERİ	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	5.000.000	100.000.000	
Toplam			117.478.007	1.239.273.000	1



TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


**2025 YILI KIRKLARELİ
2. DÖNEM RAPORU**



2025 YILI KIRKLARELİ 2. DÖNEM RAPORU

- ▶ TOPLAM PROJE SAYISI : **18**
- ▶ BİTEN PROJE SAYISI : **0**
- ▶ DEVAM EDEN PROJE SAYISI : **3**
- ▶ İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI : **15**
- ▶ TOPLAM PROJE TUTARI : **1.242.589.000 TL**
- ▶ 2025 YILI ÖDENEĞİ (TOPLAM) : **117.496.000 TL**
- ▶ 2025 YILI YAPILAN TOPLAM HARCAMA : **0 TL**
- ▶ NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI : **% 0**
- ▶ FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI : **% 0**


KIRKLARELİ İLİNDE BULUNAN TRAFİKO MERKEZLERİ

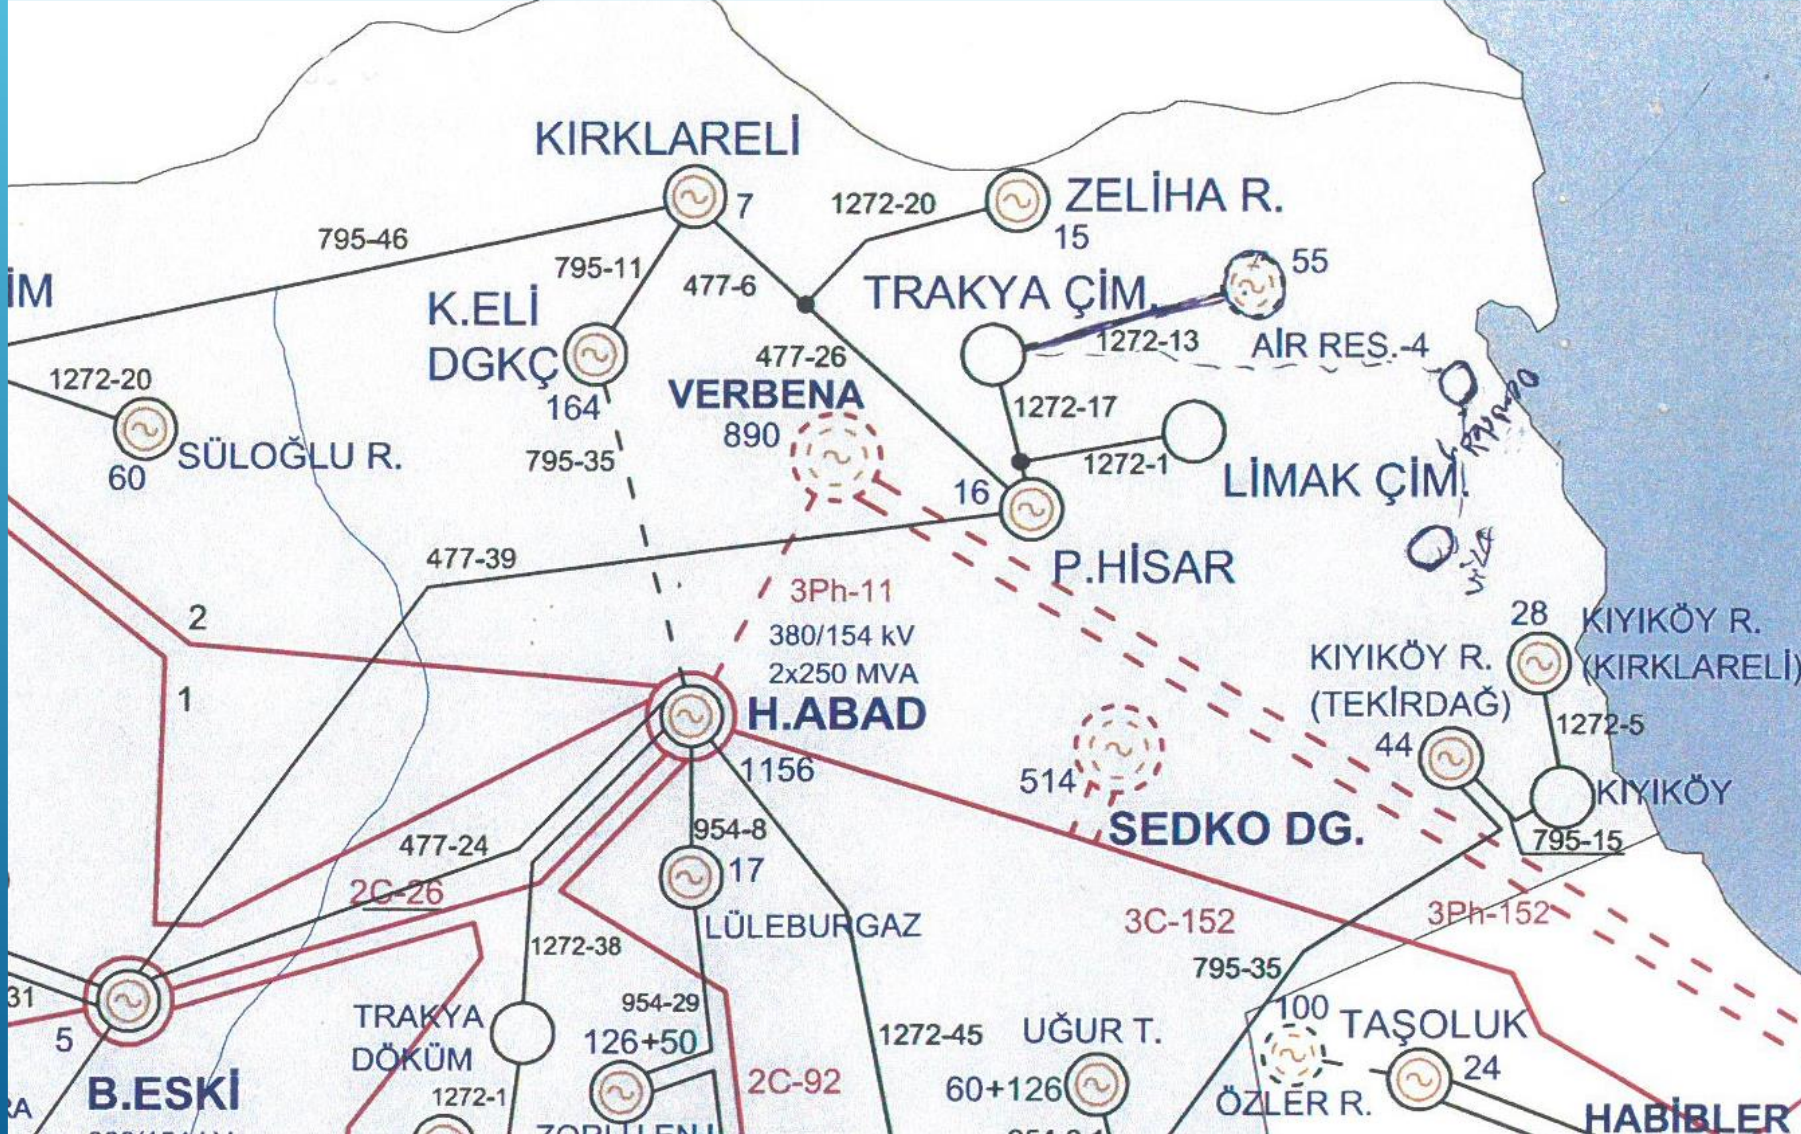



KIRKLARELİ İLİ ENERJİ VERİLERİ VE KURULU GÜCÜ

	TÜKETİM (KWh)	ÜRETİM (KWh)	KURULU GÜÇ (KW)
ARALIK	235.186.000	739.529.779	2001
OCAK	246.980.007	761.669.082	2001
ŞUBAT	232.801.776	732.091.746	2001

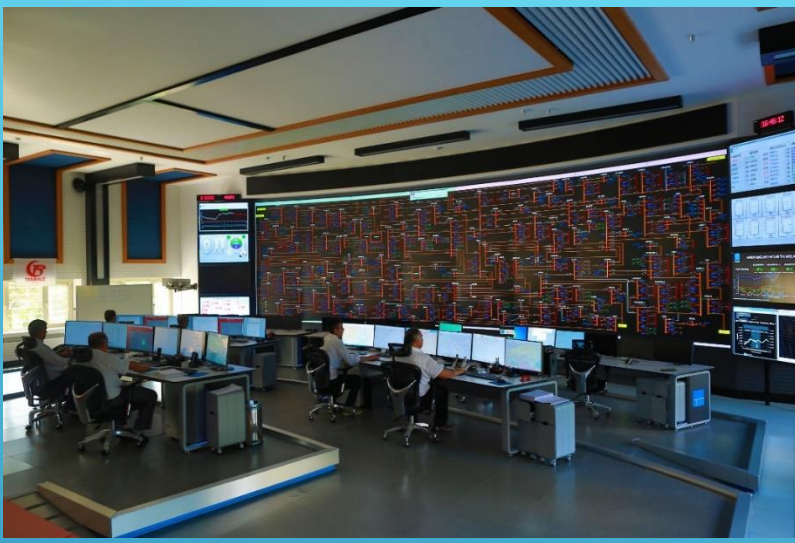

2025 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN KIRKLARELİ İLİNE AİT PROJELER

- ▶ Hamitabat TM Tevsiat 400 kV, 1 fider (Ototrafo)
- ▶ Vize TM İrtibat Hatları 400 kV, 2x3B 1272 MCM, 2,1 km
- ▶ (Pınarhisar - Traçım) Brş. N. - Pagder Aslan OSB EİH (TTFO) 154 kV, 1272 MCM, (6+6) km (İki Ayrı Hat)
- ▶ (Babaeski - Hamitabat) Brş. N. - Lüleburgaz EİH (TTFO) 154 kV, 2x1272 MCM, 4 km
- ▶ Kışlacık Havza TM – Kıyıköy RES EİH (TTFO) 154 kV, 1272 MCM, 18 km
- ▶ Balkaya RES YEKA - Vize 380 Havza EİH (TTFO) 400 kV, 3B 1272 MCM, 14 km
- ▶ Vize Havza TM Tevsiat 400 kV 2 fider (Verbena DGKÇS, Yedek) + 154 kV, 4 fider (Balkaya RES, Sergen RES, Ulaş, ASB)
- ▶ Sergen RES - Vize 380 Havza EİH (TTFO) 400 kV, 3B 1272 MCM, 28 km
- ▶ Uzunköprü - Babaeski Kısmi EİH Yenileme (TTFO) 154 kV, 1272 MCM, 23 km
- ▶ Kırklareli OSB TM 154/33 kV, 1. ve 2. Trafo Fideri
- ▶ (Kırklareli - Pınarhisar) Brş. N. - Kırklareli OSB EİH 154 kV, 1272 MCM, 2+2 km (İki Ayrı Hat)
- ▶ Babaeski - Pınarhisar EİH Yenileme (TTFO) 154 kV, 1272 MCM, 40 km (Yenileme)
- ▶ (Traçım - Demirköy) Brş. N. - Evrencik RES EİH (TTFO) 154 kV, 2x1272 MCM, 2 km
- ▶ Evrensekiz TM 154/33 kV, 1. ve 2. Trafo Fideri
- ▶ Babaeski - Verbena DGKÇS EİH (TTFO) 400 kV, 2x3B 1272 MCM, 2 km + 3B 1272 MCM 16 km
- ▶ Vize Havza - Bulgaristan Sınır Hat-3 EİH (TTFO) 400 kV, 3B 954 MCM, 135 km
- ▶ Vize Havza - ASB - Ulaş EİH (TTFO) 154 kV, 2x1272 MCM, 25 km + 1272 MCM, 4 km + 1272 MCM, 4 km
- ▶ Kıyıköy RES TM Tevsiat 154 kV, 1 fider (Kışlacık Havza TM)



DEVAM EDEN PROJELER

- (Pınarhisar - Traçım) Brş. N. - Pagder Aslan OSB EİH (TTFO) 154 kV, 1272 MCM, (6+6) km (İki Ayrı Hat)

Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Projenin yeri (İlçe)	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	2025 yılı ödeneği (TL)	2025 yılı har.
2020D00-149430-149518	(Pınarhisar - Traçım) Brş. N. - Pagder Aslan OSB EİH (TTFO)	KİT	Pınarhisar Vize	2020	2025	78.000.000	66.000.000	0


DEVAM EDEN PROJELER

- **Kırklareli OSB TM [154/33 kV, 1. ve 2. Trafo fideri]**
- **Vize Havza TM Tevsiat [400 kV 2 fider (Verbena DGKÇS, Yedek) + 154 kV, 4 fider (Balkaya RES, Sergen RES, Ulaş, ASB)]**

Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Projenin yeri (İlçe)	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	2025 yılı ödeneği (TL)	2025 yılı har.
2022D00-175939-176964	Kırklareli OSB TM [154/33 kV, 1. ve 2. Trafo fideri]	KİT	Merkez	2022	2026	75.283.000	10.000.000	0
2020D00-149430-149455	Vize Havza TM Tevsiat [400 kV 2 fider (Verbena DGKÇS, Yedek) + 154 kV 4 fider (Balkaya RES, Sergen RES, Ulaş, ASB)]	KİT	Merkez	2020	2026	104.560.000	6.000	0



ARZ EDERİM.

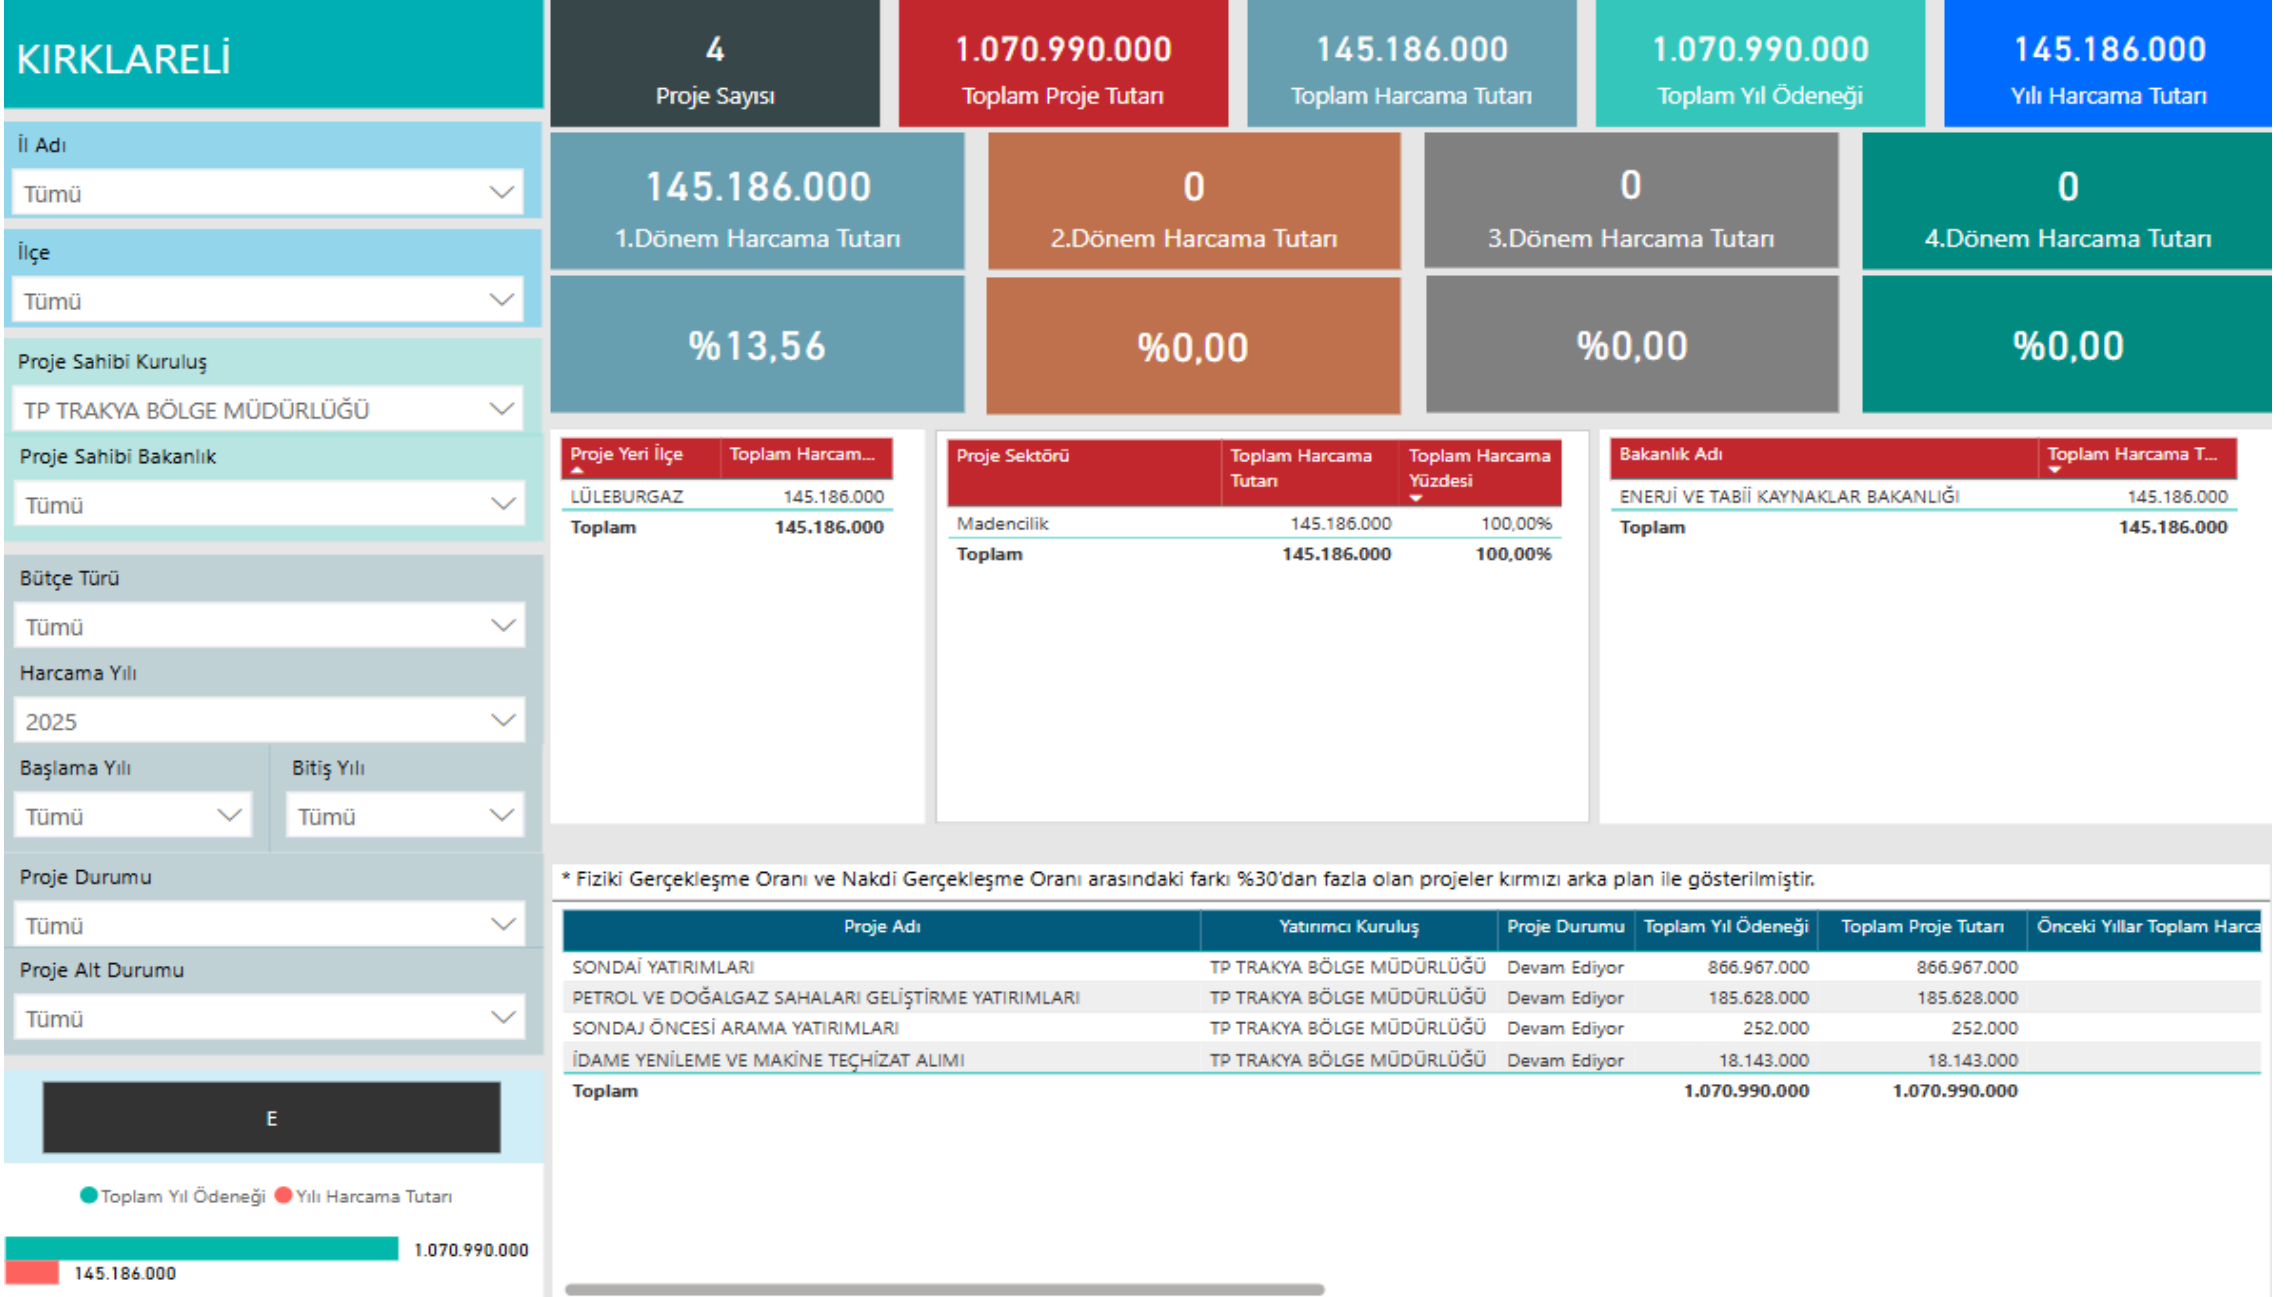



TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.
TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Nisan 2025

Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı Toplantı Salonu

Sondaj-Sondaj Yatırımları

Kuyu Tamamlama Hizmetleri-Kuyu Tamamlama Yatırımları

Üretim-Petrol ve Doğal Gaz Sahaları Geliştirme Yatırımları

Yatırım Projeleri İzleme Raporu, Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu



Sondaj-Sondaj Yatırımları

Trakya Bölgesinde Hizmet Aldığımız Sondaj Kuleleri



**MR-8000 BD-6
MAPEK (BORDRILL)**



16.04.2025

**MR-7000/1
TPIC**



Türkiye Petrolleri A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü

160

2025 Yılı Sondaj Termini



2025 YILI TERMİN PROGRAMI VE GERÇEKLEŞMESİ

12. REVİZYON (23.03.2025)

24.03.2025

		Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	
TRAKYA	F320-BERD TPIC-29							BOĞANLI-1 3.750 - AR				KARAÇALI SOĞUCAK-2 3.400 - AR		
	MR7000-1 TPIC-6	ÇİMENMAKIFLAR 700 - AR	ERGENE-3 610 - AR	ERGENE-3 610 - AR	ERGENE-3 660 - AR	KIREMITÇİSALIH-1 1.000 - AR	GÜLLÜKARATEPE ERGE 850 - AR	KARATEPE ERGE 1.250 - AR	1.080 - AR	GÜZELKÖY-1 1.500 - AR	ARKBOYU-1 1.500 - AR	ENEZ-1 1.150 - AR	ÇÖPKÖY-5 1.000 - AR	
	MR8000-BD6 BORDRILL-6	BEĞENDİK-1 2.500 - AR		HIDIRKÖY-1 2.150 - AR		MİSİNLİ MEZARDERE-1 2.200 - AR		BAYRAMIÇ-1 1.800 - AR			KAŞIKÇI-1 1.800 - AR		TUZLA-1 1.690 - AR	
	MUTEAHHİT-19 300T								KINIKLI-1 3.200 - AR			MEHMETPAŞALI-1 2.700 - AR		
	MUTEAHHİT-20 200T							EVRENŞEKİZ-1 1.900 - AR		KULELİ-5 2.000 - AR		MİNNETLER-3 2.750 - AR		
	47.875 (20) (A:20 Ü:0)	1.824 (1) (A:1 Ü:0)	2.258 (2) (A:2 Ü:0)	2.055 (1) (A:1 Ü:0)	1.781 (2) (A:2 Ü:0)	2.241 (1) (A:1 Ü:0)	3.203 (1) (A:1 Ü:0)	5.622 (2) (A:2 Ü:0)	4.913 (3) (A:3 Ü:0)	7.057 (2) (A:2 Ü:0)	5.760 (3) (A:3 Ü:0)	4.740 (1) (A:1 Ü:0)	6.421 (1) (A:1 Ü:0)	
	6.269 (4) (A:4 Ü:0)	2.836 (1) (A:1 Ü:0)	1.299 (2) (A:2 Ü:0)	2.134 (1) (A:1 Ü:0)										
	2025 İÇİNDE : 23 (AR:23 UR:0)		2024-SARKAN : 2 (AR:2 UR:0)			TOPLAM TERMİN : 25 (AR:25 UR:0)								
	kuyularında sondaj kaydedilmemiştir.													
	Nakliyat-Montaj AR ÜR Programlanan Sondj AR ÜR Gerçekleşen Sondj Demontaj Bakım Bekleme													
25.03.2025														

25.03.2025

2025 Sondajı Biten Kuyular



KUYU ADI	KULE ADI	KUYU CİNSİ	İL	SONDAJ SERVİS HİZMETİ	KUYU TİPİ	NAKLİYAT-MONTAJ BAŞLANGIÇ	SONDAJ BAŞLANGIÇ	SONDAJ BİTİŞ	DEMONTAJ BİTİŞ	PLANLANAN SONDAJ SÜRESİ	GERÇEKLEŞEN SONDAJ SÜRESİ	PLANLANAN DERİNLİK	GERÇEKLEŞEN DERİNLİK
ÇİMENLİ-1	MR7000-1	ARAMA	KIRKLARELİ	TPIC	YÖNLÜ	26.12.2025	31.12.2025	14.01.2025	16.01.2025	18 gün	17 gün	700 m	702 m
VAKIFLAR ERGENE-1	MR7000-1	ARAMA	TEKİRDAĞ	TPIC	YÖNLÜ	17.01.2025	22.01.2025	5.02.2025	7.02.2025	17 gün	16 gün	610 m	610 m
BEĞENDİK-1	MR8000-BD6	ARAMA	EDİRNE	MAPEK	DİK	1.01.2025	5.01.2025	23.02.2025	25.02.2025	49 gün	54 gün	2500 m	2500 m
VAKIFLAR ERGENE-2	MR7000-1	ARAMA	TEKİRDAĞ	TPIC	YÖNLÜ	8.02.2025	12.02.2025	6.03.2025	7.03.2025	17 gün	23 gün	610 m	610 m

2025 Sondajı Devam Eden Kuyular



KUYU ADI	KULE ADI	KUYU CİNSİ	İL	SONDAJ SERVİS HİZMETİ	KUYU TİPİ	NAKLİYAT-MONTAJ BAŞLANGIÇ	SONDAJ BAŞLANGIÇ	PLANLANAN SONDAJ SÜRESİ	GERÇEKLEŞEN SONDAJ SÜRESİ	PLANLANAN DERİNLİK	GERÇEKLEŞEN DERİNLİK
HIDIRKÖY-1	MR8000-BD6	ARAMA	EDİRNE	MAPEK	YÖNLÜ	26.02.2025	4.03.2025	45 gün	21 gün	2150 m	1305 m
VAKIFLAR ERGENE-3	MR7000-1	ARAMA	TEKİRDAĞ	TPIC	YÖNLÜ	8.03.2025	12.03.2025	18 gün	13 gün	660 m	554 m



Kuyu Tam. Hiz.-Kuyu Tamamlama Yatırımları

Hizmet Aldığımız Kuyu Tamamlama Kuleleri



NOV-5C1



16.04.2025

**IDECO-7
TPIC**



Türkiye Petrolleri A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü

Kuyu Tamamlama Hizmetleri ve Yatırımları



Trakya bölgesinde 2 adet Workover Kulesi çalıştırılarak tamamlama, yeniden tamamlama ve aktif üretim kuyularında oluşan arızaları giderme işlemleri yapılmaktadır.

2025 Yılındaki Workover faaliyetleri kapsamında,

- 4 kuyuda tamamlama çalışması, (2 Kırklareli, 1 Tekirdağ, 1 Edirne)
- 20 kuyuda yeniden tamamlama çalışması, (7 Kırklareli, 10 Tekirdağ, 3 İstanbul)
- 5 arıza giderme çalışması yapılmıştır. (1 Kırklareli, 4 Tekirdağ)



Üretim-Petrol ve Doğal Gaz Sahaları Geliştirme Yatırımları



- 76 Üretim Sahası
- Toplam 203 Üretim Kuyusu (105 Faal)
- Şubat 2025 Ortalama Üretim 5.475 v/g (54 v/kuyu))

- 21 Ortak Doğal Gaz Üretim Sahası (Trakya (% 50 pay) ve Batı Karadeniz (% 51 Pay))
- Toplam 46 Üretim Kuyusu (19 Faal)

- 3 Dağıtım Firması (İGDAŞ, PALMET, GAZPORT)
- 1 Üretim Şirketi (TBNGC)
- 10 Serbest Tüketickiye Satış yapılmaktadır.
- 2 Ortak İşletme Ruhsatı (Petrogas, Park Place)

- Trakya genelinde üretilen petrol ve kondensat kara tankeri ile M. Ereğlisi OPET tesislerine stoklanmakta ve 3-4 ay ortalama periyodlarla gemi ile TÜPRAŞ' a satışı yapılmaktadır.
- Doğal gazın üretiminden satış noktalarına iletimine kadar toplam 560 km'lik boru hattı mevcuttur.



TRAKYA İL BAZINDA GÜNLÜK ÜRETİM-MART 2025



İl Adı	Günlük Üretim,Sm3	Günlük Üretim, Bbl
Tekirdağ	400.000	129
Kırklareli	230.000	107
İstanbul	130.000	4
Düzce(Akçakoca)	5.000	0
	765.000	240

2025 Yılı Mart Kümülatif Doğal Gaz Satışları



- 2025 Yılı Mart Doğal Gaz Satışlarının Kırklareli'nde Şirketlere Ve Sektörlere Göre Ayrıntılı Dağılımı TPAO (Sm³)

KIRKLARELİ	Lisans Tipi	Dönüşüm/Çevrim Sektörü	Enerji Sektörü	Ulaşım Sektörü	Sanayi Sektörü	Hizmet Sektörü	Konutlar	Diğer	Genel Toplam
TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.	Toptan Satış Lisansı				14.861.570,00			15.319	14.876.889,00

- 2025 Yılı Doğal Gaz Toplam Satışlarının Kırklareli'nde Şirketlere Ve Sektörlere Göre Ayrıntılı Dağılımı TPAO (Sm³)

KIRKLARELİ	Lisans Tipi	Dönüşüm/Çevrim Sektörü	Enerji Sektörü	Ulaşım Sektörü	Sanayi Sektörü	Hizmet Sektörü	Konutlar	Diğer	Genel Toplam
TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.	Toptan Satış Lisansı				28.551.903,00			34.882	28.586.785,00



Yatırım Projeleri İzleme Raporu, Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu

Yatırım Projeleri İzleme Raporu



Sıra no	Sektörü	Proje numarası	Proje adı ve karakteristiği	Bütçe Türü	Projenin yeri (İlçe)	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2025 yılı ödeneği (TL)	2025 yılında gönderilen ödenek (TL)	2025 yılı harcamaları (TL)	Nakdi gerçekleştirme (%)
			Toplam					1.070.990.000	0	1.070.990.000	1.070.990.000	145.186.000	13,56
1	Maden		Sondaj-Sondaj Yatırımları	KT	Lüleburgaz	2025	2025	866.967.000	0	866.967.000	866.967.000	122.416.000	14,12
2	Maden		Üretim-Petrol ve Doğal Gaz Sahaları Geliştirme Yatırımları	KT	Lüleburgaz	2025	2025	185.628.000	0	185.628.000	185.628.000	21.385.000	11,52
3	Maden		Muhtelif İşler-İdame Yatırımları ve Makine Teçhizat Alımı	KT	Lüleburgaz	2025	2025	18.143.000	0	18.143.000	18.143.000	1.364.000	7,52
4	Maden		Sondaj Öncesi Arama Yatırımları	KT	Lüleburgaz	2025	2025	252.000	0	252.000	252.000	21.000	8,33

Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu



	Toplam	Sektör adı	Sektör adı	Sektör adı	Sektör adı
Projelerin Genel durumu					
Proje sayısı	4	4			
Proje tutarı (TL)	1.070.990.000	1.070.990.000			
Önceki yıllar harcamaları	0	0			
2022 yılı ödeneği (TL)	1.070.990.000	1.070.990.000			
Projelerin Parasal Gerçekleşme Durumu					
2023 yılında gönderilen ödenek (TL)	1.070.990.000	1.070.990.000			
2023 yılı harcamaları (TL)	145.186.000	145.186.000			
Parasal gerçekleşme (yüzde)	13,56	13,56	#SAYI/0!	#SAYI/0!	#SAYI/0!
2023 yılı ödenek ihtiyacı (TL)	0				
Projelerin Fiziki Gerçekleşme Durumu					
Toplam proje sayısı	4	4	0	0	0
Başlanmayan proje sayısı	0	0			
Proje aşamasındaki proje sayısı	0				
İhale aşamasındaki proje sayısı	0				
İhalesi yapılan proje sayısı	0				
Yer teslimi yapılan proje sayısı	0				
Yarım kalan proje sayısı	0				
Devam eden proje sayısı	4	4			
Biten proje sayısı	0	0	0	0	0



TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.
TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞEKKÜRLER



KIRKLARELİ

8
Proje Sayısı529.491.435
Toplam Proje Tutarı163.569.423
Toplam Harcama Tutarı286.000.001
Toplam Yıl Ödeneği1.203.324
Yılı Harcama Tutarı

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

286.000.001

1.203.324

1.203.324

1.Dönem Harcama Tutarı

%0,42

0

2.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

0

3.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcam...
MERKEZ	163.569.423
Toplam	163.569.423

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı	Toplam Harcama Yüzdesi
Eğitim	148.528.804	90,80%
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	15.040.619	9,20%
Sağlık	0	0,00%
Toplam	163.569.423	100,00%

Bakanlık Adı	Toplam Harcama T...
ÜNİVERSİTELER	163.569.423
Toplam	163.569.423

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar T...
MAKİNE TEÇHİZAT, OKUL VE BÜRO MEFRUŞATI, DEMİRBAŞ, BİLGİSAYAR...	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Devam Ediyor	1.000.000	1.000.000	
YAYIN ALIMLARI	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	15.000.000	15.000.000	
PINARHİSAR MYO DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ İLE KAYALI YERLEŞKESİ ME...	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Devam Ediyor	8.000.000	10.282.935	
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	10.000.000	10.000.000	
GIDA ODAKLI İHTİSASLAŞMA PROJESİ	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Devam Ediyor	6.000.000	40.483.000	
KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR MERKEZİ (10.000 M2)	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Devam Ediyor	207.000.000	400.000.000	
MUHTELİF BAKIM VE ONARIMLAR	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	39.000.000	39.000.000	
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (ETÜD-PROJE, İNŞAAT 250 YTA...	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	13.725.500	
Toplam			286.000.001	529.491.435	

Kirklareli Kütüphane ve Kültür Merkezi



Başlama bitiş tarihi	: 2023 - 2026
Proje tutarı	: 400.000.000
Önceki yıllar harcaması	: 145.117.545
2025 ödeneği	: 207.000.000
2025 gönderilen ödenek	: 207.000.000
2025 harcaması	: 0
2025 nakdi gerçekleşme	: % 0
Fiziki gerçekleşme	: % 28

KIRKLARELİ

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

29.921.226

400.802.166

20

Proje Sayısı

479.060.390

Toplam Proje Tutarı

98.500.765

Toplam Harcama Tutarı

400.802.166

Toplam Yıl Ödeneği

29.921.226

Yılı Harcama Tutarı

29.921.226

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

0

3.Dönem Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%7,47

%0,00

%0,00

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcam...
BABAESKİ	0
LÜLEBURGAZ	22.302
MERKEZ	31.743.478
MUHTELİF İLÇE	31.853.332
PINARHİSAR	307.396
VİZE	34.574.257
Toplam	98.500.765

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı	Toplam Harcama Yüzdesi
Eğitim	60.791.837	61,72%
Ulaştırma - Haberleşme	30.067.386	30,53%
Diğer Kamu Hizmetleri-İktis...	7.641.542	7,76%
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	0	0,00%
Tarım	0	0,00%
Toplam	98.500.765	100,00%

Bakanlık Adı	Toplam Harcama T...
YEREL YÖNETİMLER	98.500.765
Toplam	98.500.765

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Ha
SOKAK HAYVANLARI BAKIM, REHABİLİTASYON VE DOĞAL YAŞAM ALA...	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Devam Ediyor	343.440	6.471.764	
KÖY YOLLARI YAPIM, BAKIM VE ONARIMI	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Projeye Başlanmadı	227.306.500	227.796.100	
ACİL ARAMA VE KURTARMA HİZMETLERİ	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Projeye Başlanmadı	3.702.721	3.702.721	
BABAESKİ SİNANLI OSMANLI ÇEŞMESİ BAKIM VE ONARIMI	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Projeye Başlanmadı	93.500	93.500	
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Projeye Başlanmadı	1.000.000	1.000.000	
HAYVAN İÇMESUYU GÖLETLERİ	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Projeye Başlanmadı	150.000	150.000	
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJELERİ	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Projeye Başlanmadı	3.400.000	3.400.000	
KELİ KIRKŞEHİTLER ŞEHİTLİĞİ RESTORASYONU	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Devam Ediyor	100.000	100.000	
KELİ ÖZEL İDARE İŞ HANI BAKIM VE ONARIMI	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Devam Ediyor	1	9.000.000	50
KIRKLARELİ KOCAHIDIR İLKÖĞRETİM OKULU RÖLEVE RESTİTİSYON VE ...	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Devam Ediyor	0	25.544.442	25
Toplam			400.802.166	479.060.390	68.5

KIRKLARELİ

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İ...

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

13.044.434

0

6

Proje Sayısı

333.322.686

Toplam Proje Tutarı

3.358.487

Toplam Harcama Tutarı

13.044.434

Toplam Yıl Ödeneği

0

Yılı Harcama Tutarı

0

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

0

3.Dönem Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%0,00

%0,00

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcam...
MERKEZ	501.448
PINARHİSAR	2.857.039
Toplam	3.358.487

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı	Toplam Harcama Yüzdesi
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	3.358.487	100,00%
Toplam	3.358.487	100,00%

Bakanlık Adı	Toplam Harcama T...
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI	3.358.487
Toplam	3.358.487

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı
KIRKLARELİ AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE S...	KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	1.200.000
KIRKLARELİ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ	KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	1.200.000
KIRKLARELİ HUZUREVİ BAHÇE DUVARI RESTİTÜSYON, RÖLEVE VE REST...	KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	618.000	618.000
KIRKLARELİ HUZUREVİ DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜMÜ	KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1.056.353	1.056.353
KIRKLARELİ HUZUREVİ KAYNARCA EK HİZMET BİNASI	KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	11.191.293	14.048.333
KIRKLARELİ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İNŞ...	KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	178.786	316.400.000
Toplam			13.044.434	333.322.686

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Yatırımlar



Sıra no	Proje numarası	Sektör	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2025 Yılı Programı (TL)	2025 Yılında Gönderilen Ödenek (TL)	2025 Yılı Harcamaları (TL)	Parasal Gerçekleşme (%)	Fiziki Gerçekleşme (%)	Açıklamalar
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü					333.322.686	3.358.487	13.044.434	0	0	0		
DKH / Sosyal / Sosyal İçerme					333.322.686	3.358.487	13.044.434	0	0	0		
1	2024K17-227088-227106	K.eli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Hizmet Binası (Etüd - proje)	GB	2018	2025	1.200.000	0	1	0	0	0	HB
2	2024K17-231736-231749	K.eli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı (100 kişilik, 10.000 m ²)	GB	2014	2027	316.400.000	501.448	178.786	0	0	0	YT
3	2023K17-191985-192026	K.eli Çocuk Evleri Sitesi	GB	2023	2025	1	0	1	0	0	0	HB
4	0000000-000	Kırklareli Huzurevi Doğal Gaz Dönüşümü	GB	2024	2025	1.056.353	0	1.056.353	0	0	0	HB
5	0000000-000	Kırklareli Huzurevi Bahçe Duvarı Restitüsyon, Röleve ve Restorasyon Projesi Hazırlanması	GB	2024	2025	618.000	0	618.000	0	0	0	DE
6	0000000-000	Kırklareli Huzurevi Kaynarca Ek Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	GB	2023	2025	14.048.332	2.857.039	11.191.293	0	0	0	DE

KIRKLARELİ

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜR...

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

23.854.803

16.939.414

6

Proje Sayısı

23.854.803

Toplam Proje Tutarı

16.939.414

Toplam Harcama Tutarı

23.854.803

Toplam Yıl Ödeneği

16.939.414

Yılı Harcama Tutarı

16.939.414

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

0

3.Dönem Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%71,01

%0,00

%0,00

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcam...
BABAESKİ	5.362.992
DEMİRKÖY	0
KOÇAZ	0
LÜLEBURGAZ	1.809.301
MUHTELİF İLÇE	9.767.121
VİZE	0
Toplam	16.939.414

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı	Toplam Harcama Yüzdesi
Eğitim	16.939.414	100,00%
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	0	0,00%
İmalat	0	0,00%
Toplam	16.939.414	100,00%

Bakanlık Adı	Toplam Harcama T...
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI	16.939.414
Toplam	16.939.414

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki
BABAESKİ SPOR SALONU MASİF PARKE VE SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUT...	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	5.816.400	5.816.400	
YURT VE SPOR TESİSLERİ (11 ADET) DEPREM PERFORMANS ANALİZİ YA...	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	14.523.600	14.523.600	
LÜLEBURGAZ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU ÇEVRE DÜZENLEMESİ	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	3.514.800	3.514.800	
DEMİRKÖY İĞNEADA GENÇLİK KAMPI YAPIMI	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	1	
KOÇAZ AÇIK SPOR TESİSLERİ BAKIM VE ONARIMI	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	1	
VİZE YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİ YURDU YAPIMI	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	1	
Toplam			23.854.803	23.854.803	

**T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ**



GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ



2025

➤ BİTEN PROJELERİMİZ

- *Genç Ofis Dönüşüm İşi*

➤ DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

- *Lüleburgaz Kapalı Yüzme Havuzu Çevre Düzenleme Yapım İşi*
- *Babaeski Spor Salonu Masif Parke ve Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Aydınlatma Yapım İşi*
- *Kırklareli Merkez ve İlçelerinde Bulunan Spor-Yurt Tesislerine (11 adet) Deprem Performans Analizi Yapım İşi*

➤ YAPIM AŞAMASINDA BULUNAN PROJELERİMİZ

- *Vize İlçe Karma Yurt Yapım İşi*
- *İğneada Gençlik Kampı Yapım İşi*



BİTEN PROJELERİMİZ

- *Genç Ofis Dönüşüm İşi*



GENÇ OFİS DÖNÜŞÜM İŞİ

- İl Özel İdaresince 15 yıllığına İl Müdürlüğümüze kullanım hakkı verilen bowling salonunun, gençlerin sosyal aktivitelerde bulunmak üzere genç ofise dönüşümü gerçekleştirilmiştir.

İşin Adı	: Genç Ofis Dönüşüm İşİ
Sözleşme Tarihi	: 30.07.2024
Geçici Kabul Tarihi	: 24.12.2024
İş Bitim Tarihi	: 24.12.2024
Sözleşme Bedeli	: 7.797.000,00 TL + KDV
Fiziki Gerçekleşme Oranı	: %100



DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

- *Lüleburgaz Kapalı Yüzme Havuzu Çevre Düzenleme Yapım İşi*
- *Babaeski Spor Salonu Masif Parke ve Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Aydınlatma Yapım İşi*
- *Kırklareli Merkez ve İlçelerinde Bulunan Spor-Yurt Tesislerine (11 adet) Deprem Performans Analizi Yapım İşi*



Lüleburgaz Kapalı Yüzme Havuzu Çevre Düzenleme Yapım İşi

Mevcut tesisin görsel ve güvenlik açısından modernizasyonunu sağlamak.

İşin Adı : Lüleburgaz Kapalı Yüzme Havuzu Çevre Düzenleme Yapım İşi

Sözleşme Tarihi : 13.02.2025

Geçici Kabul Tarihi : -

Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi : 14.06.2025

Sözleşme Bedeli : 2.929.000,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %49



Babaeski Spor Salonu Masif Parke ve Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Aydınlatma Yapım İşi

İlçemizde bulunan spor salonumuzun zemininin değişimi ve sentetik futbol sahasının modernizasyonu planlanmaktadır.

İşin Adı

: *Babaeski Spor Salonu Masif Parke ve
Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası
Aydınlatma Yapım İşi*

Sözleşme Tarihi

: 31.01.2025

Geçici Kabul Tarihi

: -

Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi : 03.06.2025

Sözleşme Bedeli

: 4.847.000,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %83



Kırklareli Merkez ve İlçelerinde Bulunan Spor-Yurt Tesislerine (11 adet) Deprem Performans Analizi Yapım İşi

Binalarımızın depreme karşı dayanaklığının analizi yapılması.

İşin Adı

: Kırklareli Merkez ve İlçelerinde Bulunan
Spor-Yurt Tesislerine (11 adet) Deprem
Performans Analizi Yapım İşi

Sözleşme Tarihi

: 21.02.2025

Geçici Kabul Tarihi


: -

Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi : 21.06.2025

Sözleşme Bedeli

: 12.103.000,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %67



YAPIM AŞAMASINDA BULUNAN PROJELERİMİZ

- *Vize İlçe Karma Yurt Yapım İşi*
- *İğneada Gençlik Kampı Yapım İşi*



VİZE İLÇE KARMA YURT YAPIM İŞİ

İlimizde yüksek öğrenim gören öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları ile beraber sosyal ve kültürel gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla yapımı planlanmaktadır.

İşin Adı	: Vize İlçe Karma Yurt Yapım İşİ
Sözleşme Tarihi	: Proje Aşamasında (Yer tahsisi yapıldı)
İş Bitim Tarihi	: -
Yaklaşık Bedeli	: 65.300.000 TL + KDV
Fiziki Gerçekleşme Oranı	: %0



-Örnektir.

İĞNEADA GENÇLİK KAMPI YAPIM İŞİ

İlimizde gerçekleştirilecek olan gençlik faaliyetlerinde kullanılmak ve gençlerimizin sosyalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla yapımı planlanmaktadır.

İşin Adı	: İğneada Gençlik Kampı İşİ
Sözleşme Tarihi	: Proje Aşamasında (Yer tahsisi yapıldı)
İş Bitim Tarihi	: -
Yaklaşık Bedeli	: -
Fiziki Gerçekleşme Oranı	: %0



-Örnektir.

KIRKLARELİ

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

262.778.753

12.778.752

3

Proje Sayısı

875.631.201

Toplam Proje Tutarı

94.419.168

Toplam Harcama Tutarı

262.778.753

Toplam Yıl Ödeneği

12.778.752

Yılı Harcama Tutarı

12.778.752

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

0

3.Dönem Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%4,86

%0,00

%0,00

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcam...
DEMİRKÖY	64.247.355
MERKEZ	30.171.813
PINARHİSAR	0
Toplam	94.419.168

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı	Toplam Harcama Yüzdesi
Konut	64.247.355	68,04%
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	30.171.813	31,96%
Diğer Kamu Hizmetleri-İktis...	0	0,00%
Toplam	94.419.168	100,00%

Bakanlık Adı	Toplam Harcama T...
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI	94.419.168
Toplam	94.419.168

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması
DEMİRKÖY HÜKÜMET KONAĞI YAPIMI	KIRKLARELİ VALİLİĞİ	Devam Ediyor	12.778.752	78.631.201	51.468.603
PINARHİSAR HÜKÜMET KONAĞI YAPIMI (3.600 M2)	KIRKLARELİ VALİLİĞİ	Projeye Başlanmadı	1	144.000.000	0
TRAKYA SINIRI SINIR GÜVENLİK SİSTEMLERİ PROJESİ	KIRKLARELİ VALİLİĞİ	Devam Ediyor	250.000.000	653.000.000	30.171.813
Toplam			262.778.753	875.631.201	81.640.416

KIRKLARELİ

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

0

1

Proje Sayısı

700.000

Toplam Proje Tutarı

24.192

Toplam Harcama Tutarı

1

Toplam Yıl Ödeneği

0

Yılı Harcama Tutarı

0

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

0

3.Dönem Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%0,00

%0,00

%0,00

Proje Yeri İlçe

Toplam Harcam...

VİZE

24.192

Toplam

24.192

Proje Sektörü

Toplam Harcama Tutarı

Toplam Harcama Yüzdesi

Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal

24.192

100,00%

Toplam

24.192

100,00%

Bakanlık Adı

Toplam Harcama T...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

24.192

Toplam

24.192

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırım Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Topla
VİZE İLÇE JANDARMA K.LIĞI ETÜD PROJE İŞLERİ	KIRKLARELİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI	Devam Ediyor	1	700.000	
Toplam			1	700.000	

KIRKLARELİ

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜ...

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

700.001

0

3

Proje Sayısı

35.488.088

Toplam Proje Tutarı

34.788.087

Toplam Harcama Tutarı

700.001

Toplam Yıl Ödeneği

0

Yılı Harcama Tutarı

0

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

0

3.Dönem Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%0,00

%0,00

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcam...
LÜLEBURGAZ	34.788.087
MUHTELİF İLÇE	0
Toplam	34.788.087

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı	Toplam Harcama Yüzdesi
Eğitim	34.788.087	100,00%
Toplam	34.788.087	100,00%

Bakanlık Adı	Toplam Harcama T...
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI	34.788.087
Toplam	34.788.087

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önce
ESKİ ESER RESTORASYONLARINA YARDIM	KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	1	
LÜLEBURGAZ İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ İNŞAATI (2.555 M2)	KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	0	34.788.087	
YEREL KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE YARDIM	KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	700.000	700.000	
Toplam			700.001	35.488.088	



Yatırımlar

Sıra no	Proje numarası	Sektör	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2025 Yılı Programı (TL)	2025 Yılında Gönderilen Ödenek (TL)	2025 Yılı Harcamaları (TL)	Parasal Gerçekleşme (%)	Fiziki Gerçekleşme (%)	Açıklamalar
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü					35.488.089	34.788.087	700.002	0	0	0		
Eğitim / Kültür					35.488.089	34.788.087	700.002	0	0	0		
1	1976H04-53	L.burgaz İlçe Halk Kütüphanesi İnşaatı (2.555 m2)	GB	2017	2025	34.788.088	34.788.087	1	0	0	98	DE
2	0000000-000	Eski Eser Restorasyonlarına Yardım	GB	2025	2025	1	0	1	0	0	0	HB
3	0000000-000	Yerel Kültürel Etkinliklere Yardım	GB	2025	2025	700.000	0	700.000	0	0	0	HB

Lùleburgaz İlçe Halk Kùtùphanesi



İlçesi: Lüleburgaz,
Karakteristiğı: 2.555 m2,
Başlama ve bitiş tarihi: 2017 – 2025,
Proje tutarı: 34.788.087, Harcama: 34.788.087,
Fizik gerçekteşme: yüzde 100
Tefrişat ihalesi yapılmıştır. Mayıs ayında açılması planlanmaktadır..

KIRKLARELİ

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

148.864.913

1

8

Proje Sayısı

592.489.912

Toplam Proje Tutarı

610.969

Toplam Harcama Tutarı

148.864.913

Toplam Yıl Ödeneği

1

Yılı Harcama Tutarı

1

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

0

3.Dönem Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%0,00

%0,00

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcam...
LÜLEBURGAZ	610.968
MERKEZ	1
VİZE	0
Toplam	610.969

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı	Toplam Harcama Yüzdesi
Eğitim	610.969	100,00%
Toplam	610.969	100,00%

Bakanlık Adı	Toplam Harcama T...
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI	610.969
Toplam	610.969

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yılla
KELİ FERİHA AHMET ALDOĞAN ETÜT MERKEZİ	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	1	1	
İLKÖĞRETİM VE GENEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BAKIM VE ONARI...	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	68.689.376	68.689.376	
L.BURGAZ B.KARIŞTIRAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İNŞAATI	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	1	
L.BURGAZ KAZIM ŞEN ORTAOKULU İNŞAATI (16 DRS)	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	1	
LÜLEBURGAZ DERE MAHALLESİ ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU İNŞAATI (12 ...	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	1	41.865.000	
LÜLEBURGAZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İNŞAATI (24 DERSLİK)	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	77.780.000	479.540.000	
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARI BAKIM VE ONARIMLARI	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	2.395.532	2.395.532	
VİZE HATİCE İSMAİL ADIGÜZEL ANAOKULU İNŞAATI (8 DRS)	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	1	1	
Toplam			148.864.913	592.489.912	



EĞİTİMİN
YÜZYILI

KIRKLARELİ VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2025 Yılı 2. Dönem
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
16.04.2025
SUNUM



KIRKLARELİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü



Yatırımın türü	Toplam Proje Sayısı	2025 Yılı Ödeneği(TL)	2025 Yılı Gönderilen Ödenek (TL)	2025 Yılı Harcamaları (TL)	Devam Eden Proje Sayısı
Toplam Proje Tutarı: 550.624.908,00 TL	8	148.864.908,00	76.333.340,00	0,00	2
Anaokulu İnşaatları Hayırsever	2	0,00	0,00	0,00	2
İlkokul-Ortaokul İnşaatları/ Hayırsever	1	0,00	0,00	0,00	-
Etüt Merkezi İnşaatı Hayırsever	1	0,00	0,00	0,00	-
Meslek Lisesi İnşaatları	2	77.780.000,00	5.248.432,00	0,00	-
Bakım ve Onarımlar	2	71.084.908,00	71.084.908,00	0,00	-
*Verilerin tarihi: 31 Mart 2025'dir.					

Yatırımcı kuruluş	: HAYIRSEVER
Adı	: Dt. Şeyma Biran (Dere Mah.) Özel Eğitim Anaokulu (ÖE-AO) (Hayırsever - Ayni %100)
Yeri	: Lüleburgaz Dere Mah. 584 ada 4 parsel
Karakteristiği	: 12 Derslik
Finansman kaynağı	: HAYIRSEVER
Başlama ve bitiş tarihi	: 2022 – 2025
Proje tutarı	: -
İhale bedeli	: -
Önceki yıllar harcaması	: 0
Program yılı ödeneği	: -
Harcama	: 0
Fiziki durumu	: Devam Ediyor
Açıklamalar	: İnşaat %87 seviyesinde devam ediyor.

Görseller

Yatırımcı kuruluş : **HAYIRSEVER**

Adı : **Feriha Ahmet Aldoğan
Etüt Merkezi
(Hayirsever - Ayni
%100)**

Yeri : **Merkez Camikebir Mah.
1045 ada 1 parsel**

Karakteristiği : **Etüt Merkezi**

Finansman kaynağı : **HAYIRSEVER**

Başlama ve bitiş tarihi : **2025 – 2025**

Proje tutarı : **-**

İhale bedeli : **-**

Önceki yıllar harcaması : **0**

Program yılı ödeneği : **-**

Harcama : **0**

Fiziki durumu : **Bitti**

Açıklamalar : **İnşaat tamamlanmıştır.**

Görseller



Yatırımcı kuruluş	: HAYIRSEVER
Adı	: Hatice İsmail Adıgüzel Anaokulu 8 Derslik (AO) (Hayırsever - Aynı %100)
Yeri	: Vize Evren Mah. 506 ada 1 parsel
Karakteristiği	: 8 Derslik
Finansman kaynağı	: HAYIRSEVER
Başlama ve bitiş tarihi	: 2025 – 2026
Proje tutarı	: -
İhale bedeli	: -
Önceki yıllar harcaması	: 0
Program yılı ödeneği	: -
Harcama	: 0
Fiziki durumu	: Devam Ediyor
Açıklamalar	: İnşaat %5 seviyesinde devam ediyor.

Görseller

Yatırımcı kuruluş	: HAYIRSEVER
Adı	: Kazım Şen Ortaokulu 16 Derslik (OO) (Hayirsever - Ayni %100)
Yeri	: Lüleburgaz Zafer Mah. 1023 ada 1 parsel
Karakteristiği	: 16 Derslik
Finansman kaynağı	: HAYIRSEVER
Başlama ve bitiş tarihi	: 2025 – 2026
Proje tutarı	: -
İhale bedeli	: -
Önceki yıllar harcaması	: 0
Program yılı ödeneği	: -
Harcama	: 0
Fiziki durumu	: Proje Aşamasındadır.
Açıklamalar	: Protokol imzalandı. Proje Aşamasındadır.

Görseller

Yatırımcı kuruluş : HAYIRSEVER

Görseller

Adı : Kırklareli Şişecam 90.
Yıl Büyükkarıştıran
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi 24
Derslik+Atölye
(Hayirsever - Aynı
%100)

Yeri : Lüleburgaz
Büyükkarıştıran
Beldesi

Karakteristiği : 24 Derslik+1 Atölye

Finansman kaynağı : HAYIRSEVER

Başlama ve bitiş tarihi : 2025 – 2027

Proje tutarı : -

İhale bedeli : -

Önceki yıllar harcaması : 0

Program yılı ödeneği : -

Harcama : 0

Fiziki durumu : Proje Aşamasındadır.

Açıklamalar : Protokol Aşamasındadır.



KIRKLARELİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yatırımcı kuruluş	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Adı	: Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yeri	: Lüleburgaz Atatürk Mah. 379 ada, 61 parsel
Karakteristiği	: 24 Derslik + 3 Atölye + Spor Salonu
Finansman kaynağı	: Genel Bütçe
Başlama ve bitiş tarihi	: 2023-2027
Proje tutarı	: 479.540.000,00
İhale bedeli	: -
Önceki yıllar harcaması	: 610.968,00
Program yılı ödeneği	: 77.780.000,00
Harcama	: 0,00
Fiziki durumu	: İhale Hazırlık Aşamasında.
Açıklamalar	: Bakanlığımız 2025 Yılı Devlet Yatırım Programına Alınan Projenin İhale Onayı Beklenmektedir. İhale Öncesi Hazırlık Aşamasındadır.

Görseller



*Görsel Temsilidir.



KIRKLARELİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü



İller Yatırım Projeleri İzleme Raporu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Onarımlar									
31 Mart 2025									
Sıra no	Proje adı ve karakteristiği	Proje tutarı (TL)	2025 yılı ödeneği (TL)	2025 yılında gönderilen ödenek (TL)	2025 yılı harcamaları (TL)	Nakdi gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Proje durumu	Açıklamalar
	Bakım ve Onarımlar	71,084,908	41,452,357	41,452,357	0	0	0	PA	
	İlköğretim ve Genel Ortaöğretim	68,689,376	41,452,357	41,452,357	0	0	0	PA	
	Temel Eğitim Okulları	31,311,449	31,311,449	31,311,449	0	0	0	PA	
1	Fatih Ortaokulu	869,296.00	869,296.00	869,296.00	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
2	Plevne İlkokul-Ortaokulu	1,181,045.00	1,181,045.00	1,181,045.00	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
3	Cumhuriyet İlkokulu	1,157,701.00	1,157,701.00	1,157,701.00	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
4	Cumhuriyet Ortaokulu	1,156,095.00	1,156,095.00	1,156,095.00	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
5	Kocasinan İlkokulu	2,005,411.00	2,005,411.00	2,005,411.00	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
6	T.E.K. Ortaokulu	2,235,049.00	2,235,049.00	2,235,049.00	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
7	8 Kasım Ortaokulu	13,220,484.00	13,220,484.00	13,220,484.00	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
8	Fehmi Mutlu Ortaokulu	Maliyet Bekleniyor	Maliyet Bekleniyor	Maliyet Bekleniyor	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
9	Şehit Pilot Üsteğmen İbrahim Gerçek İlkokulu	Maliyet Bekleniyor	Maliyet Bekleniyor	Maliyet Bekleniyor	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
10	Şaban Ögünç Ortaokulu	1,001,878.00	1,001,878.00	1,001,878.00	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
11	Üsküp Atatürk Ortaokulu (D.Gaz Dönüşüm)	1,505,705.00	1,505,705.00	1,505,705.00	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
12	Kırkşehitler İlkokulu Ek Bina (Tarihi Bina)	Maliyet Bekleniyor	Maliyet Bekleniyor	Maliyet Bekleniyor	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
13	Mustafa Dalcı İlkokulu	Maliyet Bekleniyor	Maliyet Bekleniyor	Maliyet Bekleniyor	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
14	Koğlu İlkokulu (D.Gaz Dönüşüm)	1,368,776.00	1,368,776.00	1,368,776.00	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
15	Arife Bekir Uğurlu İlkokulu	1,358,050.00	1,358,050.00	1,358,050.00	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
16	Çakıllı İlkokul-Ortaokulu	4,251,959.00	4,251,959.00	4,251,959.00	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
17	Adalet Erez İlkokulu (D.Gaz Dönüşüm)	Maliyet Bekleniyor	Maliyet Bekleniyor	Maliyet Bekleniyor	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
18	Namık Kemal Ortaokulu (D.Gaz Dönüşüm)	Maliyet Bekleniyor	Maliyet Bekleniyor	Maliyet Bekleniyor	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
	Ortaöğretim Okulları	37,377,927	10,140,908	10,140,908	0	0	0		
19	Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi	10,140,908	10,140,908	10,140,908	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
20	Lüleburgaz Anadolu Lisesi	3,596,994	3,596,994	3,596,994	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
21	Lüleburgaz Atatürk Anadolu Lisesi	1,514,021	1,514,021	1,514,021	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
22	Lüleburgaz Lisesi	1,919,757	1,919,757	1,919,757	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
23	Kepirtepe Anadolu Lisesi	1,561,097	1,561,097	1,561,097	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
24	Kırklareli Atatürk Anadolu Lisesi	3,327,396	3,327,396	3,327,396	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
25	Kırklareli Fen Lisesi	8,734,626	8,734,626	8,734,626	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
26	Pınarhisar Anadolu Lisesi	6,583,128	6,583,128	6,583,128	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
27	Vize Anadolu Lisesi (D.Gaz Dönüşüm)	Maliyet Bekleniyor	Maliyet Bekleniyor	Maliyet Bekleniyor	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.
	Mesleki ve Teknik Eğitim-HBÖ-Özel Eğt Uyg Okulları	2,395,532	0	0	0	0	0		
	Mesleki ve Teknik Eğitim	2,395,532	0	0	0	0	0		
28	Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	2,395,532	0	0	0	0	0	PA	İhaleye Esas Güncel Yaklaşık Maliyetleri Hazırlanmaktadır.



KIRKLARELİ VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Arz Ederim...
Hilal Liliyar ÖZEFSUN
İl Milli Eğitim Müdür V.

KIRKLARELİ

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

4.822.464

781.822.473

11

Proje Sayısı

4.822.464

1.Dönem Harcama Tutarı

%0,62

3.498.507.798

Toplam Proje Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

141.680.792

Toplam Harcama Tutarı

781.822.473

Toplam Yıl Ödeneği

0

3.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

4.822.464

Yılı Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcam...
BABAESKİ	72.635.150
DEMİRKÖY	0
KOÇAZ	2.971.218
LÜLEBURGAZ	62.037.531
MERKEZ	4.036.893
PEHLİVANKÖY	0
PINARHİSAR	0
Toplam	141.680.792

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı	Toplam Harcama Yüzdesi
Sağlık	141.680.792	100,00%
Toplam	141.680.792	100,00%

Bakanlık Adı	Toplam Harcama T...
SAĞLIK BAKANLIĞI	141.680.792
Toplam	141.680.792

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplamı
LÜLEBURGAZ 1 NO'LU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (8 AHB) + 112 ASHİ	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	4.822.464	107.700.000	
BABAESKİ ALPULLU 3 HEKİMLİ ASM + 112 ASHİ	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	1	17.994.005	
BABAESKİ İLÇE SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ + AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (SHM+...	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	1	143.088.000	
DEMİRKÖY 112 ASHİ	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	1	4.500.000	
KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ EK BİNA İNŞAATI (250 Y...	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	777.000.000	3.086.217.732	
KOÇAZ 112 ASHİ	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	1	4.737.060	
L.BURGAZ DEVLET HASTANESİ EK BİNA İNŞAAT (...YATAKLI,1800M2)	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	1	
LÜLEBURGAZ 11 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (8 AHB)+TOPLUM RUH ...	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	58.500.000	
PEHLİVANKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ(T13) + AİLE SAĞLIĞI MERKEZ...	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	42.525.000	
PINARHİSAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (5 AHB) + 112 ACİL SAĞLIK İSTASY...	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	20.196.000	
Toplam			781.822.473	3.498.507.798	



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

KIRKLARELİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

**KIRKLARELİ
SAĞLIK YATIRIMLARI**



2025 YILINDA
TAMAMLANAN
YATIRIMLAR

2

4

PROJE AŞAMASINDAKİ
YATIRIMLAR

İNŞAATI
DEVAM EDEN
YATIRIMLAR

4

1

PROJE İHALE
AŞAMASINDAKİ
YATIRIMLAR

TOPLAM
11



2025 YILINDA TAMAMLANAN YATIRIMLAR

2



BABAESKİ ALPULLU 3 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU



YATIRIM KÜNYESİ	
Proje Numarası	2006I00-823-133280
İhale Makamı	Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü
Kontrollük Makamı	Kırklareli İl Özel İdaresi
İşin Süresi	365 gün
Fiziki İlerleme %	100
Yatırım Maliyeti Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) /Gerçekleşen Ödeme TL	15.417.098,40 TL Gerçekleşen Ödeme:17.815.829,93 TL
İhale Tarihi	29.12.2023
Yer Teslim Tarihi	02.02.2024
Geçici Kabul Tarihi	07.02.2025
Mahalle-Ada/Parsel No	Sağlık Mah 126/6
Oturum Alanı	230 mm ²
Toplam Kapalı Alan m ²	460 m ²
Toplam Arsa Alan m ²	2027,94 m ²
Yüklenici Firma	İbrahim LAÇİN
Kat Blok Sayısı	B +ZK
Açıklamalar: Geçici kabulü 07.02.2025 tarihinde yapılmıştır. Taşınma süreçleri ile ilgili planlamalar yapılmaktadır.	



KOFÇAZ PREFABRİK 112 ASHİ BİNA YAPIMI



YATIRIM KÜNYESİ

Proje Numarası	-
İhale Makamı	Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü
Kontrollük Makamı	Kırklareli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
İşin Süresi	45 gün
Yapım İhale Tarihi	11.10.2024
Geçici Kabul Tarihi	12.02.2025
Fiziki İlerleme %	100
Sözleşme Tarihi	24.10.2024
Yatırım Maliyeti Sözleşme Bedeli KDV Dahil/ Gerçekleşen Ödeme	4.306.800,00 TL 4.828.060,84 TL
Yer Teslim Tarihi	01.11.2024
Mahalle-Ada/Parsel No	Yeni Mahalle -213/3
Toplam Arsa Alan m ²	2.675 m ²
Oturum Alanı	106 m ²
Kapalı Alan	212 m ²
Yüklenici Firma	Meydan Nak. Hay. Un. Mam. Gıda Emlak İnş. ve İnş. Malzemeleri İltiş. Oto Pet. Teks. Turizm San. Tic. Ltd. Şti.

Açıklama: Geçici kabulü 12.02.2025 tarihinde yapılmıştır. Giriş katına 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu üst katına TSM Birimlerinin taşınma süreçleri tamamlanmıştır.



İNŞAATI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

4



KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 250 YATAKLI EK BİNA




YATIRIM KÜNYESİ

Proje Numarası	20018100-145138
İhale Makamı	Sağlık Bakanlığı
Kontrollük Makamı	Sağlık Bakanlığı
İşin Süresi	800 gün
Bitiş Tarihi/Tahmini Bitiş Tarihi	-
Fiziki İlerleme	-
Yatırım Maliyeti İhale Bedeli (KDV Dahil)	2.361.298.800,00 TL
İhale Tarihi	27.03.2024
Yer Teslim Tarihi	23.05.2024 (Şerhli Yer Teslimi)
Mahalle-Ada/Parsel No	Hamidiye-373 /35
Oturum Alanı m ²	8.667 m ²
Toplam Kapalı Alan m ²	62.500 m ²
Toplam Arsa Alan m ²	63.489,19 m ²
Yüklenici Firma	Bahadır Müh. Proje İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd.Şti. & Dkr İnşaat Taah. San. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı
Kat Blok Sayısı	B+Z+5NK+Çatı

Açıklama: 23.05.2024 tarihinde şerhli yer teslimi yapılmıştır. İnşaat fiili olarak başlamamıştır.



LÜLEBURGAZ 1 NO'LU 8 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+ B TİPİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ + 2 ADET 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU

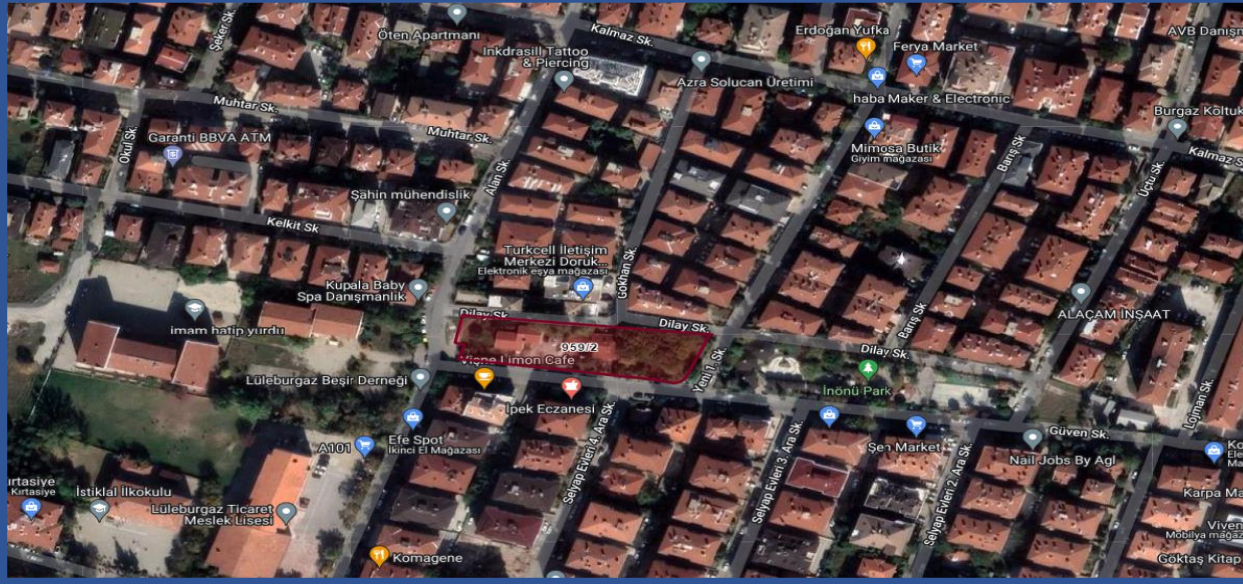

YATIRIM KÜNYESİ

Proje Numarası	2006I00-166421-166449
İhale Makamı	Kırklareli İl Özel İdaresi
Kontrollük Makamı	Kırklareli İl Özel İdaresi
İşin Süresi	750 gün
Bitiş Tarihi	12.03.2026
Fiziki İlerleme %	62
Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) / Gerçekleşen Ödeme TL	107.700.000 ,00 TL 61.794.357,24 TL
İhale Tarihi	20.12.2023
Yer Teslim Tarihi	12.02.2024
Mahalle-Ada/Parsel No	Kocasinan-959/2
Oturum Alanı	1.269,40 m ²
Toplam Kapalı Alan m ²	4.220,8 m ²
Toplam Arsa Alan m ²	2.675 m ²
Yüklenici Firma	Gün İnşaat Yapı Malzemeleri Taah. Tic. Ltd. Şti.
Kat Blok Sayısı	B+Z+2NK+Teras

Açıklamalar: İnşaat fiziki ilerlemesi % 62 seviyesinde devam etmektedir. Teras imalatları %95 oranında tamamlanmıştır. Dış cephe fibercement imalatları devam etmektedir. Islak hacim seramik imalatları devam etmektedir. Alçı ve sıva imalatlarına başlanılmıştır.



BABAESKİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ+8 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+ B TİPİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ+ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU



YATIRIM KÜNYESİ

Proje Numarası	2006I00-823-133246
İhale Makamı	Kırklareli İl Özel İdaresi
Kontrollük Makamı	Kırklareli İl Özel İdare
İşin Süresi	750 gün
Bitiş Tarihi	23.02.2026
Fiziki ilerleme %	49
Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) Gerçekleşen Ödeme	143.088.000,00 TL 54.576.145,86 TL
İhale Tarihi	20.12.2023
Yer Teslim Tarihi	23.02.2024
Mahalle-Ada/Parsel No	Gaziosmanpaşa-1575/3
Oturum Alanı m ²	1.009 m ²
Toplam Kapalı Alan m ²	4.889 m ²
Toplam Arsa Alan m ²	6.331 m ²
Yüklenici Firma	Haker Grup İnşaat Proje Taahhüt Tic. Ltd. Şti.
Kat Blok Sayısı	B+Z+2NK

Açıklamalar: İnşaat fiziki ilerleme % 49 seviyesinde devam etmektedir. A / B blok bodrum kat zemininin ince sıva yapımı tamamlanmış olup zemin kat ve 1. katta devam etmektedir. A / B blok bodrum ve zemin kat kapı kasaları takılmaktadır. C ve D blok duvarları tamamlanmıştır.



PINARHİSAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ +112 AŞİ (5 AHB)



YATIRIM KÜNYESİ	
Proje Numarası	2021I100-169206-172382
İhale Makamı	Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü
Kontrollük Makamı	Kırklareli İl Özel İdare
İşin Süresi	365 gün
Bitiş Tarihi /Tahmini Bitiş Tarihi	02.01.2026
Fiziki ilerleme %	23
Sözleşme Bedeli (KDV Dahil) Gerçekleşen Ödeme	20.196.000,00 TL -
İhale Tarihi	31.10.2024
Yer Teslim Tarihi	02.01.2025
Mahalle-Ada/Parsel No	Orta Mahalle-262/146
Arsa Alanı m2	1.080,68 m ²
Toplam Kapalı Alan m2	636,85 m ²
Toplam Oturum Alan m2	424,23 m ²
Kat Sayısı	Z+1NK
Yüklenici Firma	Canan Akat
Açıklama: İnşaat Fiziki ilerleme % 23 seviyesinde devam etmektedir. Temel imalatları tamamlanmıştır. Betonarme imalatları devam etmektedir.	



PROJE AŞAMASINDAKİ YATIRIMLAR

4



LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ 1800 m² ALANLI EK BİNA (ASM (8AHB)+TİP 3 TRSM+ AYAKTAN FTR)




PROJE YATIRIM KÜNYESİ	
Proje Numarası	2024/640955 İKN
Proje İhale Makamı	İl Sağlık Müdürlüğü
Kontrollük Makamı	İl Özel İdare
İşin Süresi	180 gün
Proje İhale Tarihi	27.05.2024
Proje İhale Sözleşme Tarihi	04.07.2024
Proje İhale Sözleşme Bedeli	426.580,60
Yer Teslim Tarihi	04.07.2024
Mahalle-Ada/Parsel No	Yıldız Mah. 1209 Ada/1 Parsel
Oturum Alanı m²	989 m²
Toplam Kapalı Alan m²	1.800 m²
Toplam Arsa Alan m²	9.168,74 m²
Yüklenici Firma	Mineart Mimarlık Akustik Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.
Açıklamalar: Avan projeleri 11.03.2025 tarihinde Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. Avan projeleri Belediye Başkanlığı onay aşamasındadır.	



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

PEHLİVANKÖY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ +AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ + 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU (ENTEĞRE SAĞLIK BİRİMİ)

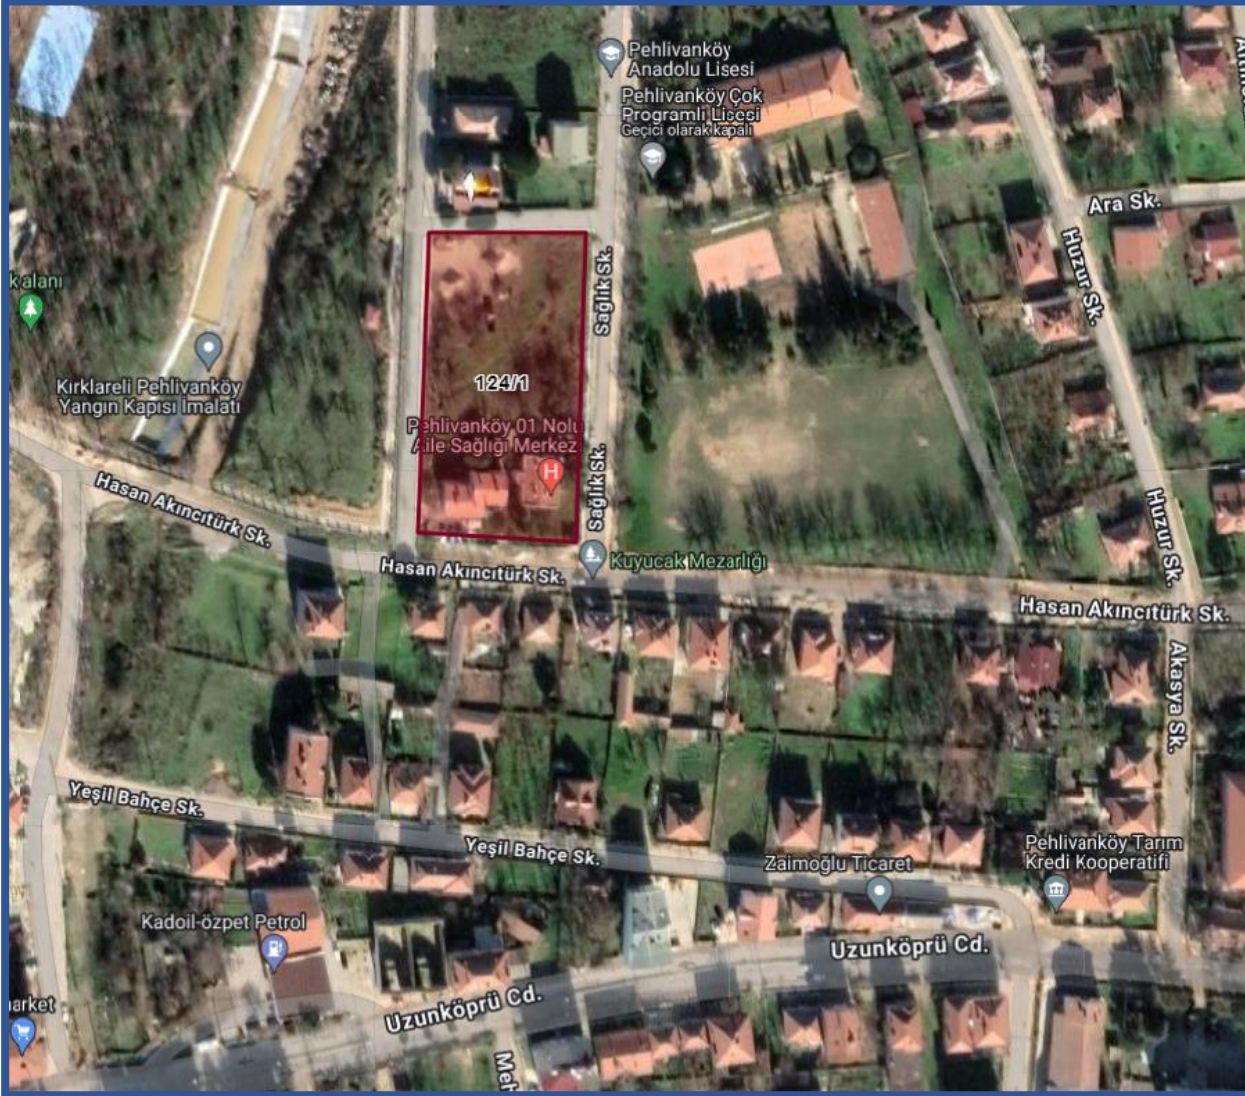

PROJE YATIRIM KÜNYESİ

Proje Numarası	2021I00-169206-23727
Proje İhale Makamı	İl Sağlık Müdürlüğü
Kontrollük Makamı	İl Özel İdare
İşin Süresi	120 gün
Proje İhale Tarihi	19.08.2024
Sözleşme Tarihi	13.09.2024
Sözleşme Bedeli	321.000,00
Yer Teslim Tarihi	17.09.2024
Mahalle-Ada/Parsel No	Kazımdirik 12/1
Otulum Alanı m2	673,17 m ²
Toplam Kapalı Alan m2	945 m ²
Toplam Arsa Alan m2	5.029,56 m ²
Yüklenici Firma	Masslab Mimarlık Müh.Lmt.Şti

Açıklamalar: Avan Projeleri 18.03.2025 tarihinde Bakanlığımız onayına sunulmuş olup onay aşamasındadır.



PINARHİSAR KAYNARCA 2 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ



PROJE YATIRIM KÜNYESİ


Proje Numarası	2006I00-823-133246
Proje İhale Makamı	Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü
Kontrollük Makamı	İl Özel İdare
İşin Süresi	90
Proje İhale Tarihi (Doğrudan temin)	10.03.2025
Sözleşme Tarihi	12.03.2025
Sözleşme Bedeli	259.900,00TL
Yer Teslim Tarihi	12.03.2025
Mahalle-Ada/Parsel No	186/1
Oturum Alanı m ²	290 m ²
Toplam Kapalı Alan m ²	290 m ²
Toplam Arsa Alan m ²	1.837,31 m ²
Yüklenici Firma	Mineart Mimarlık Akustik Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

Açıklamalar:

* Avan Projeleri 18.03.2025 tarihinde Bakanlığımız onayına sunulmuş olup onay aşamasındadır.



DEMİRKÖY 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYON BİNASI

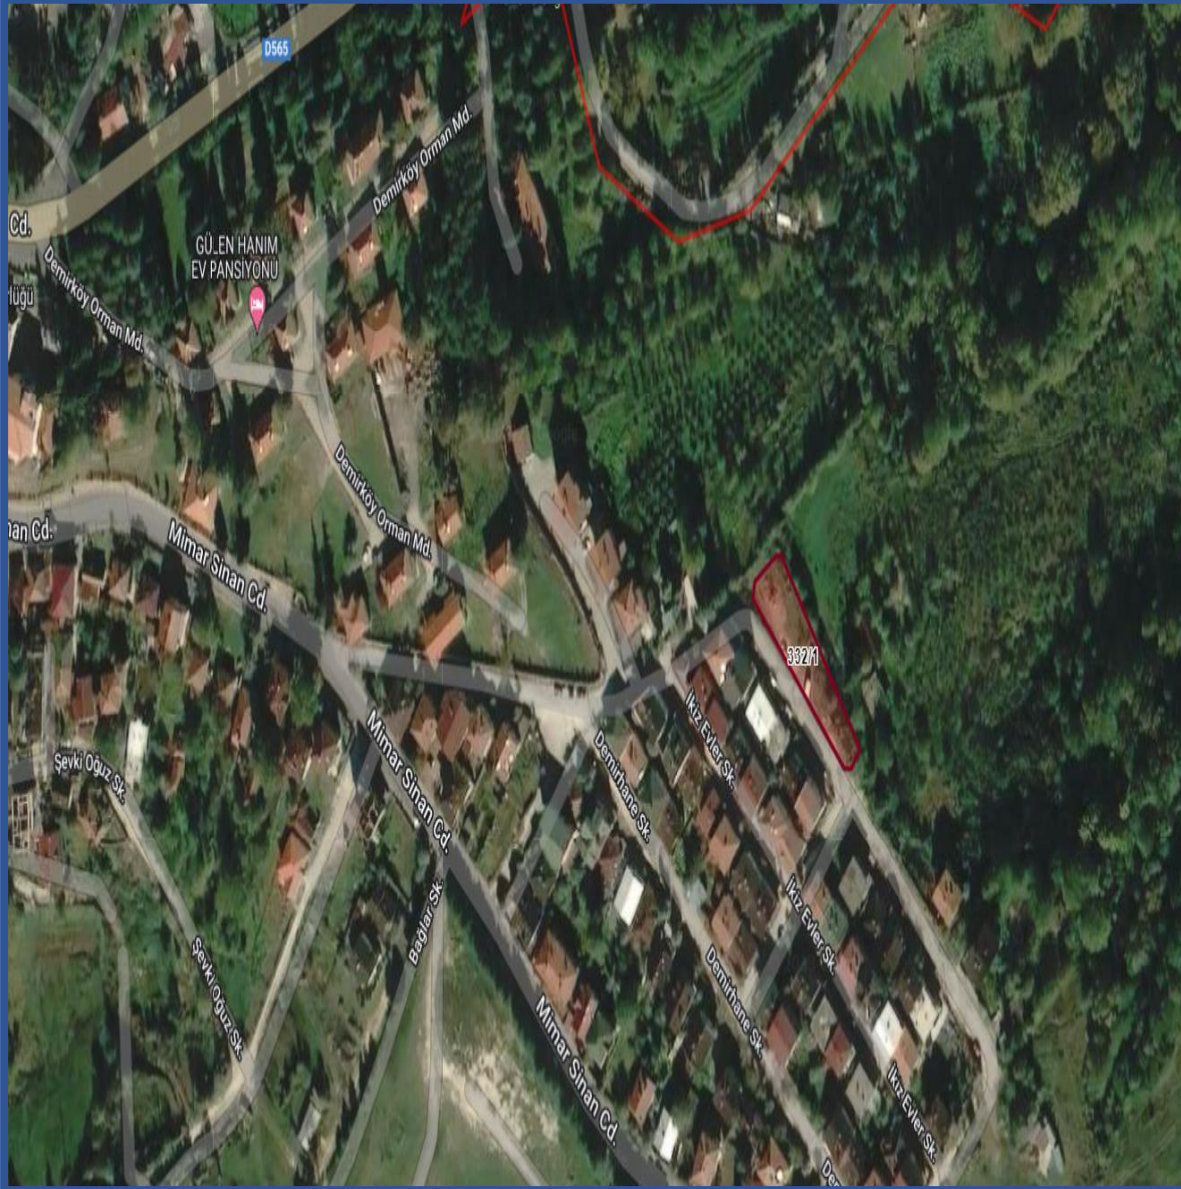

YATIRIM KÜNYESİ

Proje Numarası	2021I00-169206-188288
İhale Makamı	Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü
Kontrollük Makamı	Kırklareli İl Özel İdare
İşin Süresi	-
Bitiş Tarihi	-
Fiziki İlerleme %	-
Yatırım Maliyeti (KDV Dahil)	-
İhale Tarihi	-
Yer Teslim Tarihi	
Mahalle-Ada/Parsel No	Hamdibey -332/1
Oturum Alanı m2	200
Toplam Kapalı Alan m2	200
Toplam Arsa Alan m2	889,16
Yüklenici Firma	-
Kat Blok Sayısı	1

Açıklamalar: Bakanlığımız tarafından proje ödenek taahhüdü verilmiştir. Avan + Uygulama Proje alımı doğrudan temin limitinde olup sözleşme aşamasındadır.




PROJE İHALE AŞAMASINDAKİ YATIRIMLAR

1



LÜLEBURGAZ 11 NO'LU ASM (8 AHB) +TRSM+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYON BİNASI

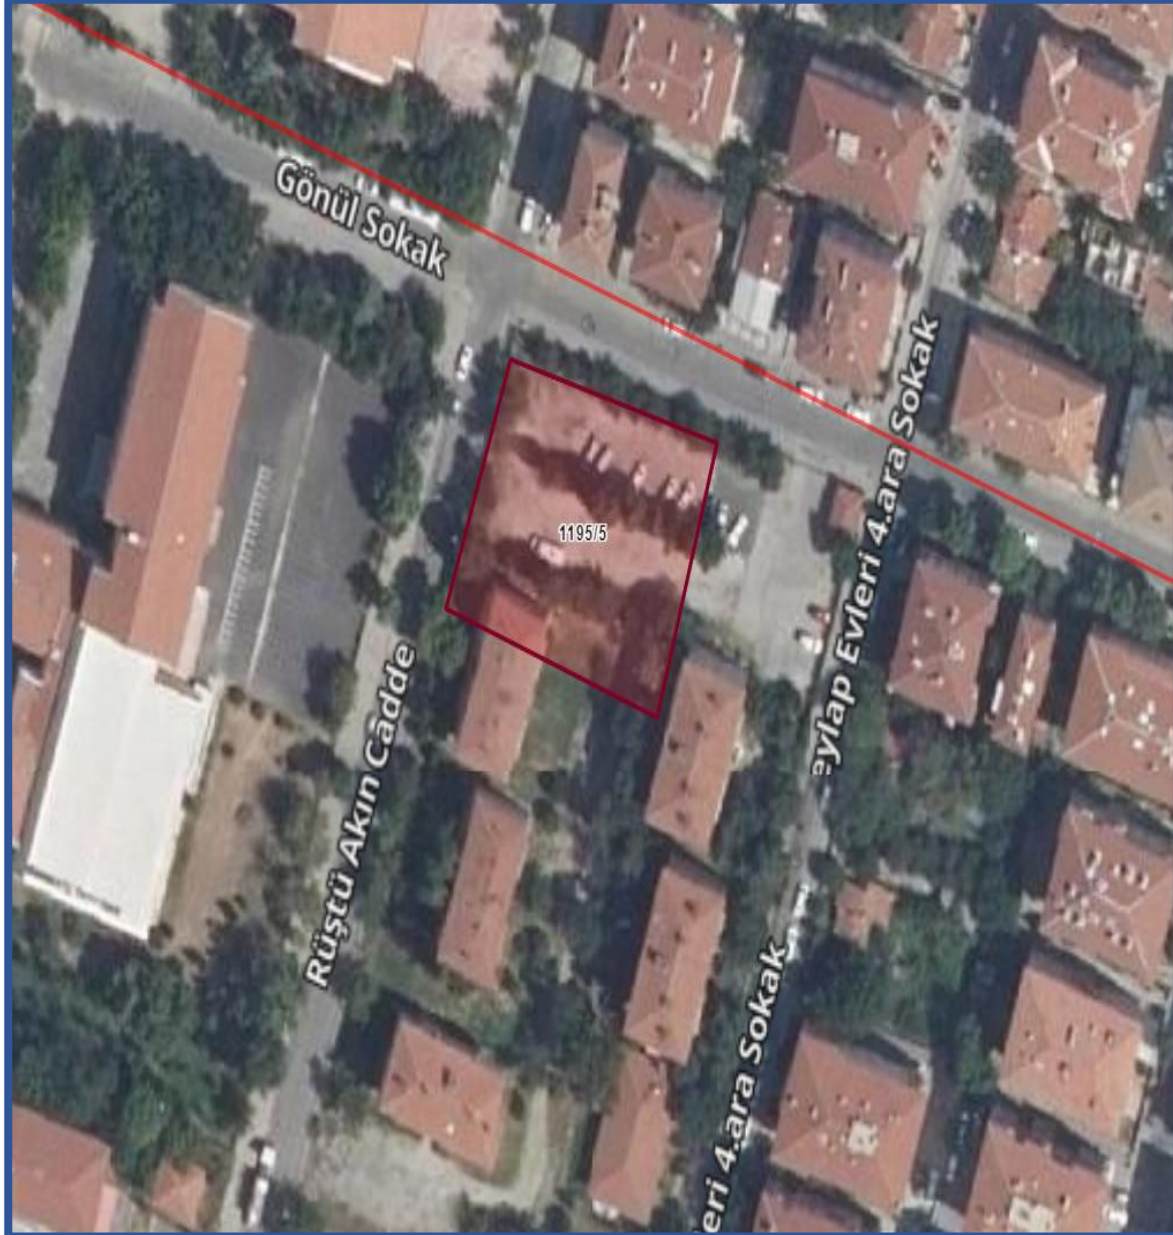

PROJE KÜNYESİ

Proje Numarası	-
İhale Makamı	-
Kontrollük Makamı	-
İşin Süresi	-
Bitiş Tarihi	-
Fiziki İlerleme %	-
Yatırım Maliyeti (KDV Dahil)	-
İhale Tarihi	-
Yer Teslim Tarihi	-
Mahalle-Ada/Parsel No	Gençlik Mah. 1195 Ada / 5 Parsel
Oturum Alanı m2	-
Toplam Kapalı Alan m2	1.320 m ²
Toplam Arsa Alan m2	1.563,48 m ²
Yüklenici Firma	-
Kat Blok Sayısı	-

Açıklamalar: 2025 Yılı Yatırım Programına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından proje ödenek taahhüdü verilmiştir. Avan + Uygulama proje ihale süreçlerine başlanılmıştır. EKAP kayıt aşamasındadır.

KIRKLARELİ

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜ...

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

84.634.767

84.634.764

5

Proje Sayısı

9.056.138.336

Toplam Proje Tutarı

1.182.408.273

Toplam Harcama Tutarı

84.634.767

Toplam Yıl Ödeneği

84.634.764

Yılı Harcama Tutarı

84.634.764

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

0

3.Dönem Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%100,00

%0,00

%0,00

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcam...
LÜLEBURGAZ	678.195.937
MERKEZ	504.212.336
VİZE	0
Toplam	1.182.408.273

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı	Toplam Harcama Yüzdesi
İmalat	1.182.408.273	100,00%
Diğer Kamu Hizmetleri-İktis...	0	0,00%
Toplam	1.182.408.273	100,00%

Bakanlık Adı	Toplam Harcama T...
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI	1.182.408.273
Toplam	1.182.408.273

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Ör
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. KISIM ALTYAPI İNŞAATI	KIRKLARELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	65.268.879	504.212.336	
LÜLEBURGAZ BÜYÜKKARIŞTIRAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALTYAPI ...	KIRKLARELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	19.365.885	980.000.000	
LÜLEBURGAZ BÜYÜKKARIŞTIRAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ...	KIRKLARELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	1	980.000.000	
LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALTYAPI (KANA...	KIRKLARELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	1.591.926.000	
VİZE ÇAKILLI İKİTELLİ KARMA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ İNŞAATI	KIRKLARELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	5.000.000.000	
Toplam			84.634.767	9.056.138.336	

Büyükkarıştıran OSB Atıksu Arıtma Tesisi



İlçesi: Lüleburgaz,
Başlama ve bitiş tarihi: 2020 – 2025,
Yapımı tamamlanmıştır.


Büyükkarıştıran OSB Altyapı İnşaatı



İlçesi: Lüleburgaz,
Başlama ve bitiş tarihi: 2020 – 2025,
Yapımı yüzde 80 oranında tamamlanmıştır.



Kirklareli Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Altyapı İnşaatı

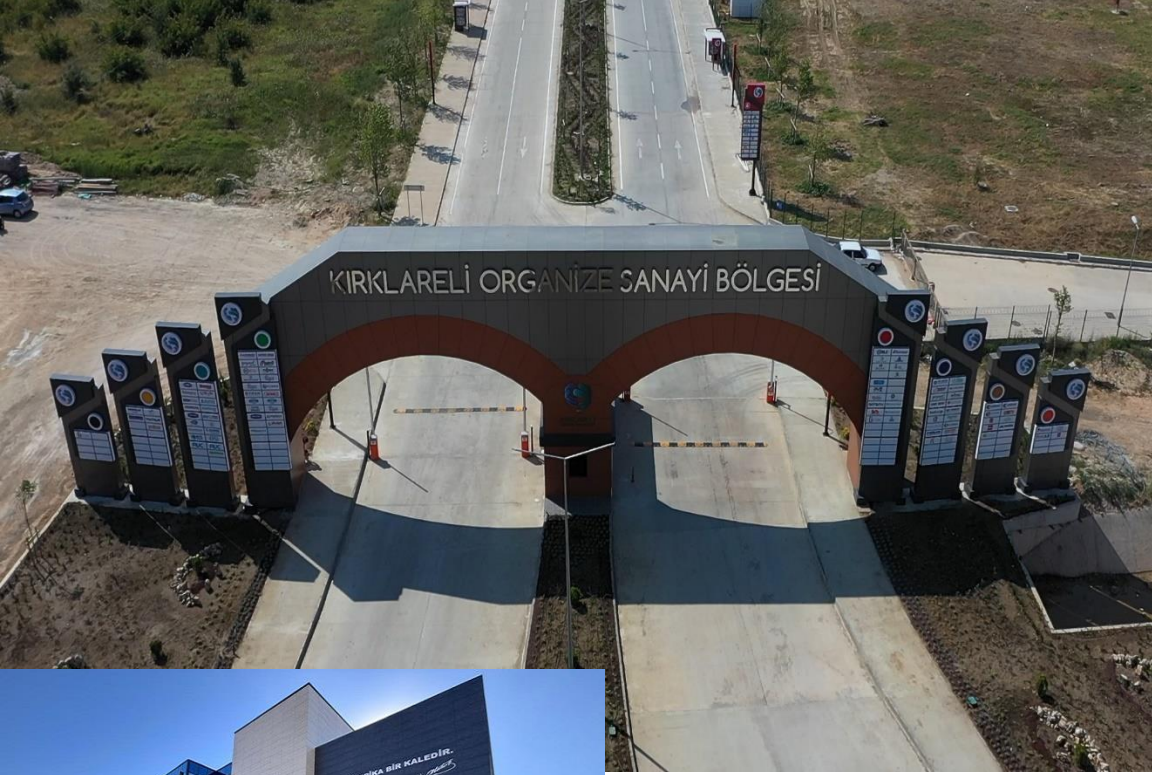


Mevcut 368 hektar alana 139 hektar 3. etap ve 629,5 hektar 4. etap genişleme çalışmaları kapsamında altyapı ve üstyapı yatırımları yapılmaktadır.

1. Giriş Tagı, Kamera ve Yönlendirme Sistemi, 2. Beton Yol, 3. Elektrik Şebeke, Dağıtım Köşkleri ve Havai Hat Deplase İşleri, 4. Rms-A ve B İstasyonları İle Doğalgaz Altyapı Şebekesi, 5. Su Dağıtım Şebekesi, 6. Atıksu ve Yağmursuyu Şebekeleri, 7. Galeri Sistemi, 8. Su Deposu Ve Terfi İstasyonu, 9. Atıksu Arıtma Tesisi, 10. Kuşaklama Kanalı ve Dere Islahı, 11. Sokak Aydınlatma ve Otomasyon Sistemi, 12. Tel Çit ve Çevre Güvenlik Duvarı, 13. Peyzaj İşleri, 14. İdari Bina, 15. Anaokulu, 16. Cami yapımı tamamlanmıştır.



Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Altyapı İnşaatı

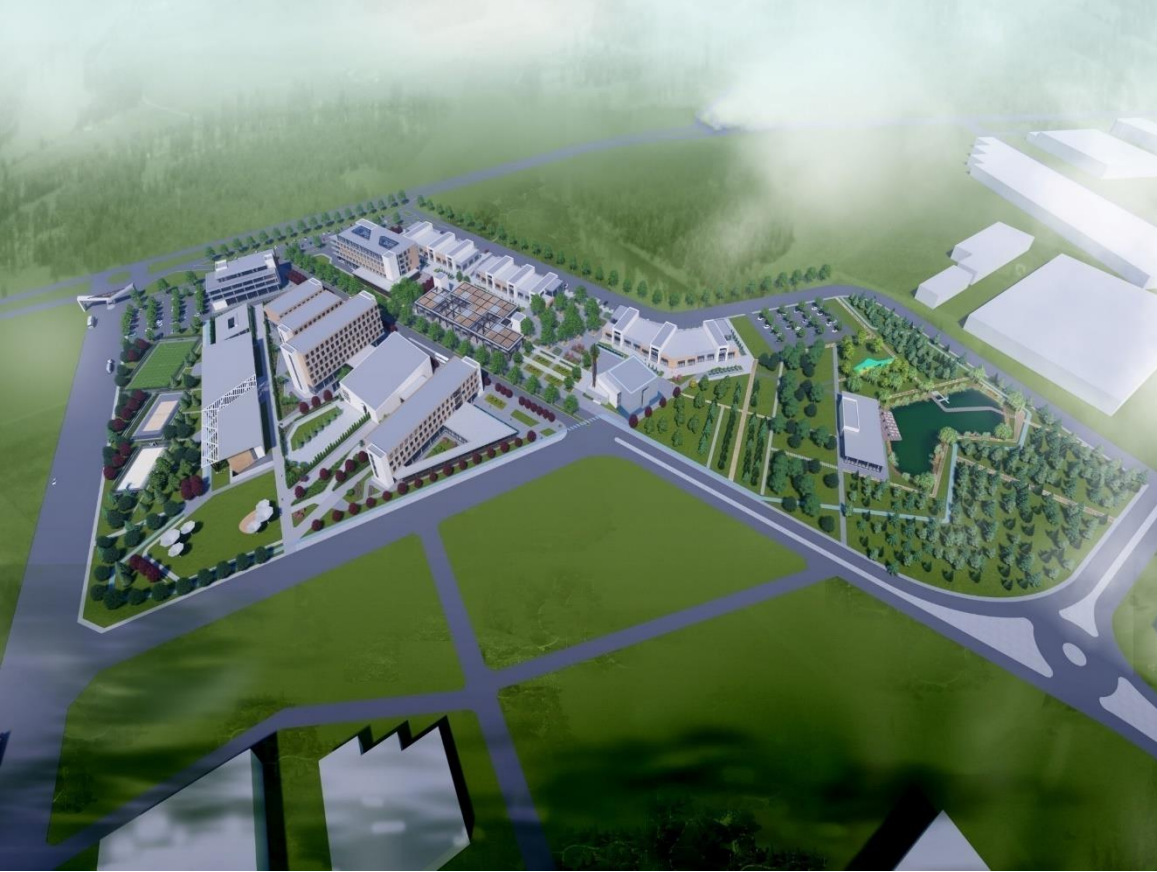

1. 3. Etap Genişleme Altyapı Yapım İşi, 2. İdari Ve Sosyal Tesis Alanı Projesi, 3. Restoran ve Rekreasyon Alanı, 4. Büfe, 5. 10.000m³ Su Deposu, 6. Kırklareli OSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, 7. Kırklareli OSB 154 kV Trafo Merkezi, 8. 29.000 m³/g¼n kapasiteli Arıtma Tesisi, 9. 4. Etap Genişleme İşlemleri devam etmektedir.

KIRKLARELİ

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜR...

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

632.446

2.054.592

5

Proje Sayısı

52.054.591

Toplam Proje Tutarı

1.139.531

Toplam Harcama Tutarı

2.054.592

Toplam Yıl Ödeneği

632.446

Yılı Harcama Tutarı

632.446

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

0

3.Dönem Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%30,78

%0,00

%0,00

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcam...
MERKEZ	507.085
MUHTELİF İLÇE	632.446
Toplam	1.139.531

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı	Toplam Harcama Yüzdesi
Tarım	1.139.531	100,00%
Toplam	1.139.531	100,00%

Bakanlık Adı	Toplam Harcama T...
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI	1.139.531
Toplam	1.139.531

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yılla
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJELERİ	KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	792.100	792.100	
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJELERİ	KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	1.083.491	1.083.491	
İMALAT PROJELERİ	KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	135.000	135.000	
KIRKLARELİ KAVAKLI TARIMA DAYALI İHTİSAS SÜT ORGANİZE SANAYİ B...	KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	1	50.000.000	
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJELERİ	KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	44.000	44.000	
Toplam			2.054.592	52.054.591	

KIRKLARELİ

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ ATATÜRK TOPRAK SU VE TARIM...

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

189.500

758.008

1

Proje Sayısı

4.025.334

Toplam Proje Tutarı

3.173.834

Toplam Harcama Tutarı

758.008

Toplam Yıl Ödeneği

189.500

Yılı Harcama Tutarı

189.500

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

0

3.Dönem Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%25,00

%0,00

%0,00

%0,00

Proje Yeri İlçe

Toplam Harcam...

MERKEZ

3.173.834

Toplam

3.173.834

Proje Sektörü

Toplam Harcama Tutarı

Toplam Harcama Yüzdesi

Tarım

3.173.834

100,00%

Toplam

3.173.834

100,00%

Bakanlık Adı

Toplam Harcama T...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

3.173.834

Toplam

3.173.834

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı

Yatırımcı Kuruluş

Proje Durumu

Topl

ARAŞTIRMA PROJELERİ

KIRKLARELİ ATATÜRK TOPRAK SU VE TARIMSAL METEOROLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Devam Ediyor

Toplam



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ATATÜRK TOPRAK SU ve TARIMSAL METEOROLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: İstanbul Yolu Üzeri 4. Km.

Tel: 0 288 214 2026

E-Posta : kirklarelitopraksu@tarimorman.gov.tr

KEP : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

Proje Adı: Trakya Bölgesinde Palmer Kuraklık Şiddet İndisinin Buğday Bitkisi İçin Yeniden Modellenmesi

Proje Bütçesi: 80.000 TL

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2021-2024

Projenin Amacı: Bu proje ile kuraklığın buğday üzerindeki fizyolojik etkileri gözlemlenerek, toprak nem içeriği takip edilerek ve hesaplamada kullanılabilecek en uygun bitki su tüketimi yöntemi dikkate alınarak düzenlenecektir. Bu sayede Trakya tarımının önemli bir ürünü olan buğday için geliştirilmiştir bir kuraklık indisi elde edilecektir.





T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI


TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

Proje Adı: Çeltik Tarımından Kaynaklı Sera Gazlarının Hesaplanması ve Çevresel Faktörlerle İlişkisi

Proje Bütçesi: 280.000 TL

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2021-2023

Projenin Amacı: Çeltik tarımından kaynaklı sera gazlarının azaltımı çalışmalarının yapılması uygun arazi yönetimi sisteminden geçmekte ama öncelikle durum tespiti yapılabilmesi için envanter çıkarılması gerekmektedir. Bu envanter hesaplamalarında kullanılan çeşitli yöntemler mevcuttur. Arazi de pratikliği ve ekonomik şartlar göz önüne alındığında uygulamada en çok kullanılan yöntemlerden biri olan Kapalı Manuel Chamber(odacık) metodu ile örnek alınması ve gaz kromografi cihazı ile örnekler analiz edilerek çeltik tarımından kaynaklı sera gazlarının hesaplanması bu projenin amacıdır.

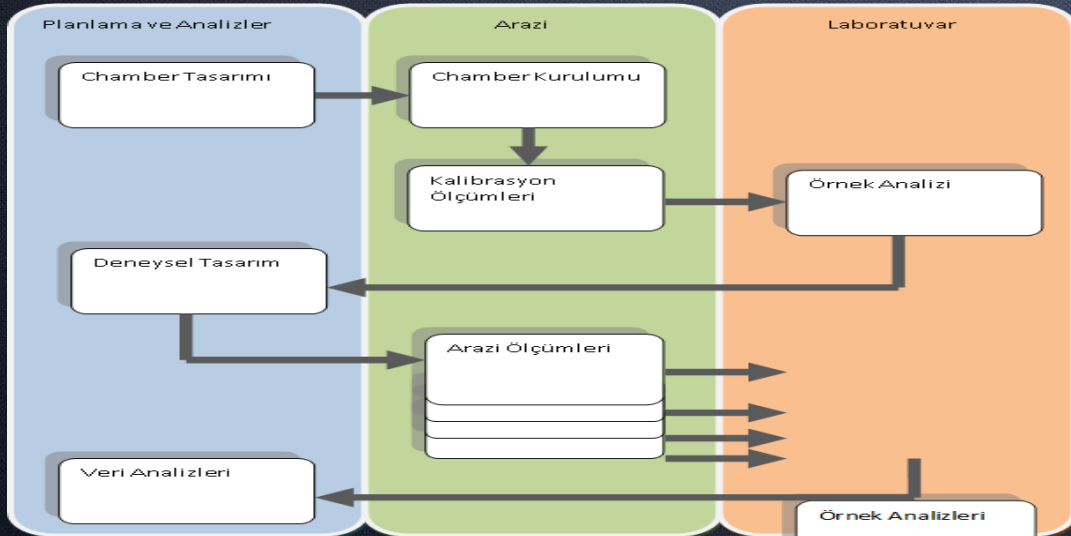



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI


TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

Proje Adı:Kırklareli İlinde Buğday ve Ayçiçeği Bitkileri İçin Dijital Sulama Yönetimi Sistemi Geliştirme Projesi

Proje Bütçesi: 254.000 TL

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2022-2024

Projenin Amacı:Proje ile Trakya bölgesinde en çok tarımı yapılan buğday ve Ayçiçek bitkilerinin , İHA teknolojisi kullanılarak verim tahmini, su tüketimlerinin belirlenmesi, bitki gelişimleri izlenmesi ve tarımda uzaktan algılama tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

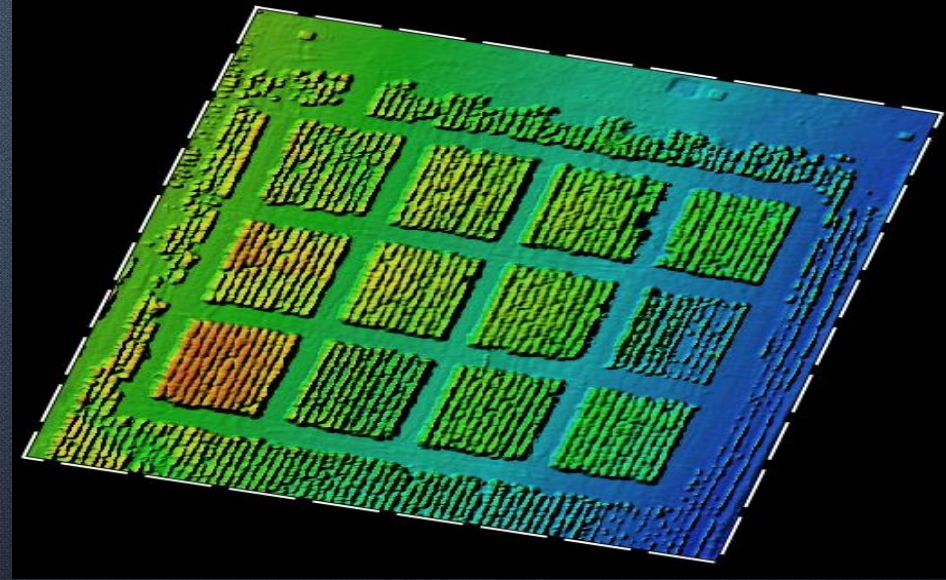



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI


TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

Proje Adı: Kırklareli İlinde Yonca (Medicago sativa) Bitkisi İçin Dijital Sulama Yönetimi Sistemi Geliştirme Projesi

Proje Bütçesi: 254.000 TL

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2022-2024

Projenin Amacı:Proje ile Trakya bölgesinde yonca bitkisinin , İHA teknolojisi kullanılarak verim tahmini, su tüketimlerinin belirlenmesi, bitki gelişimleri izlenmesi ve tarımda uzaktan algılama tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

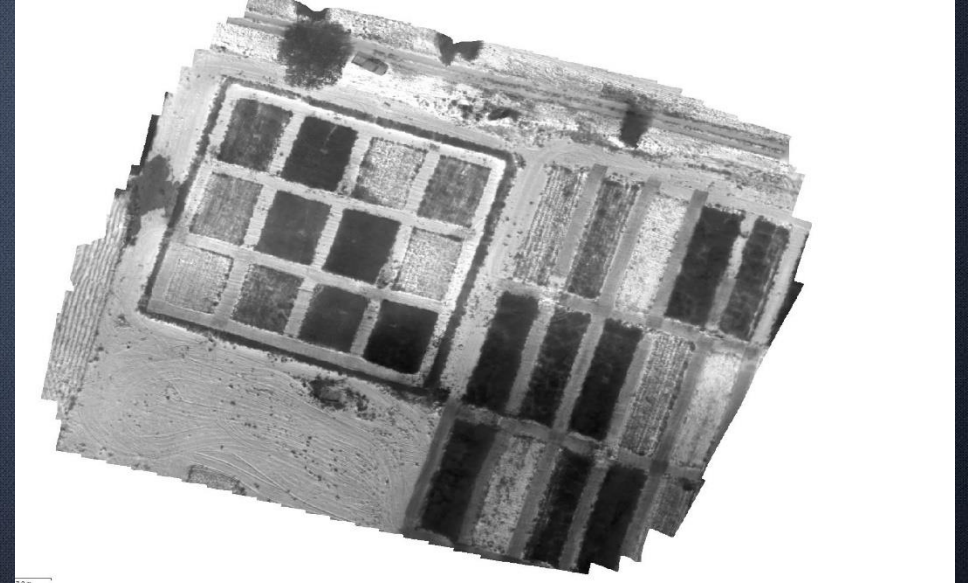



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

Proje Adı: Kırklareli Koşullarında Yapay Meralarda Su Kısıtının Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri

Proje Bütçesi: 132.500 TL

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2022-2024

Projenin Amacı: Proje ile Trakya bölgesinde oluşturulacak yapay merada su kısıtı uygulamaları sonucu verim kalite parametreleri üzerine etkisi araştırılacaktır.





T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

Proje Adı: Kırklareli Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyunun Tarımsal Amaçlı Kullanım Olanakları ve Sera Gazı Salınımlarına Etkisinin Araştırılması

Proje Bütçesi: 357.000 TL

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2022-2024

Projenin Amacı:Nüfus artışı bir taraftan tatlı su kaynaklarının azalmasına ve kirlenmesine neden olurken bir taraftan da kullanılmış ve arıtılmış atık suların artmasına neden olmaktadır. Arıtılmış atık suların (AAS), kullanım şartlarını sağlayacak şekilde yeterli arıtma sağlandığında birçok alanda (tarımsal sulama, peyzaj ve rekreasyon, endüstriyel kullanım, yeraltı suyu besleme gibi) tekrar kullanımı söz konusudur. Bu proje ile arıtılmış atık suların tarımda kullanım olanakları araştırılacak ve toprak bitki üzerindeki etkisi araştırılacaktır.





T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

Proje Adı: Trakya Koşullarında Yetiştirilen Lavanta Bitkisinin Azot ve Fosfor İhtiyacının Belirlenmesi

Proje Bütçesi: 147.250 TL

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2022- 2026

Projenin Amacı: alternatif bir ürün olarak Kırklareli de yetiştiriciliğine başlanmış olan lavanta bitkisinin azot ve fosfor ihtiyacı belirlenmesi ve gübreleme programının oluşturulması amaçlanmaktadır.





T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Proje Adı:Trakya Koşullarında Siyanobakterilerin Çeltik Tarımında Biyogübre Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Proje Bütçesi: 500.000 TL

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2023-2027

Projenin Amacı: Siyanobakterilerin özellikle kurak ortamlarda C ve N sabitleyici özelliğiyle toprağın besin içeriğini iyileştirebildiği bildirilmiştir. Fotosentetik organizmalar olmaları ile toprağın organik maddesini arttırarak biyolojik aktiviteyi düzenlemektedirler. Ayrıca, gelecekteki tarımsal ürün üretimi için faydalı olabilecek potansiyel bir azot kaynağıdır. Siyanobakteriler, N₂'yi bağlama gibi yetenekleri sayesinde zorlu çevre şartlarına karşı hayatta kalabilmektedir. Bazı kaynaklarda biyolojik azot fiksasyonunun her kültür döneminde çeltik ürününe (75kg N/ ha) azot sağladığını bildirmiştir. Bu çalışmada ülkemizdeki çeltik üretiminin yarıdan fazlasının gerçekleştiği Trakya Yöresinden izole edilmiş iki siyanobakteri türünün konsorsiyum şeklinde çeltik tarımında kullanımının bazı toprak özellikleri, bitkinin azot kullanma etkinliği, ürün verimi ve bu yolla kimyasal azotlu gübre kullanımına etkisi araştırılacaktır.



SUYUN GÜCÜ
MİLLETLE BULUŞUYOR



E-TARIM
PORTALI



TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HAMLESİ



SÖZ SİZDE
Tarım Orman Bakanlıklarınca



ELEKTRİKLİ
TRAKTÖR



TARIM ORMAN BAKANLIĞI



ATADAN TORU
TARIM SEFİRELERİ



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

Proje Adı: Biyokömür Kaynaklı ve Nitirifikasyon İnhibitörlü Organomineral Gübre ve Gübre Üretim Yönteminin Geliştirilmesi

Proje Bütçesi: 1,999.916 TL

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2023-2025

Projenin Amacı: Tarımsal verim kaybı olmaksızın gübreler ile toprağa kazandırılan bitki besin maddelerinin etkin kullanımının sağlanması. Yeraltı ve yüzey suları kirliliği, toprak kirliliği ve sera gazı salınımını azaltacak gübre teknolojilerinin geliştirilmesi. Pirina gibi C/N oranı geniş niteliksiz organik atıklardan piroliz yöntemi ile biyokömür üretimi. Elde edilen biyokömürün üstün fiziksel ve kimyasal özellikleri sayesinde inorganik gübrelerle birleştirilerek organomineral gübre üretim yönteminin geliştirilmesi. Nitrikasyon inhibitörü ile kaplanarak azot kayıplarının da minimum seviyeye indirilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.





T.C.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Proje Adı: Kırklareli İli Alternatif Bitkisel Üretim Desenin Belirlenmesi

Proje Bütçesi: 297.000 TL

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2022- 2025

Projenin Amacı: Tarım alanları artan dünya nüfusu, sanayileşme ve yanlış tarımsal uygulamalar gibi çeşitli faktörler tarafından baskı altındadır. Bu alanların uzun vadede kullanılabilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Doğru tarımsal uygulamalar öncelikle arazi kullanım planlaması yapılması ile sağlanabilir. Kırklareli ilinin yüzölçümünün yaklaşık % 36'sını tarım alanları oluşturmaktadır. Önemli üretim potansiyeline sahip ilde en fazla yetiştiriciliği yapılan ürünler buğday, ayçiçeği, mısır ve çeltiktir. Buğday ve ayçiçeğine ait uzun yıllar verim değerleri incelendiğinde Kofçaz ilçesindeki buğday ve ayçiçeği verim değerleri il ortalamasının çok altında kalmaktadır. Bu çalışma ile ilçenin asit karakterli toprak yapısına uygun tarımsal arazi kullanım planlaması ve alternatif bitki desenine ait haritaların hazırlanması planlanmaktadır. Ayrıca buğday, ayçiçeği, mısır, çeltik vb. tarımının yoğun gerçekleştirildiği mutlak tarım arazileri dışında kalan Merkez ilçe ve diğer ilçelerde bulunan marjinal tarım alanlarında gerçekleştirilecek arazi çalışmaları ile mevcut durum analizi yapılarak, toprak kalitesi belirlenecek ve alternatif ürün deseni oluşturulacaktır.

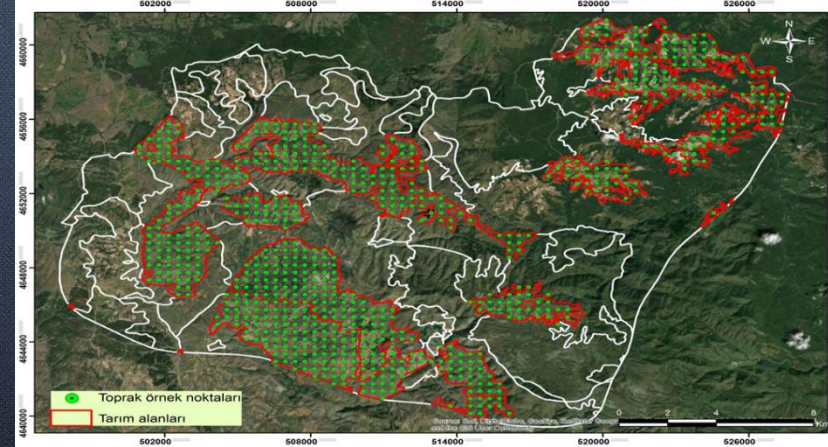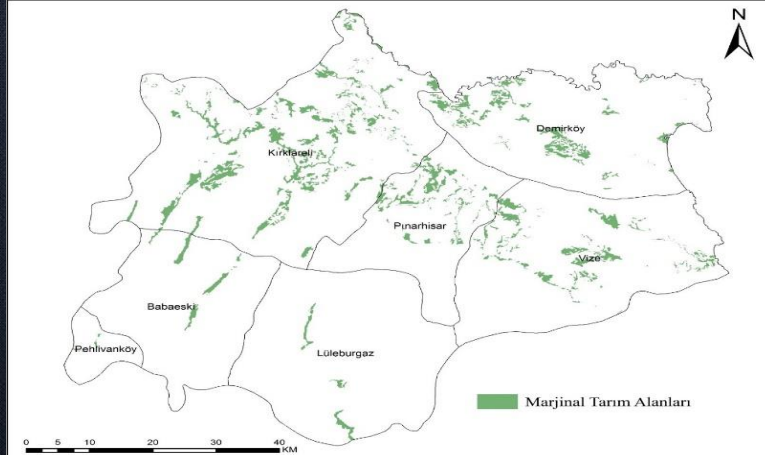

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

Proje Adı: Toprak İyileştirme ve Çeltik Üretiminde Verimi Artırmak Amacıyla Çeltik Saman Atığı ile Beraber Uygulanacak Biyogübre Üretimi

Proje Bütçesi: 518.584 TL

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2024-2026

Projenin Amacı: Trakya ve Karadeniz bölgelerinde çeltik tarımı yapılan alanlarda hasat sonunda açığa çıkan ve tarımsal olarak değerlendirilmesi oldukça sınırlı olan çeltik samanlarının lignin ve selüloz parçalayan (lignoselüloolitik) bakteriler kullanılarak toprakta bitki tarafından alınabilecek organik/inorganik bileşik formlarına çevrilmesiyle toprağın zenginleştirilmesi amaçlanmıştır.





T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

Proje Adı: Yavaş Salınlımlı Azotlu Gübreler ve Azaltılmış Dozlarının Mısır Bitkisi Verim ve Kalitesine Etkileri

Proje Bütçesi: 95.000 TL

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2021-2023

Projenin Amacı: Azot, mısır bitkisinin sağlıklı büyümesi için mutlak gerekli bir besin elementidir. Gübreleme ile toprağa verilen azot elementinden; yıkanma, denitrifikasyon gibi durumlara bağlı olarak kayıplar yaşanmaktadır. Bu kayıpların azaltılması amacıyla, gübreleme derinliği ile yavaş salınlımlı azotlu gübrelerin mısır bitkisinde etkinliğinin araştırılması amaçlanmaktadır.





T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

Proje Adı: Kırklareli ilinde Tarımsal Mekanizasyon Planlaması, Yeni Teknolojilerin Kullanımı ve Politikalarının Araçlarının Geliştirilmesi

Proje Bütçesi: 110.000 TL

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri:2020-2022

Projenin Amacı: Bu projede, Kırklareli ilinde tarımsal işletmelerin mekanizasyon planlamasının yapılması amaçlanmıştır. Tarım işletmeleri için farklı makine setleri oluşturulacak ve her makine seti için işletme arazisi büyüklüğü değişken olarak alınacak ve karı maksimize eden ürün deseni belirlenecektir.



KIRKLARELİ

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

DEREKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Proje Sahibi Bakanlık

Tümü

Bütçe Türü

Tümü

Harcama Yılı

2025

Başlama Yılı

Tümü

Bitiş Yılı

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

0

1

1
Proje Sayısı492.283
Toplam Proje Tutarı414.715
Toplam Harcama Tutarı1
Toplam Yıl Ödeneği0
Yılı Harcama Tutarı0
1.Dönem Harcama Tutarı0
2.Dönem Harcama Tutarı0
3.Dönem Harcama Tutarı0
4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%0,00

%0,00

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcam...
MERKEZ	414.715
Toplam	414.715

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı	Toplam Harcama Yüzdesi
Diğer Kamu Hizmetleri-İktis...	414.715	100,00%
Toplam	414.715	100,00%

Bakanlık Adı	Toplam Harcama T...
TİCARET BAKANLIĞI	414.715
Toplam	414.715

* Fiziki Gerçekleşme Oranı ve Nakdi Gerçekleşme Oranı arasındaki farkı %30'dan fazla olan projeler kırmızı arka plan ile gösterilmiştir.

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harc
DEREKÖY GÜMRÜK KAPISININ MODERNİZASYONU	DEREKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	1	492.283	41
Toplam			1	492.283	41
